

SUSITARIMAS

2015-02-26

Alytus

PIRK-31-15

UAB „Dzūkijos vandenys“, įm. k. 149566841, buveinės adresas Pulko g. 75, Alytus, Lietuva, toliau sutartyje vadinama „Užsakovu“, atstovaujama direktoriaus Rolando Žako ir jungtinės veiklos partneriai UAB „Inžineriniai tinklai“, ir „Malmberg Water AB“, atstovaujamiems pagrindinio jungtinės veiklos partnerio UAB „Inžineriniai tinklai“, įmonės kodas: 133165398, buveinės adresas Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas, Lietuva (toliau sutartyje vadinami „Rangovu“), atstovaujantys kitą sutarties šalį, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Darbų (3.2 p.) atlikimas ir šalių atsakomybių paskirstymas geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo Alytaus miestui procesų (toliau – procesai) sustabdymo vandentiekio stotyje Nr. 1 adresu Pulko g. 75, Alytuje (toliau – Objektas) laikotarpiu, vykdant statybos darbus pagal rangos sutartį „Vandentiekio stoties Nr. 1 Pulko g. 75, Alytuje rekonstravimas“, sutarties Nr. PIRK-202-13.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2. Užsakovas įsipareigoja:

2.1. sustabdyti Objekte vykstančius procesus rekonstrukcijos laikotarpiu;

2.2. pasirašyti procesų sustabdymo /paleidimo aktą;

2.3. aprūpinti asmenis šaltu geriamuoju vandeniu sutarties priede Nr. 1 pažymėtais vandentiekio tinklais (iš Strielčių vandenvietės, vandentiekio stoties Nr. 2, esančios Putinų g. 82, Alytuje (VS-2) ir aukštos zonos geriamojo vandens rezervuarų (AZR)).

3. Rangovas įsipareigoja:

3.1. Darbus (3.2 p.) Objekte, procesų Objekte sustabdymo metu, atlikti per 30 dienų nuo procesų sustabdymo dienos;

3.2. Objekto darbus atlikti pagal kalendorinį grafiką (2 priedas);

3.3. pasirašyti procesų sustabdymo/paleidimo aktą;

3.4. procesų Objekte sustabdymo metu, kilus avarijai sutarties priede Nr. 1 nurodytuose vandentiekio tinkluose (iš Strielčių vandenvietės, vandentiekio stoties Nr. 2, esančios Putinų g. 82, Alytuje, įskaitant ir stotį, ir aukštos zonos geriamojo vandens rezervuarus), atlyginti Užsakovui dėl susidariusiu nuostolių procesų sustabdymo laikotarpiu tretiesiems asmenims atsiradusią žalą, susijusią su Užsakovo negalėjimu vykdyti savo įsipareigojimų, nurodytų Sutarties 2.3 punkte.

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS

4. Rangovui pažeidus šioje sutartyje numatytus susitarimus, jie, Užsakovo reikalavimu, atlygina jo nuostolius, susidariusius dėl šios sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

5. Užsakovui, pažeidus šioje sutartyje numatytus susitarimus, jie, Rangovo reikalavimu, atlygina jų nuostolius, susidariusius dėl šios sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

IV. KITOS SĄLYGOS

6. Šalių susitarimu galimi šios sutarties pakeitimai bei papildymai, kurie įsigalioja tik tada, kai jie padaryti raštu ir pasirašyti šalių įgaliotų asmenų. Papildymų ir pakeitimų įsigaliojimo laikas turi būti aptartas raštiškame susitarime dėl šios sutarties papildymų ar pakeitimų.

7. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami šalių susitarimu, nesusitarus perduodami Lietuvos Respublikos teismams.

8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.

V. SUSITARIMO PASIBAIGIMAS

9. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.

VI. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

UAB „Dzūkijos vandenys“
Pulko g. 75, LT-62135, Alytus
įm.k. 149566841
PVM kodas LT495668410
a.s. LT87 7300 0100 0220 8247,
Swedbank, AB,
Tel. (8 315) 73470, faks (8 315) 55586

Direktorius

Rolandas Žakas




UAB „Inžineriniai tinklai“
Draugystės g. 8H, LT-51264, Kaunas
įm.k. 133165398
PVM kodas LT331653917
a.s. LT30 7044 0600 0334 4021
AB SEB bankas
Tel. (8 37) 451480, faks (8 37) 451474

Direktorius

Eduardas Černulis



*Sutartis ypač patvirtinama
pavaldinti d. d. 2016 m. 03 m. 03 d.*
2016 03 03

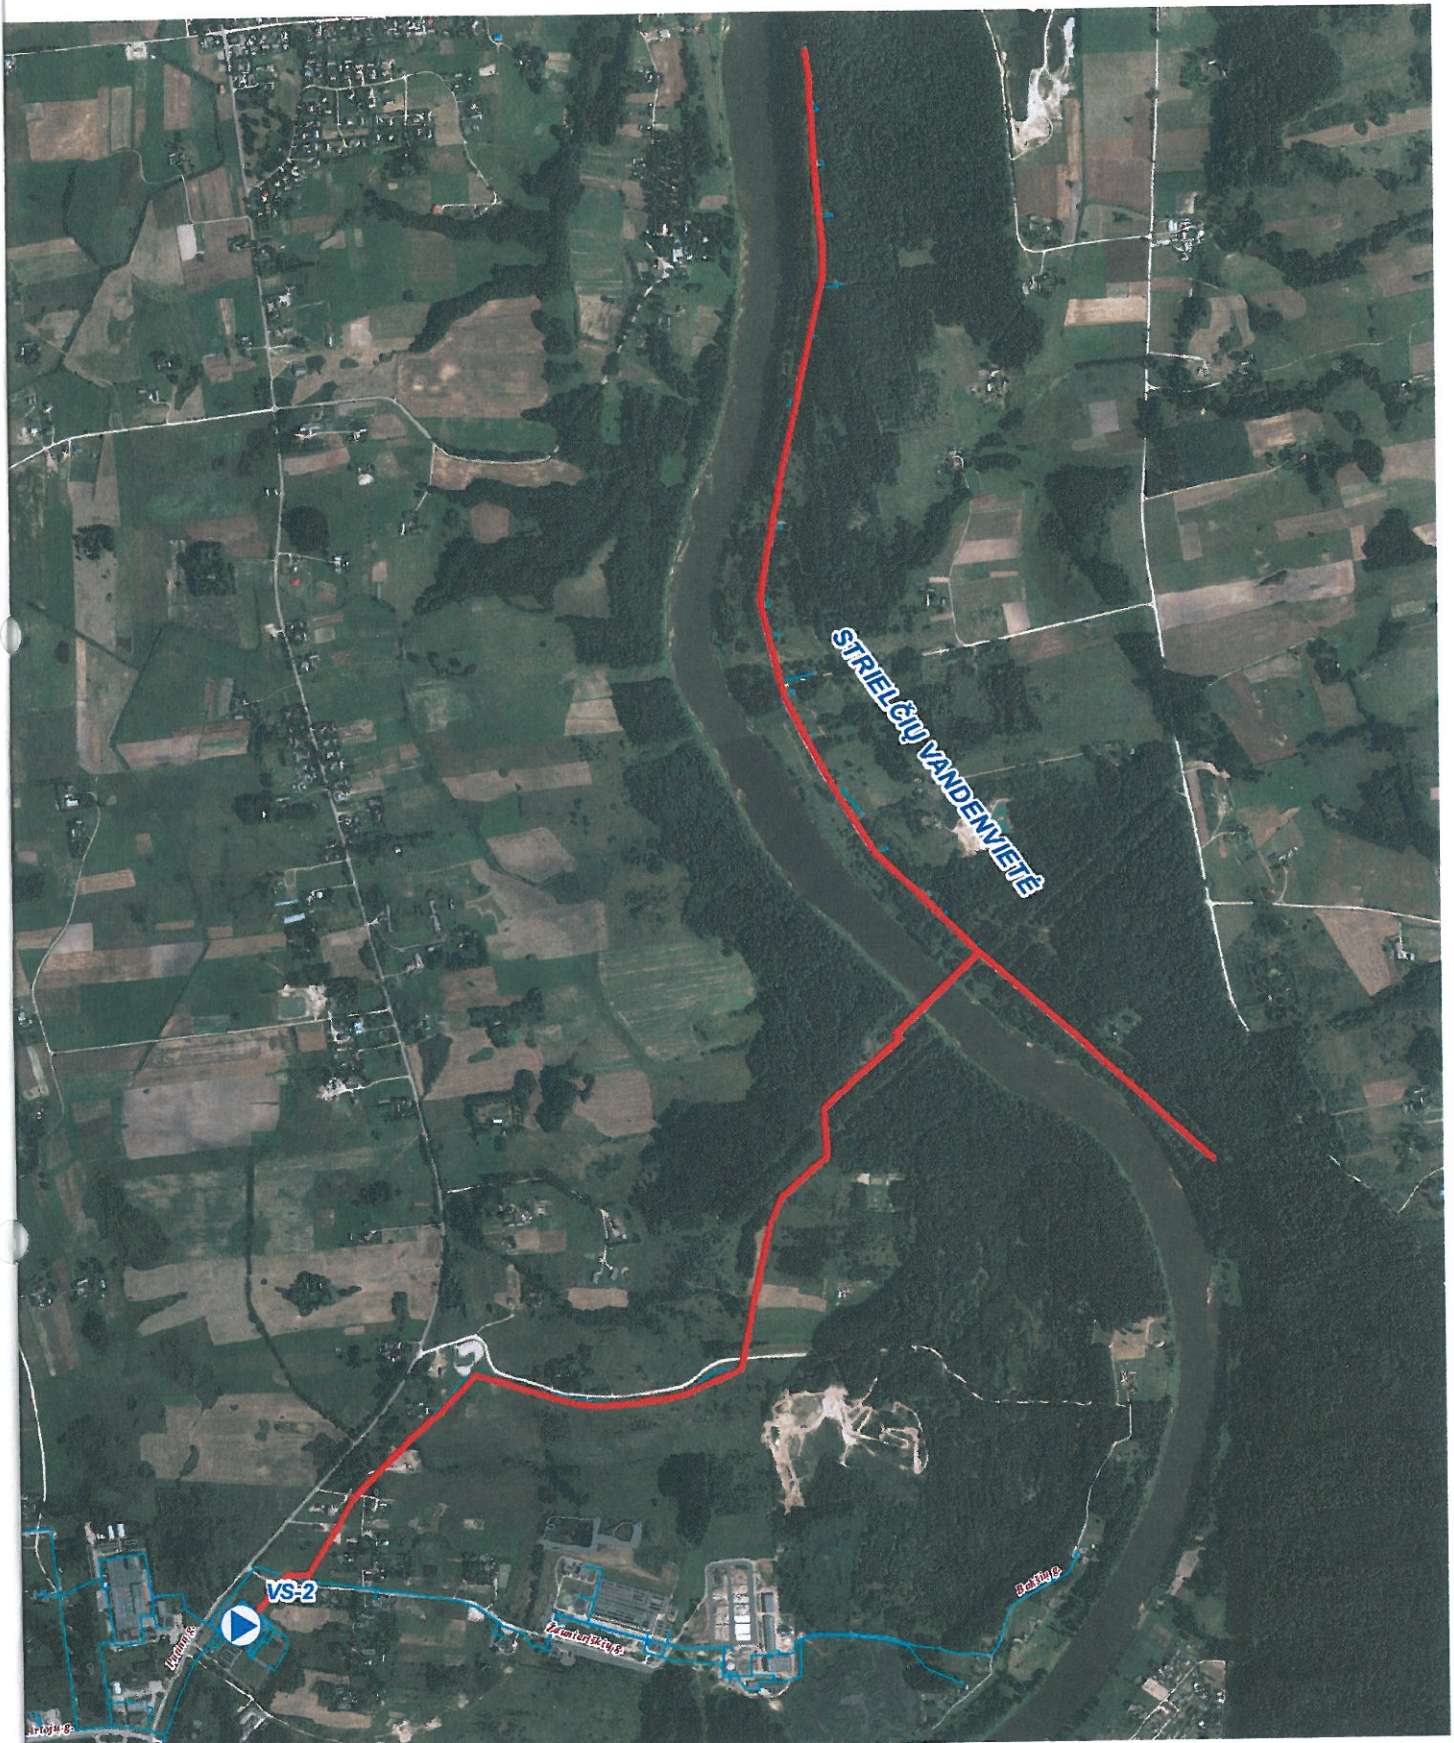

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  - vandentiekio linija
-  **VS-2** - vandentiekio stotis Nr. 2



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- - vandentiekio linija
- AZR** - aukštos zonos geriamojo vandens rezervuarai
- VS-2** - vandentiekio stotis Nr. 2

[Handwritten signatures and marks]

VANDENTIEKIO STOTIES NR-1 STABDYMO DARBŲ PROGRAMA

Eilės Nr.	Vykdomi darbai	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Kas atlieka	Pastabos
1	2	3	4	5	6
1	Tiltelio, valdymo spintos pastatymui, įrengimas		2015.02.23	"INTI"	
2	Valdymo spintos pastatymas ant tiltelio	2015.02.24	2015.02.25	"Malmberg"	
3	Galios kabelio iki valdymo spintos montavimas	2015.02.24	2015.02.25	"Elmonta"	
4	Valdymo ir galios kabelių iki aukšto slėgio siurblių M2.1 ir M2.2 montavimas	2015.02.25	2015.03.03	"Malmberg"	
5	Aukšto slėgio siurblių M2.1 ir M2.2 centravimas	2015.03.04	2015.03.04	"Malmberg", "Grundfos"	
6	Stabdoma vandentiekio stotis Nr.1 ir filtrai	2015.03.02		"INTI", "Dzūkijos vandenys"	Stabdomas vandens padavimas iš vandenvietės į filtrus. Stoties rezervuarai išsiurbiami iki 0,5-1,5 m lygio. Vanduo į miesto žemo slėgio zoną iš aukšto slėgio zonos teka per esamą apvedimo liniją, aplenkiant senus siurblius
7	Demontuojamas senas vamzdynas d700 ateinantis iš vandens rezervuarų. Paruošiama vieta perjungimui naujo d500 vamzdynui	2015.03.02	2015.03.03	"INTI"	Dalis darbų vykdoma antra pamaina
8	Perjungiamos linijos d700 į d500, ateinančios iš rezervuarų	2015.03.03	2015.03.04	"Malmberg"	
9	Demontuojami aukšto ir žemo slėgio siurbLIAI ir senas vamzdynas iki sklendžių už siurblių	2015.03.04	2015.03.05	"INTI"	Dalis darbų vykdoma antra pamaina
10	Paleidžiami filtrai	2015.03.05			Paleidžiamas vanduo iš vandenvietės į filtrus, vanduo kaupiamas rezervuaruose
11	Iki pirmo šulinio už siurblynės renovuojama aukšto slėgio linija d250	2015.03.05	2015.03.06	"INTI", "Malmberg" "Dzūkijos vandenys"	Žemo slėgio zonos vartotojai aprūpinami per slėgio reduktorius mieste. Vanduo buitiniams reikmėms stotyje paduodamas, siurblynėje padarant perjungimą iš esamo žemo slėgio zonos vamzdyno
12	Paleidžiami nauji aukšto slėgio siurbLIAI, paduodant vandenį į aukšto slėgio zoną	2015.03.06	2015.03.06	"Malmberg"	Vanduo buitiniams reikmėms paduodamas, padarant perjungimą iš siurblynės naujo aukšto slėgio vamzdyno
13	Iki pirmo šulinio už siurblynės renovuojama žemo slėgio linija d300	2015.03.09	2015.03.10	"Malmberg"	
14	Sujungiama aukšto - žemo slėgio apvedimo linija. Vanduo į žemo slėgio zoną tiekiamas aukšto slėgio siurbliu per dažnio keitiklį	2015.03.10	2015.03.10	"Malmberg" "Dzūkijos vandenys"	Slėgio regulatoriai atstatomi į buvusį režimą
15	Dalinai paleidžiama vandentiekio stotis Nr.1	2015.03.10	2015.03.10	"Malmberg"	
16	Pinai paleidžiama vandentiekio stotis Nr.1 Vanduo į žemo slėgio zoną tiekiamas žemo slėgio siurbliu per dažnio keitiklį	2015.03.10	2015.03.24	"Malmberg"	Atliekami darbai žemos slėgio zonos bent 1 siurblio paleidimui

Suderinta:

Užsakovas: UAB „Dzūkijos vandenys“

FIDIC Inžinierius: VšĮ „Projektų vadybos grupė“

Rangovas: UAB „Inžineriniai tinklai“/UAB „Malmberg Water AB“
