

APŽIŪROS AKTAS Nr.1

Data, laikas: 2018-03-30 10 val. 00 min.

Vietà: Kauno r. sav. Zapyškio sen. Zapyškio miestelis, Muziejaus g. 1

Rangos sutartis: Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, esančios Muziejaus g. 1, Zapyškio mstl. Zapyškio sen. Kauno r. sav. paveldo tvarkybos, konservavimo – restauravimo ir kapitalinio remonto darbai bei darbo projekto parengimo paslauga.

Rangos sutarties numeris: Zapyškio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios tvarkybos darbų rangos sutartis 2017 m. lapkričio 15 d. Nr. S-1116

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Ekodora“

Įstaiga/Imonė	Dalyviai	
	Vardas, Pavardė	El. pašto adresas, tel. nr.
Kauno rajono savivaldybės administracija, projekto inžinerė	Jurgita Šarapovienė	jurgita.sarapoviene@krs.lt 861481510
UAB „Ekodora“, darbų vadovas	Andrius Tamošiūnas	andrius@ekodora.lt
UAB „Ekodora“, statinio statybos vadovas	Remigijus Indrulis	Remigijus@ekodora.lt, 868251531
UAB „Erdvės norma“, techninio projekto vykdymo priežiūra	Gintaras Priokkis	gintaras@erdvesnorma.lt 869966819
UAB „Projektera“, darbo projekto projektuotojas	Aurimas Kriauza	aurimas570@yahoo.com 865620819
Projekto techninė priežiūra	Olegas Repovas	o.repovas@gmail.com 865299620
UAB Šiltas namas		

Vykdamas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios konservavimo – restauravimo ir kapitalinio remonto darbus, detaliųjų archeologinių tyrimų metu, kai buvo atkasti pamatai, dėl rizikos grunto pasislinkimui buvo demontuotos medinės kolonos laikančios balkono konstrukciją, o vietoj jų balkonas išramstytas metaliniais spyriais. Demontavus kolonas buvo pastebėta, kad visos kolonos yra paveiktos puvinio.

NUSPREŠTA

Apžiūros dalyviai, apžiūrėję demontuotas kolonas, priėmė sprendimą kolonų restauravimui, protezuojant sunykusias dalis. Darbo projekto konstrukcinės dalies vadovas parengs kolonų protezavimo mazgus.

Priedai:

1. Fotofiksacija.
2. Balkono kolonų K-1, K-2, K-3, K-4 suirusių dalių keitimas.
3. Lokalinė sąmata

Susipažinimo žymos:

Andrius Tamošiūnas

AT

Remigijus Indrulionis

RI

Gintaras Prikoekis

GP


Aurimas Kriauza

AK


Olegas Repovas

OR

BALKONO KOLONŲ K-1, K-2, K-3 IR K-4 SUIRUSIŲ DALIŲ KEITIMAS M 1:100

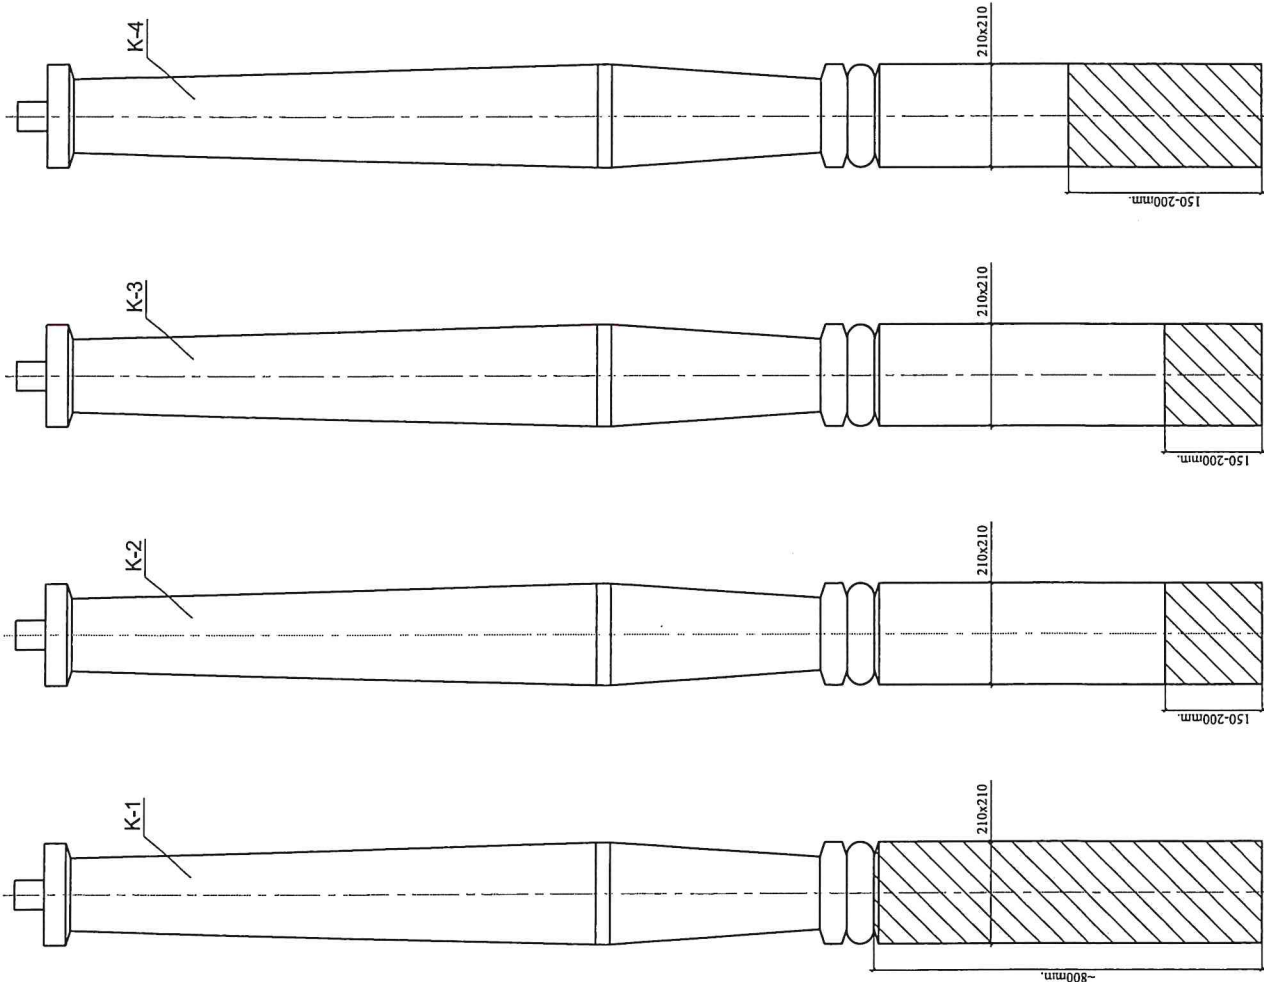

BALKONO KOLONŲ PLANAS M 1:10

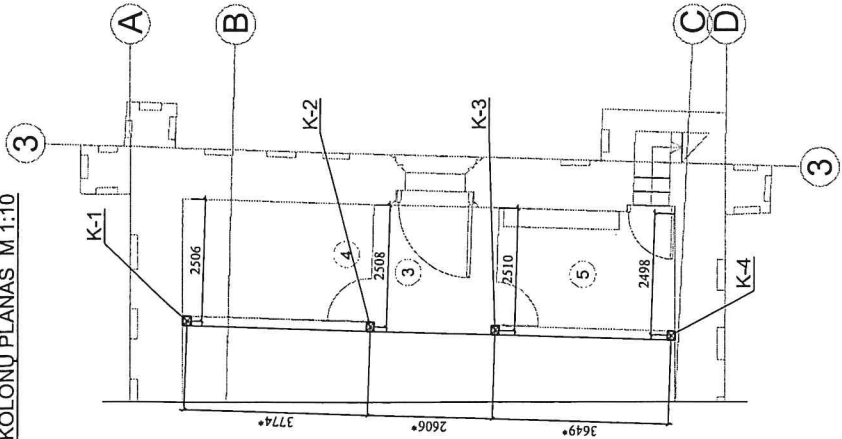

PASTABOS:
1. MATMENIS TIKSLINTI PAGAL VIETĄ IR FAKTIŠKĄ SITUACIJĄ.
2. NUPJŪVUS SUJUSIĄ KOLONOS DALĮ, PĖJŲ VĖJE TIKRINTI MEDENOS BŪKLĘ.
3. STATYBOS RANGOVAS IR SUBRANGOVAS TURI BŪTI ATSTUOTI IR PRIVALO ATTIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS
STATYBOS ĮSTATYMO 15 STR. NUSTATYTUS REIKALAVIMUS.

0	2018	Statybos darbai	LAIDOS STATUSAS: KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAKOMA)
LADA	ŠALDINIMO DATA		
KVALIF. PATVIRTINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERIA“ Žemė ūkio, statybos, inžinerijos ir architektūros projektavimo ir konsultavimo įmonė UAB „PROJEKTERIA“ www.projekteria.lt	STATYMO PROJEKTO PAVADINIMAS Sv. Jono Kikdyvių bažnyčios (972) paveldo įstatymų darbu, konservavimu - restauravimo ir kapitalinio remonto, Kauno r. sav. Zarėškio mstl. Muzėjaus g. 1, projektas	
A229, 1590	PV.	G. Priekockis	DOKUMENTO PAVADINIMAS
24765/1367	PDV.	A. Kriauza	BALKONO KOLONŲ K-1, K-2, K-3 IR K-4 SUIRUSIŲ DALIŲ KEITIMAS M 1:100
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	Kauno r. savivaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMOS
			LADA
			0
			UPV
			1
			1

SUB 18/02/09-002-01-TDP-SK-B-04

ROS

