Projektas "Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas ant uždaryto sąvartyno"

Darbų atlikimo grafikas

Priedas Nr. 1 prie taikos sutarties

	Proceso eiga	Atsakingas	Trukmė	Terminai		
				Pradžia	Pabaiga	Įvykdyta
Atlikti saulės elektrinės parengiamieji ir projektavimo darbai nuo 2023-01-12 iki 2023-08-29						
I	Atlikta objekto apžiūra	*ITP Solar*	3 d.d.	01 12	01 16	X
II	Topografinio plano užsakymas/parengimas		30 d.d.	03 01	03 28	X
III	Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų užsakymas/parengimas		30 d.d.	03 28	04 27	X
IV	Preliminaraus antžeminės saulės elektrinės išdėstymo plano parengimas		10 d.d.	04 21	05 01	X
V	Projektinis antžeminės saulės elektrinės išdėstymo planas pateiktas susiderinimui su užsakovu		5 d.d.	05 01	05 05	X
VI	Projektinis antžeminės saulės elektrinės išdėstymo planas koreguojamas pagal pateiktas užsakovo pastabas		5 d.d.	05 05	05 09	X
VII	Projektinių pasiūlymų rengimo užduoties parengimas		3 d.d.	06 07	06 08	X
VIII	Projektinių pasiūlymų rengimo užduoties suderinimas		5 d.d.	06 08	06 13	X
IX	Projekto projektinių pasiūlymų parengimas		20 d.d.	06 13	07 20	X
X	Projekto projektinių pasiūlymų viešinimas		15 d.d.	07 20	08 12	X
XI	Projekto projektinių pasiūlymų tvirtinimas		10 d.d.	08 21	08 29	X
I) Saulės elektrinės projektavimo, derinimo, leidimų gavimo paslaugas						X
1.1	Privalomųjų dokumentų gavimas: a) Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis; b) Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos žemės servituto nustatymo sandoriu žemės sklypui (kadastro nr. 5558/0001:309 Tauralaukio k.v.), esančiam Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Glaudėnų k., Kaukėnų g. 21 dokumentas; c) Dokumentas, patvirtinanti atlyginimo už teisę statyti valstybinėje žemėje, sumokėjimą. d) Naujai atsiradusių šulinių ar tinklų ties SE montavimo zona pažymėjimas plane ir informacija apie juos.	*KRATC*	*10 d.d.*	*2023-09-11*	**2023-09-22**	
1.2	Saulės elektrinės projektavimas: rengiama projekto elektrotechninės dalies A laida, bei bendroji, sklypo sutvarkymo ir architektūrinė dalis, SO dalis	*ITP Solar*			**2023-09-29**	
1.3	Techninio darbo projekto ekspertizės atlikimas	*KRATC*	*14 k.d*	*2023-10-02*	**2023-10-15**	
1.4	Projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas (esant būtinybei)	*ITP Solar*	*20 k.d.*	*2023-10-16*	**2023-10-04**	
1.6	Statybą leidžiančio dokumento gavimas	*ITP Solar*	*21 k.d*	*2023-11-06*	**2023-11-26**	
1.7	Atsakingų asmenų paskyrimas, pasamdymas (techninė priežiūra)	*KRATC*	*3 d.d.*	*2023-11-27*	**2023-11-29**	
1.8	Statybos žurnalo pateikimas	*KRATC*	*3 d.d.*	*2023-11-27*	**2023-11-29**	
1.9	Statybvietės perdavimo akto pasirašymas	*KRATC*	*3 d.d.*	*2023-11-27*	**2023-11-29**	
1.10	Statybvietės priėmimo akto pasirašymas	*ITP Solar*	*3 d.d.*	*2023-11-30*	**2023-12-04**	
II) Saulės fotovoltinės elektrinės įrangos įrengimo darbai						
2.1	Objekto paruošiamieji darbai ir kliūčių pašalinimas (gerbuvio sutvarkymas, stulpų pašalinimas ir kt. darbai)	*KRATC*	*48 k.d.*	*2023-09-11*	**2023-11-28**	
2.2	Pagrindinės įrangos pristatymas:	*ITP Solar*	*60 k.d*		**2023-10-29**	
2.2.1	Inverterių pristatymas	*ITP Solar*				**2022-07-20**
2.2.2	Saulės modulių pristatymas	*ITP Solar*	*28 k.d.*	*2023-10-02*	**2023-10-29**	
2.2.3	Konstrukcijos pristatymas	*ITP Solar*			**2023-09-24**	
2.3	Saulės elektrinės polių sukalimas	*ITP Solar*	*10 d.d.*	*2023-12-05*	**2023-12-18**	
2.4	Saulės elektrinės konstrukcijų montavimas	*ITP Solar*	*13 d.d.*	*2023-12-11*	**2023-12-31**	
2.5	Saulės elektrinės fotomodulių montavimas	*ITP Solar*	*17 d.d.*	*2023-12-27*	**2024-01-19**	
2.6	Saulės elektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei saulės elektrinės paleidimo ir derinimo darbais	*ITP Solar*	*15 d.d.*	*2024-01-15*	**2024-02-02**	
III) Saulės elektrinės pridavimo darbai						
3.1	Privalomųjų pasirašytų dokumentų gavimas (atsakingo asmens už elektros ūkį pažymėjimas, paskyrimas; įgaliojimas atstovauti; reikalingų dokumentų VERT pasirašymas)	*KRATC*	*3 d.d.*	*2024-01-22*	**2024-01-24**	
3.2	Išpildomosios geodezinės nuotraukos paruošimas ir suderinimas	*ITP Solar*	*20 d.d.*	*2024-02-05*	**2024-03-01**	
3.3	Kadastrinės bylos paruošimas ir suderinimas	*ITP Solar*	*25 d.d.*	*2024-02-05*	**2024-03-08**	
3.4	Deklaracija apie statinio statybos užbaigimą	*ITP Solar*	*10 d.d.*	*2024-02-26*	**2024-03-08**	
3.5	VERT leidimo paleidimo derinimo darbams atlikti pažymos gavimas	*ITP Solar*	*mėnuo*	*2024-03-04*	**2024-04-02**	
3.6	ESO natūriniai bandymai	*ITP Solar*	*42 k.d.*	*2024-03-04*	**2024-04-14**	
3.7	VERT techninės būklės patikrinimo pažymos gavimas	*ITP Solar*	*mėnuo*	*2024-04-15*	**2024-05-12**	
3.8	Darbų priėmimo-pridavimo akto pateikimas	*ITP Solar*	*3 d.d.*	*2024-05-13*	**2024-05-15**	
3.9	Darbų priėmimo-pridavimo akto pasirašymas	*KRATC*	*2 d.d.*	*2024-05-16*	**2024-05-17**	
3.10	Galutinės sąskaitos faktūros pateikimas	*ITP Solar*	*2 d.d*	*2024-05-20*	**2024-05-21**	
3.11	Sutarties su ESO rengimas ir pasirašymas	*KRATC*	*2 mėn.*	*2024-05-12*	**2024-07-12**	

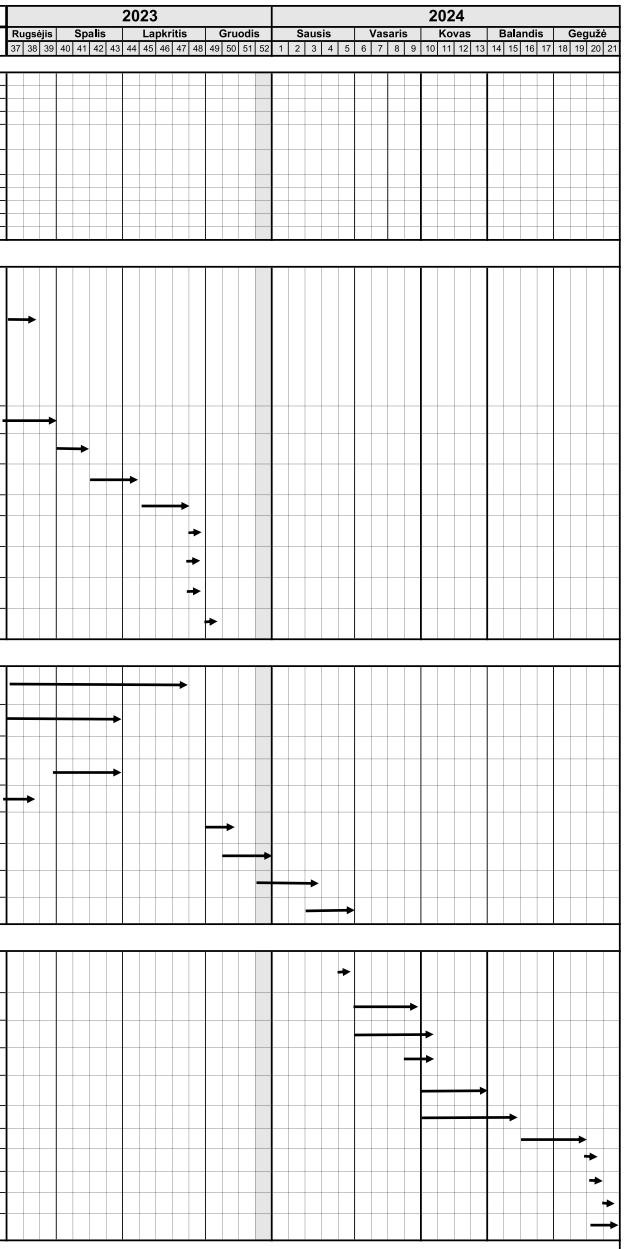

UAB "Informacinių technologijų pasaulis" Sudarė: Data/Parašas:	**UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras** Projektų administravimo skyrius (PAS) Patvirtino: Data/Parašas:

Peržiūros: Nauja versija **1.0**	
Peržiūros/pakeitimų rezultatai: N	
Data: 20223-09-12	
