AB ,,KLAIPĖDOS ENERGIJA“ KLAIPĖDOS RAJONINĖS KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, ĮRENGIANT NAUJĄ 8MW BIOKURO KATILĄ NR. 1 SU KONDENSACINIU EKONOMAIZERIU
DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS
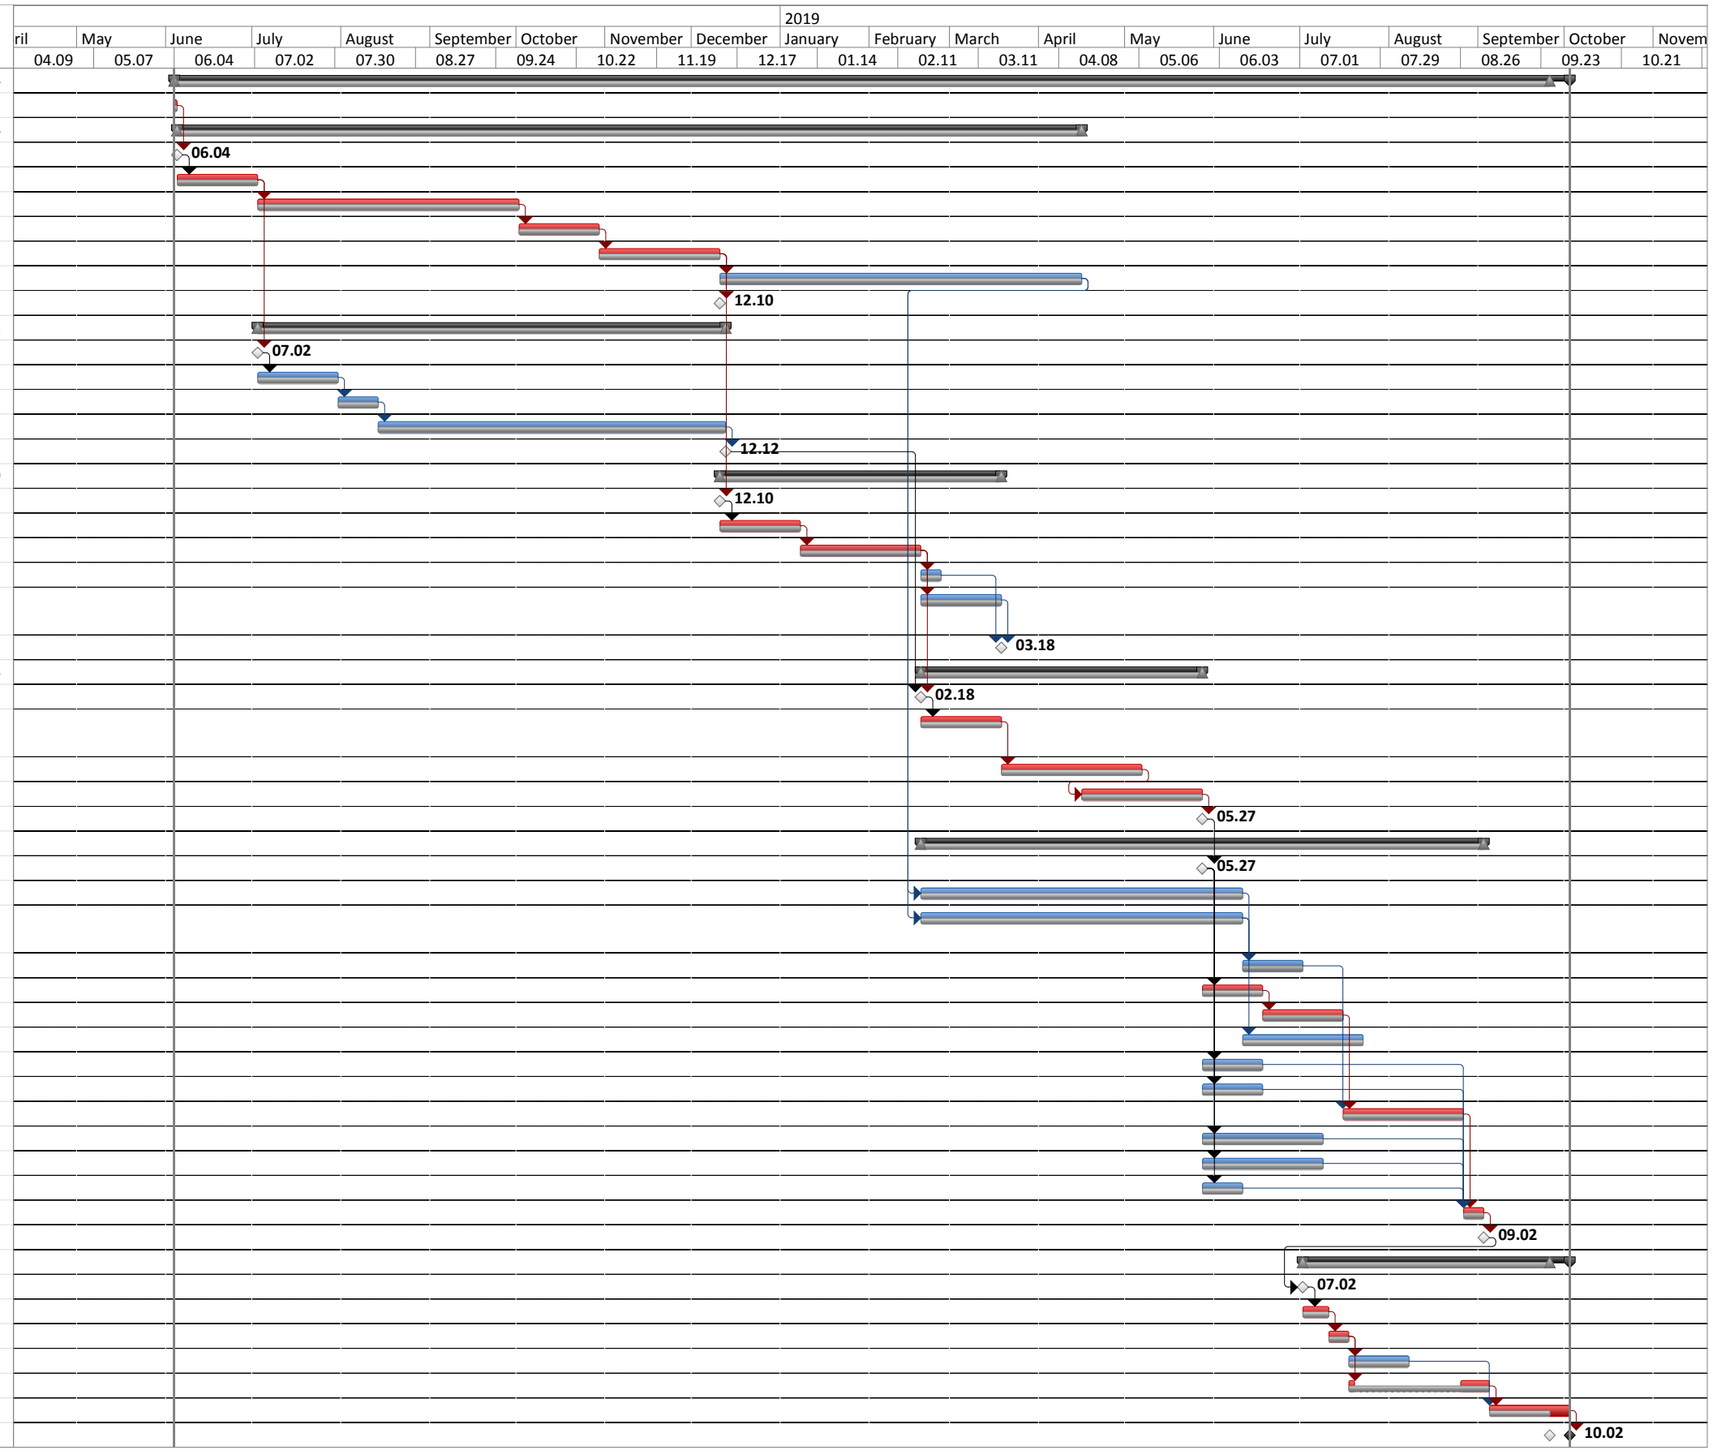
ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start
1		**Klaipėda 2x8 MW VŠK**	**348 days**	**Mon 18.06.04**
2		Sutarties pasirašymas	1 day	Mon 18.06.04
3		**Projektavimas, statybos leidimas**	**225 days**	**Mon 18.06.04**
4		Pradžia	0 days	Mon 18.06.04
5		Užduoties TP rengimas	20 days	Tue 18.06.05
6		TP	65 days	Tue 18.07.03
7		Ekspertizė su pastabų šalinimu	20 days	Tue 18.10.02
8		Statybos leidimas su pastabų šalinimu	30 days	Tue 18.10.30
9		DP	90 days	Tue 18.12.11
10		Pabaiga	0 days	Mon 18.12.10
11		**Įrangos konstravimas, gamyba ir užsakymai**	**117 days**	**Mon 18.07.02**
12		Pradžia	0 days	Mon 18.07.02
13		Technologinės įrangos parinkimas	20 days	Tue 18.07.03
14		Užsakymai	10 days	Tue 18.07.31
15		Tiekimas	87 days	Tue 18.08.14
16		Pabaiga	0 days	Wed 18.12.12
17		**Katilinės pastato rekonstrukcija**	**70 days**	**Mon 18.12.10**
18		Pradžia	0 days	Mon 18.12.10
19		Esamų pamatų ardymas	20 days	Tue 18.12.11
20		Naujų pamatų po įrangą įrengimas	30 days	Tue 19.01.08
21		Grindų sutvarkymas	5 days	Tue 19.02.19
22		Šildymo vėdinimo sistemos montavimas, priešgaisrinio vamzdyno montavimas	20 days	Tue 19.02.19
23		Pabaiga	0 days	Mon 19.03.18
24		**Technologinės įrangos montavimas**	**70 days**	**Mon 19.02.18**
25		Pradžia	0 days	Mon 19.02.18
26		Pagrindinės įrangos montavimas ant pamatų	20 days	Tue 19.02.19
27		Vamdynų ir dūmų kanalų aprišimas	35 days	Tue 19.03.19
28		Dažymas ir izoliavimas	30 days	Tue 19.04.16
29		Pabaiga	0 days	Mon 19.05.27
30		**Elektros ir automatikos darbai**	**140 days**	**Tue 19.02.19**
31		Pradžia	0 days	Mon 19.05.27
32		Skydų gamyba	80 days	Tue 19.02.19
33		Elektros/automatikos įrangos užsakymas ir tiekimas	80 days	Tue 19.02.19
34		Skydų montavimas	15 days	Tue 19.06.11
35		Kabelinių trasų montavimas	15 days	Tue 19.05.28
36		Elektros ir automatikos kabelių paklojimas	20 days	Tue 19.06.18
37		Elektros/automatikos įrangos montavimas	30 days	Tue 19.06.11
38		Įžeminimo, žaibosaugos įrengimas	15 days	Tue 19.05.28
39		Apšvietimas	15 days	Tue 19.05.28
40		Skydų ir prietaisų pajungimas	30 days	Tue 19.07.16
41		SCADA programavimo darbai	30 days	Tue 19.05.28
42		PLV programavimo darbai	30 days	Tue 19.05.28
43		Gaisro aptikimo signalizacijos įrengimas	10 days	Tue 19.05.28
44		VEI pažyma	5 days	Tue 19.08.27
45		Pabaiga	0 days	Mon 19.09.02
46		**Paleidimo derinimo darbai**	**67 days**	**Tue 19.07.02**
47		Paleidimo derinimo darbų pradžia	0 days	Tue 19.07.02
48		Įrangos šaltas derinimas	7 days	Tue 19.07.02
49		Pakuros mūro džiovinimo darbai	5 days	Thu 19.07.11
50		Katilinės karštas derinimas	15 days	Thu 19.07.18
51		Personalo apmokymas	10 days	Thu 19.07.18
52		Įrangos paleidimas pilnu apkrovimu	20 days	Thu 19.09.05
53		Objekto pabaiga	0 days	Wed 19.10.02
