

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE 2016.04.11 d. SUTARTIES NR. R-04-71-2016

2016 m. rugpjūčio 01 d.

Akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“, juridinio asmens kodas 140249252, kurios registruota buveinė yra Danės g. 8, 92109 Klaipėda, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Valučio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Užsakovas“), ir

Rangovas UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 140605314, kurios registruota buveinė yra Dubysos g. 66, Klaipėda, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Zakario, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šį Susitarimą, kuriame:

1. Vadovaujantis Rangovo prašymu (2016-08-31 d. raštas Nr. 102) ir Rangos sutarties Nr. R-04-71-2016 punktuose 4.6, 4.6.4 suteikta teise, pratęsiame Sutarties punkte 4.1.1. nustatytą darbų užbaigimo terminą iki 2016 spalio 01 d., o vykdomosios dokumentacijos pateikimą iki 2016 lapkričio 01 d.
2. Kiti Sutarties Nr. R-04-71-2016 punktai nekeičiami ir lieka galioti.
3. Koreguojamas ir keičiamas Sutarties priedas Nr. 6 - Darbų atlikimo grafikas, kuris yra neatskiriama šio papildomo susitarimo dalis.
4. Papildomas susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bei tampa neatskiriama Sutarties Nr. R-04-71-2016 dalimi.
5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas tenka Rangovui, kitas Užsakovui.

Pridedama:

1. Pakoreguotas Sutarties priedas Nr. 6 – Darbų atlikimo grafikas.
2. Rangovo UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“ 2016-08-31 raštas Nr. 102.

Užsakovas:

AB "Klaipėdos energija"

Generalinis direktorius

Vytautas Valutis



Jolanta Mickevičienė
Viešųjų ir privačiųjų reikalų grupės vadovė


Algirdas Sakalas
Investicijų valdymo skyriaus
vadovo pavaduotojas

Rangovas:

UAB "Klaipėdos inžinerinių tinklų
statyba"

Generalinis direktorius

Jonas Zakaris

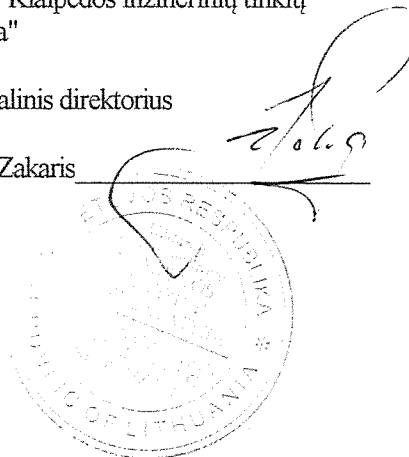


Priedas Nr. 6
 prie 2016-04-11 rangos sutarties
 Nr. R-04-71-2016

**SKIRSTOMŲJŲ ŠILUMOS TINKLŲ IŠ "1Š" IR "2Š" MAGISTRALIŲ
 REKONSTRAVIMO DARBAI KLAIPĖDOS MIESTE
 DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS (patikslintas 2016-08-30)**

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mėnuo						
		04	05	06	07	08	09	10
1.	Priešprojektinės dokumentacijos rengimas ir projektavimas							
2.	Šilumos tinklai nuo J. Janonio g. 16 iki Dariaus ir Girėno g. 8							
3.	Šilumos tinklai nuo kameros 1Š-12-4 iki Jūros g. 25							
4.	Šilumos tinklai nuo kameros 1Š-12-8 iki Danės g. 9 ir 15							
5.	Šilumos tinklai nuo kameros 1Š-12-8-2 iki Danės g. 17							
6.	Šilumos tinklai nuo kameros 1Š-5-5 iki S. Neries g. 6,8,10							
7.	Šilumos tinklai nuo kameros 1Š-5-3-0 iki Liepų g. 47a,49,52,53, Trilapio g. 6							
8.	Šilumos tinklai nuo kameros 1Š-11a iki pastatų H.Manto g.1							
9.	Šilumos tinklai Kretingos g. nuo kameros 2Š-31 iki kameros 2Š-31-1							
10.	Šilumos tinklai nuo kameros 2Š-31-1 iki pastatų V. Berbomo g. 1 ir V. Berbomo g. 3							
11.	Šilumos tinklai nuo kameros 2Š-30b-1 iki 2Š-30b-5, L. Giros g. 5							


Pastaba: Išpildomosios dokumentacijos pateikimo terminas 2016-11-01

Užsakovas:
 AB "Klaipėdos energija"
 Technikos direktorius
 Vilius Buinevičius



Rangovas:
 UAB "Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba"
 Statybos direktorius
 Ramūnas Vinskas

2016-09-01



Uždaroji akcinė bendrovė
**KLAIPĖDOS INŽINERINIŲ
TINKLŲ STATYBA**

Uždaroji akcinė bendrovė, Dubysos g. 66, LT-94107 Klaipėda, Tel. (8 46) 341414, 343850, Faksas (8 46) 340858, El. paštas: kts@takas.lt, Įdarbinys kodas: 1406053113, PVM mokėtojo kodas: LT-406053113

AB „Klaipėdos energija“

2016-08-31 Nr. 102.

Dėl 2016 m. balandžio mėn. 11d. Rangos sutarties Nr. R-04-71-2016

Vykdam 2016-04-11d. Rangos sutartį Nr. R-04-71-2016 „Skirstomųjų šilumos tinklų iš „1Š“ ir „2Š“ magistralių rekonstravimo darbai Klaipėdos mieste“, ruošiant techninį projektą „Skirstomųjų šilumos tinklų rekonstravimas iš „1Š“ magistralės Liepų, Trilapio g. nuo kameros 1Š-5-3-0 iki pastato Liepų g. 53, Klaipėdoje“ ir atliekant derinimus su žemės sklypų ir pastatų savininkais, buvo gauti gyvenamo namo Liepų g. 47A ir sklypo (kadastro Nr. 2101/0003 626) bendrasavininkų raštai, kuriuose jie nesutinka, kad šilumos tiekimo trasa (unikalus Nr. 2195-8014-5061) būtų rekonstruojama jų nuosavo sklypo ribose. Bendru sutarimu buvo nutarta pakeisti rekonstruojamos šilumos trasos vietą, numatant ją AB „Klaipėdos vanduo“ sklypo (kadastro Nr. 2201/0003:347) ribose. Tik atlikus papildomus, nenumatytus techninio projekto derinimus su esamų požeminių komunikacijų ir žemės sklypų naudotojais buvo galima teikti prašymus Kultūros paveldo departamentui ir po to Nacionalinei žemės tarnybai sutikimui gauti. Sutikimas Nr. SUVA-2843-(8.53.13) buvo gautas 2016-07-07. Užregistravus techninį projektą infostatyboje, statybos leidimas Nr. LRS-31-160819-00028 buvo gautas 2016-08-19.

Atsižvelgiant į tai, prašome pratęsti Rangos sutarties Nr. R-04-71-2016 rekonstravimo darbų įvykdymo terminą 1 (vienu) mėnesiu iki 2016 m. spalio mėn. 1d. ir vykdomosios dokumentacijos pateikimą iki 2016 m. lapkričio mėn. 1d.

Pridedama:

1. Šilumos tinklų planas brėž. Nr. 16/647-XX-TP-ŠT-1 – 1 brėž.
2. Liepų g. 47A-1 savininkės K. Stankejevos raštas – 1 psl.
3. Liepų g. 47A-3 savininkės G. Palec raštas – 1 psl.
4. Liepų g. 47A bendrasavininko P. P. Trakumo raštas – 1 psl.

Generalinis direktorius

Jonas Zakaris

Technikos direktorius G. Zymonas
