

**SUSITARIMAS DĖL 2016 M. LAPKRIČIO 25 D. PAPILDOMŲ STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. SUT-57 PRATĖSIMO**

2017 m. gruodžio 14 d.
Vilnius

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 302297628, registruotos buveinės adresas Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Užsakovas**), atstovaujamas Užsakovo direktoriaus pavaduotojo Eduardo Kauklio, veikiančio pagal 2017 m. kovo 1 d. Užsakovo direktoriaus išduotą įgaliojimą Nr. ĮG-5,

ir
Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147732969, registruotos buveinės adresas P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Rangovas**), atstovaujamas Rangovo filialo „Genranga“ direktoriaus Audriaus Buroko, veikiančio pagal 2017-01-02 Rangovo generalinio direktoriaus išduotą įgaliojimą Nr. 31-09, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai **Šalimi**,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- A. 2016 m. lapkričio 25 d. Rangovas ir Užsakovas sudarė papildomų statybos darbų rangos sutartį Nr. SUT-57 (toliau – **Sutartis**);
- B. 2017-11-29 gautas Rangovo pranešimas Nr.61, kuriame informuojama, kad iki 2017-12-31 Sutartis nebus užbaigta dėl to, kad Sutartyje numatyti darbai yra glaudžiai technologiškai susiję su 2013-03-22 Rangos sutartimi Nr. SUT-R-1, kuri nebus laiku įvykdyta dėl 2014–2015 metais skirto nepakankamo finansavimo;
- C. Sutarties termino pratęsimas dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo valios, yra numatytas Sutarties 5.1 punkte. Terminas gali būti pratęsiamas tiek, kiek yra būtina užbaigti darbus, kurių nebuvo įmanoma atlikti dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo valios, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d.

ŠALYS SUSITARIA:

- 1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2018-12-31.
- 2. Patikslinti darbų atlikimo terminą, paaiškinėjus 2018 metams paskirtoms lėšoms.
- 3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.
- 4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
- 5. Susitarimas sudaromas dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
- 6. Susitarimo priedas. Rangovo pranešimas, 1 lapas.

ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI


Užsakovas
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai
Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius
Kodas 302297628
PVM mokėtojo kodas LT100007722511
El. p. info@valdovurumai.lt
Tel. +370 5 212 7476


Eduardas Kauklys
Įgaliotas asmuo



Rangovas
AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
El. p. pst@pst.lt
Tel. +370 45 505503

A. V.
Audrius Burokas
Įgaliotas asmuo

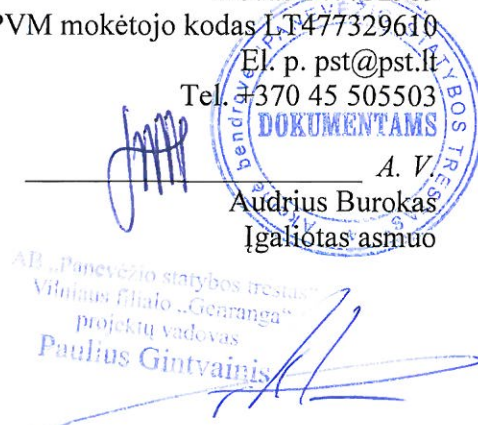



PRANEŠIMAS

Dėl 2014-09-15d. rangos sutarties Nr.SUT-R-2, 2016-05-09 sutarties Nr. SUT-23, 2016-08-22 sutarties Nr. SUT-34 ir 2016-11-25 sutarties Nr. SUT 57 vykdymo.

Kadangi 2013-03-22 sutartis Nr. SUT-R-1 (toliau - Sutartis) dėl nepakankamo finansavimo 2014-2015 metais iki 2017-12-31 nebus užbaigta, o sutartyse 2014-09-15d. Nr.SUT-R-2, 2016-05-09 Nr. SUT-23, 2016-08-22 Nr. SUT-34 ir 2016-11-25 Nr. SUT 57 numatomi darbai yra glaudžiai technologiškai susiję su darbais numatytais sutartyje SUT-R-1 ir jie turi būti atliekami vienu metu ir/ar yra sektiniai-tęstiniai darbai, todėl taipogi nebus užbaigti iki sutartyse numatomos 2017-12-31 dienos.

Todėl atsižvelgdami į Sutarčių nuostatas, prašome pratęsti šias Sutartis 12 mėnesių. Paaiškęjus 2018 metų finansavimui, galėtume sutarti tikslią statybos darbų užbaigimo datą.

AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus filialas „Genranga“
Projektų vadovas

Paulius Gintvainis
