

DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. S-70

**DĖL ŠIRVINTŲ R. ČIOBIŠKIO SEN. JUKNONIŲ K. JUKNONIŲ GATVĖS
ATKARPOS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMO
PASLAUGA PIRKIMO NR. 362705**

**2018 m. kovo 7 d.
Širvintos**

Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „AKORDAS 1“ juridinio asmens kodas 120546940, kurio registruota buveinė yra Utenos g. 41A, Vilnius, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, laikinai einančio direktoriaus pareigas, Mindaugo Karpičiaus, veikiančio pagal UAB „AKORDAS 1“ direktoriaus 2018-01-08 įsakymą Nr. 18-01/04 (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarė šią Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

**I. SUTARTIES OBJEKTAS, GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR
TERMINAI**

1.1. Sutarties objektas – Širvintų r. Čiobiškio sen. Juknionių k. Juknionių gatvės atkarpos kapitalinio remonto darbai su projektavimo paslauga (toliau – Darbai).

1.2. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Užsakovas įsipareigoja priimti kokybišką Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutartyje numatytą kainą.

1.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu visų Darbų atlikimas gali būti sustabdytas dėl šių priežasčių:

1.3.1. dėl su Darbų atlikimu nesuderinamų ekstremalių gamtinių sąlygų (pvz. kritulių kiekis, žymiai besiskiriantis nuo daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų dokumentais);

1.3.2. dėl trečiųjų šalių, tokių kaip inžinerinius tinklus eksploatuojančios įmonės, valstybės įmonės, savivaldos institucijos ir kt., neveikimo arba netinkamo veikimo;

1.4. Visas šias priežastis Rangovas turi pagrįsti dokumentais. Visais atvejais Rangovas privalo Užsakovui dokumentais įrodyti, kad sutartyje numatytos pareigos yra atliekamos laiku ir pakankama apimtimi.

1.5. Dėl minėtų priežasčių sustabdžius Darbus, Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą Darbų atlikimo terminą.

1.6. Darbų atlikimo sustabdymo pradžia fiksuojama Užsakovo raštu.

1.7. Darbų atlikimo sustabdymo pabaiga fiksuojama Užsakovo raštu, gavus raštu pateiktą informaciją iš Rangovo apie minėtų aplinkybių įtakos Darbų vykdymui tinkamai ir laiku išnykimą

1.8. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

1.8.1. šios Sutarties sąlygos;

1.8.2. techninė dokumentacija;

1.8.3. kiti dokumentai.

1.9. Darbų atlikimo vieta – Širvintų r. Čiobiškio sen. Juknionių k.

1.10. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo data. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas

pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), Sutartis nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.11. Techninis darbo projektas (toliau – Projektas) turi būti parengtas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Dabai turi būti atlikti per 3 mėnesius, šis terminas gali būti pratęstas 1 kartą 1 mėnesį.

1.12. Darbų atlikimo terminas šalių sutarimu gali būti pratęstas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

1.12.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui;

1.12.3. dėl esminių statinio projektuotojo klaidų ar netikslumų, turinčių reikšmingos įtakos Darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

1.12.4. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos Darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

1.12.5. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.

1.13. Bendras sutarties galiojimo terminas su apmokėjimu - 8 mėnesiai (su galimais pratęsimais – 9 mėnesiai).

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina yra 184 895,82 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai ir 82 cent.) su PVM.

2.2. Sutarties kainai yra taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara.

2.3. Į sutarties kainą, nurodytą 2.1. punkte įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis, darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos ir mokesčiai, galintys turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį. Sutarties kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą.

2.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

2.4.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kaina perskaičiuojama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pakeisto PVM tarifo įsigaliojimo. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašytu susitarimu. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) (įkainis)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) (įkainis) iki perskaičiavimo

A - Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais).

2.5. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio keitimo perskaičiuojama nebus.

III. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Darbai finansuojami Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

3.2. Avansinis mokėjimas netaikomas. Užsakovas Rangovui apmoka už faktiškai atliktus Darbus, numatytus Sutartyje, pasirašius atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir pateikus PVM sąskaitą-faktūrą, per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, nes Užsakovas mokėjimus atlieka tik gavęs finansavimą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), o mokėjimų dokumentų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos.

3.3. PVM sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.4. Užsakovas numato galimybę tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaromas trišalis susitarimas tarp Užsakovo, Sutartį sudariusio Rangovo ir jo Subrangovo, kuriame aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

4.1.2. nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios.

4.1.4. apmokėti Rangovui už atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai, laiku ir kokybiškai.

4.2. Užsakovas turi teisę:

4.2.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;

4.2.2. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas nepašalina darbų trūkumų per 15 darbo dienų;

4.2.3. nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti;

4.2.4. Užsakovas turi ir kitas Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4.3. Rangovas įsipareigoja:

4.3.1. parengti Projektą pagal Užsakovo patvirtintas technines specifikacijas (techninę užduotį), laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus;

4.3.2. parengus Projektą, parengti ir suderinti su Užsakovu statybos darbų sąmatą;

4.3.3. savo rizika atlikti numatytus statybos darbus kokybiškai pagal suderintą ir Užsakovo patvirtintą Projektą, laikantis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų. Pradėti statybos darbus tik gavęs statybą leidžiančius dokumentus ir perėmęs statybą vietą įstatymų nustatyta tvarka;

4.3.4. per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Šalys nesusitaria kitaip, pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas.

4.3.5. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais;

4.3.6. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą Darbų metu, naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius LST 1335 ir LST 1405 standartų reikalavimus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, automatinės kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti

keliuose ir pan. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklininti Rangovo atributais;

4.3.7. ne vėliau kaip 1 (vieną) darbo dieną prieš pradedant ar keičiant eismo ribojimą informuoti Užsakovą el. paštu;

4.3.8. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

4.3.9. esant būtinumui keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendinius tik gavus jo rašytinį sutikimą;

4.3.10. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų;

4.3.11. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

4.3.12. raštu informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį;

4.3.13. atlikdamas Darbus Rangovas, neturi trukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, privalo leisti Užsakovo ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

4.3.14. savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nustatytus Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus;

4.3.15. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.4. Rangovas turi teisę:

4.4.1. Rangovas turi teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

4.4.2. Rangovas turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatyto laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02% (nulio ir dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo *neatliktų darbų sumos* ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybės.

5.2. Sutarties vykdymo metu, iki Rangovo atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką nepaneigia Rangovo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos Sutarties 5.1. punkte.

5.3. Rangovui nepašalinus trūkumų defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką:

5.3.1. Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius. O Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

5.3.2. Užsakovui pareikalavus, Rangovas įsipareigoja sumokėti 20% (dvidešimties procentų) dydžio baudą nuo nustatytų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimo darbų kainos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius.

5.4. Rangovas, be Užsakovo sutikimo pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, t.y. nesilaikęs Sutarties 8.1. punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 5% (penkių procentų) dydžio baudą nuo visos Sutarties kainos.

5.5. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 (nulio ir dviejų šimtųjų procento) procentų dydžio delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

5.6. Rangovui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 13.1.1. ir 13.1.2. punktų atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

5.7. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

5.8. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

5.9. Rangovas nėra atsakingas už trečiųjų asmenų ar Užsakovo neveikimą ar netinkamą veikimą, dėl kurių negalėjo statybos darbų užbaigti sutartyje numatytu laiku. Rangovui pateikusiame ir tinkamai pagrįdusiame šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami.

5.10. Sutarties 5.9. punkte nurodytos aplinkybės (trečiųjų asmenų ar Užsakovo neveikimas ar netinkamas veikimas) nepaneigia Rangovo pareigos vykdyti statybos darbus pagal Sutartį per Sutartyje nustatytą laiką ir kuriems neturi įtakos trečiųjų asmenų ar Užsakovo neveikimas ar netinkamas veikimas.

VI. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

6.1. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

6.2. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos darbams yra suteikiamas Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

6.3. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

6.4. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą statybos darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią statybos darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

6.5. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti ištaisius statybos darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

6.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darbų defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

VII. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

7.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti ne mažesnę kaip **5 procentų** nuo pirkimo sutarties vertės be PVM banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą. Šis Rangovo pateiktas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jei Sutartis būtų pratęsta, Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas taip pat turi būti pratęstas tam pačiam laikotarpiui. Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos ar laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos ne mažiau kaip 5 (penkias) darbo dienas, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją arba laidavimo raštą.

7.2. Jei Rangovas per Sutarties 7.1. punkte nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

7.3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pasinaudojus sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

VIII. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR STATINIO STATYBOS VADOVO IR PROJEKTO VADOVO KEITIMO TVARKA

8.1. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems Darbams teikti, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovui, ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso sąlygose.

8.2. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę pakeisti Subrangovus tik prieš tai informuodamas Užsakovą šia tvarka:

8.2.1. Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis (subrangovas netinkamai vykdo įsipareigojimus Užsakovui, atsisako atlikti Sutartyje jam numatytus atlikti darbus, nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Užsakovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties), lemiančias poreikį pakeisti Subrangovus, bei pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad naujas Subrangovas atitinka Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei užpildytą ir pasirašytą EBVPD, patvirtinantį, kad nėra naujo Subrangovo pašalinimo pagrindų;

8.2.2. patikrinus naujo Subrangovo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams bei pašalinimo pagrindų nebuvimą, Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

8.3. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti. Užsakovas turi teisę Rangovo pareiklauti



pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, kuris atitinka Darbų pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą Paslaugų ir Darbų pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

IX. PAPILDOMI DARBAI

9.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

9.2. Papildomi (atsisakomi) darbai galimi esant vienai iš šių priežasčių:

9.2.1. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

9.2.2. kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto darbo;

9.2.3. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties.

9.3. Visa su projektavimu susijusi rizika priskiriama Rangovo atsakomybei. Projekto klaidos, praleidimai, dviprasmybės, prieštaravimai, neatitikimų arba kiti trūkumai priskiriami Rangovo rizikai.

9.4. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šios Sutarties 9.2. punktą, įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

9.5. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui).

9.6. Papildomų darbų kaina nustatoma:

9.6.1. pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

9.6.1.1. pritaikant Sutartyje numatytą panašių darbų įkainius, arba

9.6.1.2. išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba

9.6.1.3. panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtinės dalis. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą, remiamasi sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu.

9.6.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės (i) už Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo¹ (toliau – Rekomendacijos) numatytą resursų poreikį ir nustatytas kainas arba (ii) už bendrą vidutinę rinkos kainą, tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 proc. tiesioginių išlaidų.

9.7. Darbų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Užsakovui patvirtinus darbų pakeitimo aktą ir Šalis pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

X. KONFIDENCIALUMAS

10.1. Šalis įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

10.2. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

XI. AUTORINĖS TEISĖS

11.1. Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinės teisės priklauso Užsakovui, kuris galės jį perduoti trečiosioms šalims ir (ar) kitaip naudoti jį ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį. Rangovas atsako, jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalis, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

¹ Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

13.1. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

13.1.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

13.1.2. Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

13.1.3. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

13.1.4. nevykdo Sutarties VII skyriuje nustatytų reikalavimų;

13.1.5. per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;

13.1.6. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

13.2. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

13.2.1. negavęs Užsakovo sutikimo, Darbus paveda vykdyti subrangovui ar kitaip perleidžia Sutartį;

13.2.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

13.2.3. siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

13.2.4. Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

13.3. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 13.1 ir 13.2. punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties III skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

13.4. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

13.5. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties III skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

XIV. GINČAI

14.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

15.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai. Tais

atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

15.3. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ją ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

15.4. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį/įs už pirkimo sutarties vykdymą - Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas Robertas Bartulis, tel. (8 382) 30 273, el. p. robertas.bartulis@sirvintos.lt, sutarties ir pakeitimų paskelbimą - Širvintų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Aušra Mažulienė, (8 382) 53 372, el. p. ausra.mazulienė@sirvintos.lt.

15.5. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą - UAB „AKORDAS 1“ direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Karpičius, tel. (8 699) 47 141.

15.6. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.6. Sutarties priedai:

15.6.1. Techninė dokumentacija;

15.6.2. Rangovo pasiūlymas.

15.7. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS


Širvintų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Kodas 188722373
A.s. Nr. LT20 4010 0420 0006 6690
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
Tel. (8 382) 51 233, faksas: (8 382) 30 270
El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt

RANGOVAS

UAB „AKORDAS 1“
Utenos g. 41 A, LT-08217 Vilnius
Kodas 120546940
PVM kodas LT205469418
A.s. Nr. LT40 7300 0100 0247 8365
„Swedbank“ AB
Banko kodas 73000
Tel. (8 5) 263 7100, faksas: (8 5) 2637300
El. paštas: info@akordas.lt


Administracijos direktorė
Ingrida Baltušytė-Četrauskienė

(parašas)
A. V.



Direktoriaus pavaduotojas
laikinais einantis direktoriaus pareigas
Mindaugas Karpičius

(parašas)
A. V.



Parengė Viešojo pirkimo komisija
Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Investicijų skyriaus vedėja

(parašas)
Dovilė Audėjūtė

(parašas)
Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjo pavaduotojas

(parašas)
Justinas Kontrimavičius

(parašas)
Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus
Biudžetinės patalpos v. y. specialistė, atliekanti
Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus
Biudžetinės patalpos vedėjo funkcijas

(parašas)
Vilma Anskaitė

AKORDAS-1

Širvintų rajono savivaldybės administracija

**PASIŪLYMAS
DĖL ŠIRVINTŲ R., ČIOBIŠKIO SEN., JUKNONIŲ K., JUKNONIŲ GATVĖS
ATKARPOS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMU PIRKIMO**

2018-02-01 Nr. 18-01/21

Vilnius

Dalyvio pavadinimas ir kodas	UAB „AKORDAS-1“, 120546940
Dalyvio adresas	Utenos g.41A, LT – 08217 Vilnius
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Alma Barauskienė
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Alma Barauskienė
Dalyvio el. pašto adresas	info@akordas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt> kartu su skelbimu apie pirkimą;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlome šias darbų kainas:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina be PVM, Eur
1.	Širvintų r., Čiobiškio sen., Juknionių k., Juknionių gatvės atkarpos kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas	
2.	Širvintų r., Čiobiškio sen., Juknionių k., Juknionių gatvės atkarpos kapitalinio remonto darbai	
Pasiūlymo kaina be PVM		152.806,46
PVM 21%		32.089,36
Pasiūlymo kaina su PVM		184.895,82

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 184 895,82 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai ir 82 euro centai)

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos su tiekėjo patiriamos pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.




Informacija apie subtiekejus, kuriais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

UAB „AKORDAS-1“
Registracijos Nr. IP91-1648
Reg. data 1991.05.21
VI Registrų centras

Utenos g. 41a
LT-08217 Vilnius
Įmonės kodas 120546940
PVM mok. k. LT205469418

Tel.: 2637100, 2102197
Faks. 2637300
El. p. info@akordas.lt
www.akordas.lt

AB SEB bankas
A.s. LT42 7044 0600 0389 6317
Swedbank, AB
A.s. LT40 7300 0100 0247 8365


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS)

ŠIRVINTŲ R. ČIOBIŠKIO SEN. JUKNONIŲ K. JUKNONIŲ GATVĖS ATKARPOS KAPITALINIO REMONTO DARBAI SU PROJEKTAVIMO PASLAUGA

1. **Statytojas (užsakovas):** Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.
2. **Statinio pavadinimas** – Širvintų r. Čiobiškio sen. Juknionių k. Juknionių gatvės atkarpos kapitalinio remonto darbai su projektavimo paslauga.
3. **Statybos vieta** Širvintų r. Čiobiškio sen. Juknionių k.
4. **Statinio kategorija** – Nesudėtingas.
5. **Statinio rūšis** – inžineriniai statiniai.
6. **Projekto rūšis** – Kapitalinio remonto aprašas.
7. **Inžinerinio statinio rodikliai:**
8. **Ilgis** – apytiksliai 880 m.
9. **Eismo juostų skaičius** – 2.
10. **Kelio kategorija** - II.
11. **Projekto darbų apimtis:**
 - 11.1. Techninis darbo projektas, vieno etapo projektas (toliau – Projektas).
 - 11.2. Topografinė nuotrauka.
12. **Projekto apimtis:**
 - 12.1. Bendroji dalis.
 - 12.2. Susisiekimo dalis.
 - 12.3. Melioracijos dalis (jei yra).
 - 12.4. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.
 - 12.5. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.
 - 12.6. Darbų kiekių žiniaraščiai.
 - 12.7. Numatyti saugaus eismą reguliuojančias priemones.
 - 12.8. Kitos privalomos Projekto dalys.
13. **Projekto tikslas: parengti** – kelio kapitalinio remonto darbų techninį darbo projektą, siekiant pagerinti susisiekimo infrastruktūrą.
14. **Projektą parengti pagal pateiktus reikalavimus:**
 - 14.1. Kelio atkarpos ilgis apie – 880 m, plotis – 4,5 m.
 - 14.2. Vadovaujantis Automobilinių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 turi būti įrengiama kelio danga VI dangos konstrukcijos klasei. Minimalūs Užsakovo reikalavimai remontuojamai kelio dangai:
 - 14.2.1. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis – ne mažiau kaip 30 cm. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimui naudojamos medžiagos turi atitikti TRA SBR 07 reikalavimus. Šio punkto reikalavimus Rangovas turi įvertinti pasiūlymo rengimo metu savo rizika ir atsakomybe.
 - 14.2.2. Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo skaldos mišinio 0/45 – sluoksnio storis ne mažiau kaip 15,0 cm.
 - 14.2.3. Viensluoksnė danga iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio – sluoksnio storis ne mažiau kaip 6,0 cm.
 - 14.2.4. Kelkraščio sustiprinimas smėlio-žvyro mišiniu - sluoksnio storis ne mažiau 6,0 cm.
 - 14.2.5. Ties nuvažomis dangos konstrukcijos asfaltbetonio danga išplatinama 30,0 cm.
 - 14.2.6. Vandens nuvedimui suprojektuoti pralaidas (jei reikalinga)
 - 14.3. Numatyti esančių medžių, krūmų, kelmų pašalinimą kelio apsaugos zonoje.
 - 14.4. Planuojamos naudoti medžiagos – visos medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvos Respublikoje.



14.5. Projekto parengimui atlikti reikalingus tyrinėjimus (inžinerinė geodezija, topografija, ir kt. dokumentai), dokumentus ir duomenis gauna, rengia ir atlieka projekto rengėjas.

15. Projekto įforminimo ir komplektavimo reikalavimai:

15.1. Rengiant Projektą būtina vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimais.

15.2. Rengiant Projektą būtina vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei atsižvelgiant į įregistruotus gyventojų ir gatvių sklypus.

15.3. Vadovautis atitinkamų organizacijų išduotomis specialiosiomis sąlygomis (projektavimo užduoties priedai), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, KTR 1.01.2008, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-29 ir kitais statybą bei projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais.

15.4. Prieš rengiant Projektą parengti pasiūlymus ir juos suderinti su Širvintų rajono savivaldybės administracija. Taip pat parengtą Projektą suderinti su institucijomis teisės aktu nustatyta tvarka, prireikus ir su trečiaisiais asmenimis.

15.5. Parengtą Projektą pateikti Statytojo nurodytam Projekto ekspertui ir ištaisyti eksperto nurodytas pastabas, atlikti visus parengto Projekto sprendinių derinimus su kompetentingomis institucijomis ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu jis privalomas). Pataisyti Projektą pagal gautas pastabas. Širvintų rajono savivaldybės administracijai pateikiami 3 originalūs parengto Projekto egzemplioriai popieriniu variantu ir 3 CD.

15.6. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, projektuotojas privalės neatlygintinai taisyti techninį projektą pagal pateiktas pastabas.

15.7. Projektuotojas privalo organizuoti Statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrą: teikti dokumentaciją Širvintų rajono savivaldybės administracijai, šalinti dokumentacijos trūkumus, teikti paaiškinimus ir kitaip atstovauti Užsakovą iki kol bus gautas statybą leidžiantis dokumentas.

15.8. Neatlygintinai pakeisti, papildyti, pataisyti techninio projekto sprendinius, jeigu darbų pirkimo metu ir/ar darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai.

16. Darbai.

17. Darbai atliekami pagal parengtą kapitalinio remonto projektą, projekte nurodytus darbų ir medžiagų kiekius. Rangovas turi įvertinti riziką dėl projekto galimų sąnaudų žiniaraščiuose pasikeitusių darbų kiekių.

18. Darbai atliekami pagal Kelių techninio reglamento KTR 1.10:2008 „Automobilių keliai“, Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

19. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.


20. Projektas turi būti parengtas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbų atlikimo terminas 3 mėn. (galimybė pratęsti – 1 mėn.).

Priedai:

Maps.lt schema.



REGIA

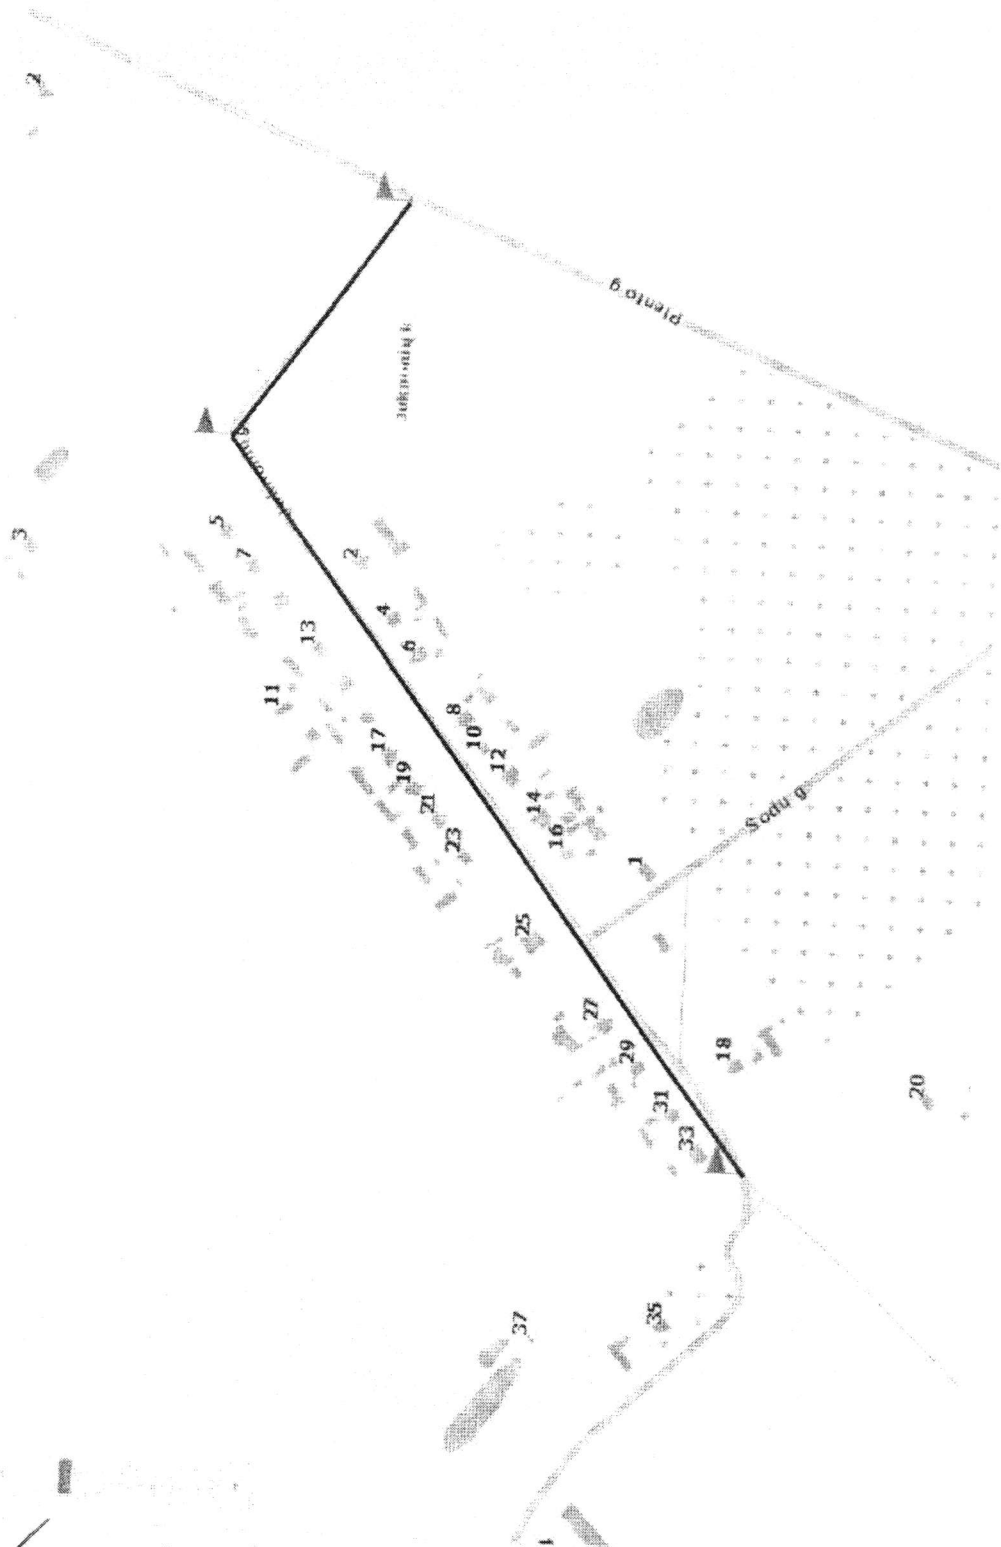

Handwritten signatures and notes:

Chud...
 ...
 ...
 ...
 ...
