

RANGOS SUTARTIS Nr. 15-(S29)- 7/1

2015 m. vasario 24 d.

Šiauliai

AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialas, atstovaujamas filialo direktoriaus Algirdo Gavėnavičiaus, toliau vadinamas Užsakovu ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, toliau vadinama Rangovu, remdamiesi apklausos sąlygomis ir rezultatais, sudarėme šią sutartį.

I. Sutarties objektas

1. Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio sklype 9177/0004:559, Voveriškių k.v., Šiaulių r. sav. projektavimo ir statybos darbai, kurių atlikimo sąlygos ir apimtys išdėstytos šioje sutartyje bei pirkimų sąlygose, taip pat visi darbai, susiję su šių darbų įgyvendinimu, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti.

II. Sutarties objekto kaina ir mokėjimo tvarka

2. Sutarties objekto kaina yra 12283,00 Eur (dvylika tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt trys Eur, 00 Eur ct) plius PVM.

3. Užsakovas Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus, remiantis šalių pasirašytais atliktų darbų aktais (F-2) ir pažymomis (F-3) bei PVM sąskaitomis faktūromis yra atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo, bet ne daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) proc. darbų kainos. Paskutinis apmokėjimas už atliktus darbus turi sudaryti ne mažiau 10 (dešimt) proc. darbų kainos ir jis vykdomas tik pasirašius statybos užbaigimo dokumentus. Paskutinio apmokėjimo terminas – ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po statybos užbaigimo dokumentų pasirašymo dienos. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Užsakovo nurodytų darbų defektų ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą, ar kitaip pažeidė šios sutarties sąlygas.

4. Draudžiama didinti paslaugų ir darbų kainą per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką ir keisti privalomas apklausos metu nustatytas sudarytos sutarties sąlygas, išskyrus atvejus nurodytus sutarties 49 punkte ir/ar kainų pasikeitimą dėl pasikeitusių pridėtinės vertės mokesčių.

III. Darbų atlikimo trukmė ir jų eiga

5. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį, gavęs techninę užduotį projektavimui ir užbaigia iki 2015 m. kovo 31 d.

6. Rangovui parengus ir pateikus suderintą projektą, statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas iki 2015 m. gegužės 29 d. Terminas netenka galios gavus nepritarimą statinio projektui.

7. Rangovas statybos darbus pradeda turėdamas, kaip reikalauja Statybos įstatymas, statinio projektą, statybą leidžiantį dokumentą ir užbaigia iki 2015 m. liepos 24 d.

8. Užsakovas atlieka pastatyto dujotiekio prijungimo bei dujų paleidimo darbus.

9. Užsakovas turi darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus sutartyje numatytų darbų atlikimui.

10. Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu.

11. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teisę raštu pareikšti savo abejones per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 7 (septynios) darbo dienos.

IV. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai

12. Užsakovas įsipareigoja:

12.1 Pagal Rangovo parengtą ir suderintą projektą gauti statybą leidžiantį dokumentą.

12.2 Priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal šios sutarties II dalyje nurodytą mokėjimo tvarką. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Rangovo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti statybos techniniame pase. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti statybos techniniame pase nurodyti trūkumai.

12.3 Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, sutarties vykdymo kontrolę.

12.4 Pagal galimybes, sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ir pateikti Rangovui būtinus dokumentus šios sutarties 1 punkte numatytiems darbams atlikti.

12.5 Rangovui užbaigus visus statybos darbus ir pateikus reikiamą statybinę dokumentaciją, dujotiekių kontrolines geodezines nuotraukas, VEI aktą-pažymą, organizuoti statybos užbaigimo įforminimo procedūrą.

12.6 Užsakyti ir apmokėti objekto kadastrinių matavimų bylos parengimą.

12.7 Užsakyti ir apmokėti nekilnojamojo daikto ir nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistravimą.

12.8 Atlikti nutiesto dujotiekio prijungimą prie veikiančio dujotiekio.

12.9 Organizuoti reikiamų servituto sutarčių tarp AB „Lietuvos dujos“ ir žemės savininkų sudarymą.

13. Rangovas įsipareigoja:

13.1 Kokybiškai ir laikantis sutarties 5 ir 7 punktuose nurodytų terminų atlikti sutarties 1 punkte nurodytus darbus, vadovaujantis šios sutarties sąlygomis, pirkimų sąlygomis, taip pat galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

13.2 Projektavimo darbai:

13.2.1 pagal pateiktą Projektavimo techninę užduotį, vadovaujantis norminių dokumentų reikalavimais, parengti ir suderinti projektą;

13.2.2 per 21 kalendorinę dieną po Rangos sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui suderintą topografinį planą, kuriame pažymėti projektuojami dujotiekio tinklai;

13.2.3 esant būtinumui pakeisti schemeje nurodytos dujotiekio trasos vietą, šį sprendimą suderinti su Užsakovu;

13.2.4 parengtam projektui gauti žemės savininkų (trečiųjų šalių), per kurių žemės sklypus yra projektuojamas dujotiekis ir/ar priartėja prie jų arčiau nei 2 m, raštiškus sutikimus;

13.2.5 parengtam projektui, gauti rašytinius pritarimus iš subjektų į kurių apsaugos zoną patenka suprojektuotas statinys (dujotiekis);

13.2.6 gauti būtinus dokumentus/leidimus dujotiekio tiesimui (statybai), transporto priemonių privažiavimui bei kitiems darbams vykdyti;

13.2.7 esant poreikiui, organizuoti archeologinius tyrinėjimus;

13.2.8 esant būtinumui, kai projektuojamas dujotiekis kerta melioracijos sistemas ir jas reikia atstatyti, pagal šių sistemų savininkų keliamus reikalavimus, parengti bei gauti ekspertizės išvadas melioracijos sistemų atstatymo projektui;

13.2.9 parengtą dujotiekio projektą (2 egzempliorius grafinėje formoje ir 1 skaitmeninėje laikmenoje) pateikti Užsakovui (Projektų įgyvendinimo skyriui). Kartu su projektu pateikti:

13.2.9.1 lokalinę sąmatą;

13.2.9.2 vadovaujantis norminiais dokumentais, Projektuotojo ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą (draudimo sutarties kopiją, nurodant draudimo įmonę, draudimo sumą ir pagrindines draudimo sąlygas).

13.3 Statybos darbus pradėti tik gavus, pagal parengtą projektą, statybą leidžiantį dokumentą.

13.4 Gauti žemės darbų bei kitų statybos darbų vykdymui reikalingus leidimus.

13.5 Statybos darbų pradžią registruoti pas Užsakovą (AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialo Eksploatavimo tarnyba);

13.6 Statybos darbų apimtys:

13.6.1 statybos darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas - pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į statybos vietą;

13.6.2 dujotiekio trasos nužymėjimas;

13.6.3 žemės darbai:

13.6.3.1 tranšėjos iškasimas/užkasimas, apsauginio sluoksnio įrengimas;

13.6.3.2 išardytų dangų atstatymas į pirminę padėtį;

13.6.4 vamzdžių suvirinimas, klojimas, fasoninių dalių, dujotiekio įtaisų montavimas;

13.6.5 dujotiekio vamzdžių betranšėjis tiesimas uždaru būdu, bei tiesimas dėkluose atviru būdu (pagal poreikį);

13.6.6 suvirinimo siūlių kontrolė;

13.6.7 sumontuoto dujotiekio bandymas, išvalymas ir nusausinimas;

13.6.8 statybvietės aplinkos tvarkymo darbai.

13.7 Dujotiekio trasos geodezinių nuotraukų parengimas.

13.8 Kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti statybos projekte, bet juos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą.

13.9 Esant būtinumui, pasamdyti atestuotą techninį prižiūrėtoją bei subrangovą melioracijos sistemų atstatymui.

13.10 Numatomų darbų, dėl kurių reikia apriboti arba nutraukti dujų tiekimą, datą Rangovas privalo suderinti su AB "Lietuvos dujos" Šiaulių filialo Eksploatavimo tarnyba.

13.11 Dalyvauti statybos užbaigimo procedūroje kartu su Užsakovu.

13.12 Apsidrausti Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Civilinės atsakomybės draudimas (objektui atskirai) turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po sutarties įvykdymo galutinio termino.

13.13 Apsidrausti projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.14 Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi darbų atlikimui pagal projektą. Rangovo naudojamos medžiagos turi būti naujos, anksčiau nenaudotos ir pagamintos ne seniau kaip prieš du metus, gaminiai ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus).

13.15 Įsigaliojus sutarčiai, pranešti Užsakovui statybos vadovo ir specialiųjų statybos darbų vadovų pavardes, adresus ir telefono numerius.

13.16 Užtikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą šios sutarties 1 punkte numatytiems darbams atlikti.

13.17 Atsakyti ir padengti nuostolius trečiosioms šalims, jei pažeistos jų teisės ar interesai dėl Rangovo ar subrangovų kaltės, bei atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl Rangovo netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų (įskaitant, bet neatsiribojant, sutartyje nurodytų terminų praleidimą).

13.18 Atliekant darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, priešgaisrinių ir saugos darbe teisės aktų reikalavimų, tinkamai instrukuoti savo darbuotojus šiais klausimais; užtikrinti visų asmenų, kurie turi teisę būti Rangovo veiklos teritorijoje, saugą darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti atliekamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekiltų grėsmė Rangovo, Užsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei jų turtui; atsiradus bet kokiam pažeidimui šiuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai Užsakovą ir atitinkamas institucijas.

13.19 Visiškai atsakyti už subrangovinę veiklą.

13.20 Vykdamas darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Statybos reglamentų reikalavimų bei projekto sąlygų.

13.21 Nekokybiškai atliktus darbus perdaryti savo sąskaita per Užsakovo raštiškai nurodytą terminą.

13.22 Suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir darbo kokybę ir tikrinti statybos eigą.

13.23 Priduoti sutartyje numatytus darbus Užsakovui, statybos užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus.

13.24 Pateikti Užsakovui visą reikiamą dokumentaciją apie atliktus darbus.

13.25 Dalyvauti pastatyto dujotiekio statybos užbaigimo dokumento pasirašymo procedūroje.

13.26 Operatyviai, ne vėliau kaip per 5 (penkių) kalendorinių dienų terminą, pašalinti statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus ir nurodytus trūkumus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.

13.27 Baigus statybos darbus atstatyti dangas, sutvarkyti gerbūvį, bei statybvietėje aplinką. Darbų vykdymo eigoje visos atsirandančios šiukšlės ir/ar statybinis laužas turi būti Rangovo išvežtos į sąvartyną. Užsakovui pateikti atliekų pridavimo dokumento kopiją. Jeigu šio reikalavimo Rangovas nevykdo, Užsakovas, įspėjęs raštu Rangovą, samdo savo nuožiūra įmonę, išvežančią šiukšles, ir jas išveža Rangovo sąskaita.

13.28 Kartu su atliktų darbų aktu F-2, pažyma F-3 ir PVM sąskaita-faktūra, pateikti Užsakovui:

13.28.1 pastatyto dujotiekio geodezinę nuotrauką grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate ir LKS-94 koordinatinių sistemoje (po 1 egz.));

13.28.2 dokumentų kopijas apie mokėjimą už leidimą žemės kasinėjimo darbams, Energetikos inspekcijos pažymą, telekomunikacijų ir/ar kitų trasų rodymą bei kitus reikiamus dokumentus.

V. Garantijos ir atsakomybė

14. Rangovas garantuoja, kad atliktų darbų aktų pasirašymo metu jo atlikti darbai atitiks sutarties sąlygas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų jų vertę.

15. Darbai, atlikti nekokybiškai arba su trūkumais, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmesti Užsakovo, kaip neatitinkantys sutarties nuostatų, turi būti ištaisomi Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą. Jei minėtas terminas viršija šios sutarties 5 ir 7 punktuose nustatytus terminus, tai Rangovas moka Užsakovui šios sutarties 35 punkte nustatytus delspinigius.

16. Jei Rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per šios sutarties 15 punkte nurodytą terminą nepašalina, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

17. Jei darbas atliekamas iš Rangovo medžiagų ir gaminių, tai už jų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pagal pirkimo-pardavimo sutartį.

18. Rangovas pastatytiems statiniams (atliktiems darbams) suteikia 5 (penkių) metų garantiją (skaičiuojant nuo statybos užbaigimo dokumento patvirtinimo dienos), paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų, o tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų.

19. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

20. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir defektus pašalinti per Užsakovo raštiškai nurodytą terminą, skaičiuojant jo pradžią nuo gedimų ir defektų užfiksavimo dienos.

21. Jei Rangovas neatvyksta įvertinti defektų ar atsisako juos pašalinti, Užsakovas turi teisę juos pašalinti savo jėgomis arba pasitelkęs kitus Rangovus. Tuo atveju Rangovas privalo atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas už atliktus defektų pašalinimo darbus.

22. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, taip pat, kad darbai neareštuoti ir kad jie nėra teisminio ginčo objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja, kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Užsakovo nuosavybės teisei į perduodamus darbus.

23. Rangovui pažeidus šios sutarties 21, 22 punktų reikalavimus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti sutarties objekto kainą, sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal šią sutartį ir/arba nutraukti sutartį dėl Rangovo kaltės.

24. Rangovas apmoka už visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iškvietimus, vertimus ir kt., kurių gali reikalauti bet kuri įgaliota valstybinė institucija ar įstaiga, bet kuriai darbų daliai patikrinti, bei pateikia visus pranešimus, įsipareigojimus, garantijas ar užstatus, reikalingus gauti leidimą darbų atlikimui ar panašiai.

25. Rangovas privalo Užsakovui grąžinti Rangovui sumokėtas sumas pagal pateiktus atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras ir atlyginti Užsakovo turėtus nuostolius bei išlaidas, patirtas dėl trečiųjų asmenų pareikštų teisių ar pretenzijų į atliktus darbus, taip pat dėl išaiškėjusių bet kokių kitokių nuosavybės teisės į perduodamus darbus apribojimų.

VI. Įranga, medžiagos, darbų kokybė ir techninė dokumentacija

26. Rangovas darbams atlikti naudoja medžiagas, gaminius ir įrenginius, numatytus paruoštame projekte, taip pat atitinkančias pirkimų sąlygų reikalavimus ir pateikto pasiūlymo sąlygas.

27. Dujotiekio vamzdžių techniniai parametrai:

27.1 požeminiai polietileniniai vamzdžiai (PE100, SDR11) turi atitikti LST EN 1555 reikalavimus;

27.2 požeminiai plieniniai dujotiekio vamzdžiai turi atitikti LST EN 10220, LST EN 10208, LST EN 12007 reikalavimus su išorine PE izoliacija – DIN 30670, vamzdžių izoliavimas – DIN 30672.

28. Rangovas užtikrina, kad darbų kokybė atitiks tokios rūšies darbams taikomus reikalavimus.

29. Rangovas sutinka, kad netinkama darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami perdavimo-priėmimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais nurodymais.

VII. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė

30. Šalis, negalinti vykdyti sutartyje bei jos prieduose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant raštu pranešti apie tai kitai šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

31. Užsakovui turi būti pranešta raštu ir su juo suderinti darbai, kurių vykdymui Rangovas sudarys subrangos sutartis, taip pat apie šių sutarčių darbų apimtį. Subrangovinius darbus gali atlikti tik Rangovo pasiūlyme nurodytos įmonės.

32. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

33. Vienai iš šalių daugiau kaip 10 (dešimt) dienų laikotarpyje nevykdant šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, antroji šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą.

34. Vienai iš šalių nesavalaikiai vykdant bet kurį iš šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, kaltoji šalis privalo mokėti antrajai šaliai delspinigius po 0,05 procento nuo laiku neatliktų įsipareigojimų sutartinės kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos.

35. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

36. Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi tenka Rangovui.

37. Rangovas yra atsakingas už savo ir Užsakovo turto saugumą objekte, įskaitant darbuotojų, darbo priemonių, įrengimų, mechanizmų ir trečiųjų asmenų nuosavybės saugumą.

38. Jei Rangovas vykdydamas darbus neužtikrina jų kokybės, kitaip nevykdo šios sutarties reikalavimų, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliamas bankroto byla, ar jei dėl šioje sutartyje nustatytų terminų nesilaikymo, Rangovas negalės užbaigti darbų sutartyje nustatytu laiku, Užsakovas gali, prieš keturiasdešimt aštuonias (48) valandas raštiškai pranešęs Rangovui, nutraukti jo teises tęsti darbus ar jų dalį arba nutraukti šią sutartį, sustabdyti mokėjimus už darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

39. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, prieš 14 (keturiolika) dienų raštiškai įspėti Rangovą, atsisakyti sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl sutarties nutraukimo.

40. Jei darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai ir Rangovas per nustatytą laiką jų nepašalina, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

41. Terminų, nustatytų šioje sutartyje, pažeidimas yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu, ir sutartis, raštu įspėjus sutartį pažeidusią šalį prieš 14 (keturiolika) dienų, gali būti vienašališkai nutraukta.

42. Šalims nutraukus sutartį 39 punkto pagrindu, Rangovas iki sutarties nutraukimo privalo perduoti Užsakovui atliktus darbus, o Užsakovas atsiskaityti už juos šioje sutartyje numatyta tvarka.

VIII. Nenugalima jėga

43. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

44. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę

nutraukti Sutartį. Nutraukus sutartį, šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

IX. Bendrosios sąlygos

45. Ši sutartis įsigalioja, kai abi šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais.

46. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi pirkinų sąlygomis, Rangovo pasiūlymu, dujotiekio statybos techninės priežiūros ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios sutarties sąlygomis.

47. Visa šalių viena kitai pateikta techninė, finansinė, komercinė ir kita informacija, susijusi su šia sutartimi, yra konfidenciali. Už šios informacijos atskleidimą tretiesiems asmenims be kitos šalies rašytinio sutikimo šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Atliekant darbus Rangovas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nuostatomis, kitais norminiais teisės aktais bei šiomis sąlygomis:

48.1 Prieš darbų pradžią Rangovas Užsakovui pateikia darbų atlikimo grafiką, paskirtų darbų vadovų ir darbuotojų sąrašą.

48.2 Jei darbai bus atliekami veikiančiame dujofikuotame objekte ar kituose Užsakovui priklausančiuose objektuose, Užsakovas Rangovui objektą darbų vykdymui perduoda tik surašius SDF-14 formą „Aktas-leidimas pradėti statybinius darbus veikiančiame dujofikuotame objekte“.

48.3 Šalys užtikrina teisės aktų bei pasirašytų sutarčių įsipareigojimų vykdymą.

48.4 Užsakovas, prieš pradėdamas statybos darbus pagal kiekvieną konkrečią darbų rūšį, Rangovus instruktuoja vadovaujantis AB „Lietuvos dujos“ generalinio direktoriaus 2013 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1-100 patvirtinto AB „Lietuvos dujos“ darbuotojų saugos ir sveikatos, darbų technologijos, skirstymo sistemos įrenginių eksploatavimo, darbo įrenginių ir asmeninių apsaugos priemonių naudojimo, gaisrinės saugos instrukcijų rengimo ir darbuotojų instruktavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialo direktoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 1-105 „Dėl AB „Lietuvos dujos“ darbuotojų saugos ir sveikatos, darbų technologijos, skirstymo sistemos įrenginių eksploatavimo, darbo įrenginių ir asmeninių apsaugos priemonių naudojimo, gaisrinės saugos instrukcijų rengimo ir darbuotojų instruktavimo tvarkos“.

48.5 Užsakovas Rangovų instruktavimą įformina „Darbuotojų saugos ir sveikatos registravimo kortelėje“, nurodydamas teisės aktą ar instrukciją pagal kurią jie instruktuojami.

48.6 Jeigu Rangovas vykdo darbus dujofikuotame veikiančiame objekte, Užsakovas skiria kvalifikuotą darbuotoją darbų priežiūrai, objekto nustatytų darbo parametrų stebėjimui, dujų koncentracijos darbų vykdymo aplinkoje matavimui, kitų veiksmų, galinčių sukelti nenumatytas pasekmes, kontrolei.

49. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi šiais atvejais:

49.1 Šalių, rašytiniu sutarimu, darbų pradžios ar pabaigos terminai gali būti pratęsti jeigu:

49.1.1 Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir Rangovas negali vykdyti darbų;

49.1.2 Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo darbų atlikimo terminams;

49.1.3 valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti darbus;

49.1.4 vykdant darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas projekto keitimas, trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti tiesiamas dujotiekis, delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą ar nustatyti servitutą (ar kitas žemės naudojimo sąlygas), naujų aplinkybių, kurioms esant būtina peržiūrėti vartotojui išduotas prisijungimo sąlygas, atsiradimas ir pan.);

49.1.5 Rangovo darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik žiemos metu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.) ir nepalankios meteorologinės sąlygos įtakoja konkrečių darbų numatytą grafiką vykdymą.

49.2 Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie 49 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą.

50. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

51. Iškilusius nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

52. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuvių kalba bei saugoma ją pasirašiusių šalių.

X. Sutarties priedai

53. Sąmata, Priedas Nr. 1

-1 lapas.

54. Projektavimo techninė užduotis 2014-05-26 Nr. S-S25-1694, Priedas Nr. 2

-2 lapai.

XI. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos

55. Užsakovo:

AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialas

Įm. kodas 144082690, PVM mokėtojo kodas LT200595219

A/s LT49 7044 0600 0625 1739 AB SEB bankas

P.Cvirkos g. 77, LT-77165, Šiauliai; tel. (8 41) 591 110, faks. (8 41) 591 100

56. Rangovo:

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, Reg. Nr. AB92-160 Šiaulių m. savivaldybė

Įm. kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219

A/s LT647300010086710599 AB bankas „Swedbank“, Banko kodas 73000

Bačiūnų g. 12, LT-77109, Šiauliai; tel. (8-41) 598 181, faks. (8-41) 598 180

Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“

Šiaulių filialas

A.V. Filialo direktorius

Algirdas Gavėnavičius



Rangovas

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

A.V. Direktorius

Leonas Čepulis

AB "LIETUVOS DUJOS"

ŠIAULIŲ FILIALAS

Įmonės kodas 144082690

Algirdas Gavėnavičius

AKCINĖS BENDROVĖS "LIETUVOS DUJOS"

ŠIAULIŲ FILIALAS

Įmonės kodas 144082690

Algirdas Gavėnavičius

2015-02-27

Vyresnysis teisininkas

2015-02-27 Leonas BENIUSIS

AKCINĖS BENDROVĖS "LIETUVOS DUJOS"

ŠIAULIŲ FILIALAS

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovas

gruodžio vyresnysis buhalteris

Širma BAPŠČIAUSKAITA

2015-02-27

Suderinta: 14.86243 TUKST. Sur
ATSAKINGAS ATSTOVAS

TVIRTINU: 14.86243
ATSAKINGAS ATSTOVAS

Objekto pavadinimas: Vidurinio slėgio skirstomojo dujų objekto sklype kad. Nr. 9177/0004:559, Voveriškių k.v., Šiaulių r., projektavimo ir statybos darbai.

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Numatomas kiekis	Kaina, Eur	
				Vieneto kaina	Iš viso
1.	Žemės darbai (tranšėjos ruošimas dujotiekio vamzdžiui kloti)	m'	435	7,00	3045,00
2.	Grunto transportavimas iš objekto ir į objektą (įvertinant grunto kainą)	m'	0	0,00	0,00
3.	Dujotiekio D 40 mm ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m'	435	6,00	2610,00
4.	Dujotiekio vamzdžiai D40 mm	m'	435	1,50	652,50
4.1	Dujotiekio vamzdžiai D... mm	m'	0	0,00	0,00
5.	Dujotiekio medžiag. (fason. dal.) D40	vnt.	0	873,00	873,00
6.	Dangų ardymas:				622,50
6.1.	asfalto dangos ardymas	m2	0	0,00	0,00
6.2.	žvyro dangos ardymas	m2	415	1,50	622,50
6.3.	žaliatvio (plytelių) ardymas	m2	0	0,00	0,00
6.4.	trinkelio dangos ardymas	m2	0	0,00	0,00
6.5.	akmens grindinio ardymas	m2	0	0,00	0,00
6.6.	kiti darbai				0,00
7.	Dangų atstatymas:				2590,00
7.1.	asfalto dangos atstatymas 1 sl.	m2	0	0,00	0,00
7.2.	asfalto dangos atstatymas 2 sl.	m2	0	0,00	0,00
7.3.	žvyro dangos atstatymas	m2	415	6,00	2490,00
7.4.	žaliatvio (plytelių) atstatymas	m2	0	0,00	0,00
7.5.	trinkelio dangos atstatymas	m2	0	0,00	0,00
7.6.	akmens grindinio atstatymas	m2	0	0,00	0,00
7.7.	žalių vejos atstatymas	m2	2,0	5,00	10,00
7.8.	kiti darbai				0,00
8.	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių D90 mm tiesimas (įvertinant dėklus):	m'	0	0,00	0,00
9.	NDSRA) montavimo darbai (be spintelės kainos)	vnt.	0	0,00	0,00
10.	Uždaromosios armatūros D40 montavimo darbai (be armatūros kainos)	vnt.	1	150,00	150,00
11.	Uždaromosios armatūros kaina, D40 mm	vnt.	0	0,00	0,00
12.	Išplovimas į veikiančią dujotiekį (įpjova)				40,00
12.1	Į požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas	vnt.	1	40,00	40,00
13.	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos:				1670,00
13.1.	Projektavimo darbai	obj.	1	850,00	850,00
13.2.	Topografinė nuotrauka	obj.	1	400,00	400,00
13.3.	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.	1	350,00	350,00
13.4.	Leidimas žemės kasinėjimo darbuams	obj.	1	70,00	70,00
13.5.	Trasos nužymėjimas	obj.	0	0,00	0,00
13.6.	kiti darbai				0,00
14.	Kitos statinio išlaidos:				30,00
14.1.	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą	obj.	0	0,00	0,00
14.2.	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą	obj.	1	30,00	30,00
14.3.	Mokestis už archeologinius tyrinėjimus	obj.	0	0,00	0,00
14.4.	Mokestis už dangų pagrindų laborat. kontrolę	obj.	0	0,00	0,00
14.5.	Melioracijos sistemų atstatymas	obj.	0	0,00	0,00
14.6.	Kelių ženklų pastatymas	obj.	0	0,00	0,00
				Viso be PVM	12283,00
				PVM 21 %	2579,43
				Viso su PVM	14862,43

Rangovas: _____
(pareigos, vardas, i. t. a.)

(parašas, data)
A.V.

A.V.

Viso be PVM

12283.00

PVM 21 .

3574.33

Yi-Ping Yu [PY Yu]

14862.43



**AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS DUJOS“
ŠIAULIŲ FILIALAS**

TVIRTINU:
Technikos direktorius
Robertas Mačėnas

PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS


2014-05-26 Nr. S-S25-1694

1. Projektavimo techninės užduoties rengėjas: AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialas, P.Cvirkos g. 77, LT-77165 Šiauliai, tel. (8 41) 591 110, faks. (8 41) 591 100, el. p. siauliai@lietuvosdujos.lt
2. Statytojas (užsakovas): AB „Lietuvos dujos“, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius.
3. Statinio projekto pavadinimas ir adresas: vidutinio slėgio skirstomasis dujotiekis sklype 9177/0004:559, Voveriškių k.v., Šiaulių r.
4. Nurodymai gamtinių dujų (toliau – dujų) skirstymo sistemos projektavimui:
 - 4.1. parengti techninį darbo projektą tokios sudėties:
 - 4.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;
 - 4.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
 - 4.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;
 - 4.1.4. brėžiniai;
 - 4.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.
 - 4.2. suprojektuoti skirstomąjį dujotiekį PE DN 40mm (PE 100 SDR11) sklype 9177/0004:559, Voveriškių k.v., Šiaulių r.;
 - 4.3. prijungimo vieta: esamas vidutinio slėgio plieninis dujotiekis šalia sklypo ribos 9177/0004:559, Voveriškių k.v., Šiaulių r.;
 - 4.4. dujotiekio skersmuo prijungimo taške 350 mm;
 - 4.5. dujų slėgis prijungimo taške 3,0 bar;
 - 4.6. šalia pasijungimo vietos numatyti dujotiekio uždaramąjį įtaisą (plieninę sklendę);
 - 4.7. vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais pridedamoje scheme;
 - 4.8. projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu pažeistų dangų atstatymą;
 - 4.9. detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimą prie veikiančio dujotiekio;
 - 4.10. ruošiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;
 - 4.11. projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų, tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;
 - 4.12. projektuojant, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;
 - 4.13. parengtą projektą pateikti patikrinimui AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialui;
 - 4.14. projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiektimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;
 - 4.15. projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;
 - 4.16. parengtam projektui gauti statybą leidžiantį dokumentą (igalioto valstybės tarnautojo rašytinį pritarimą projektui).

Projektavimo techninę užduotį parengė
Inžinerinio skyriaus inžinierius Tadas Trinkūnas
Tel. (8-41) 591116

Vidutinio slėgio skirstomasis dujotiekis
sklype 9177/0004:559, Voveriškių k.v., Šiaulių r.

SCHEMA

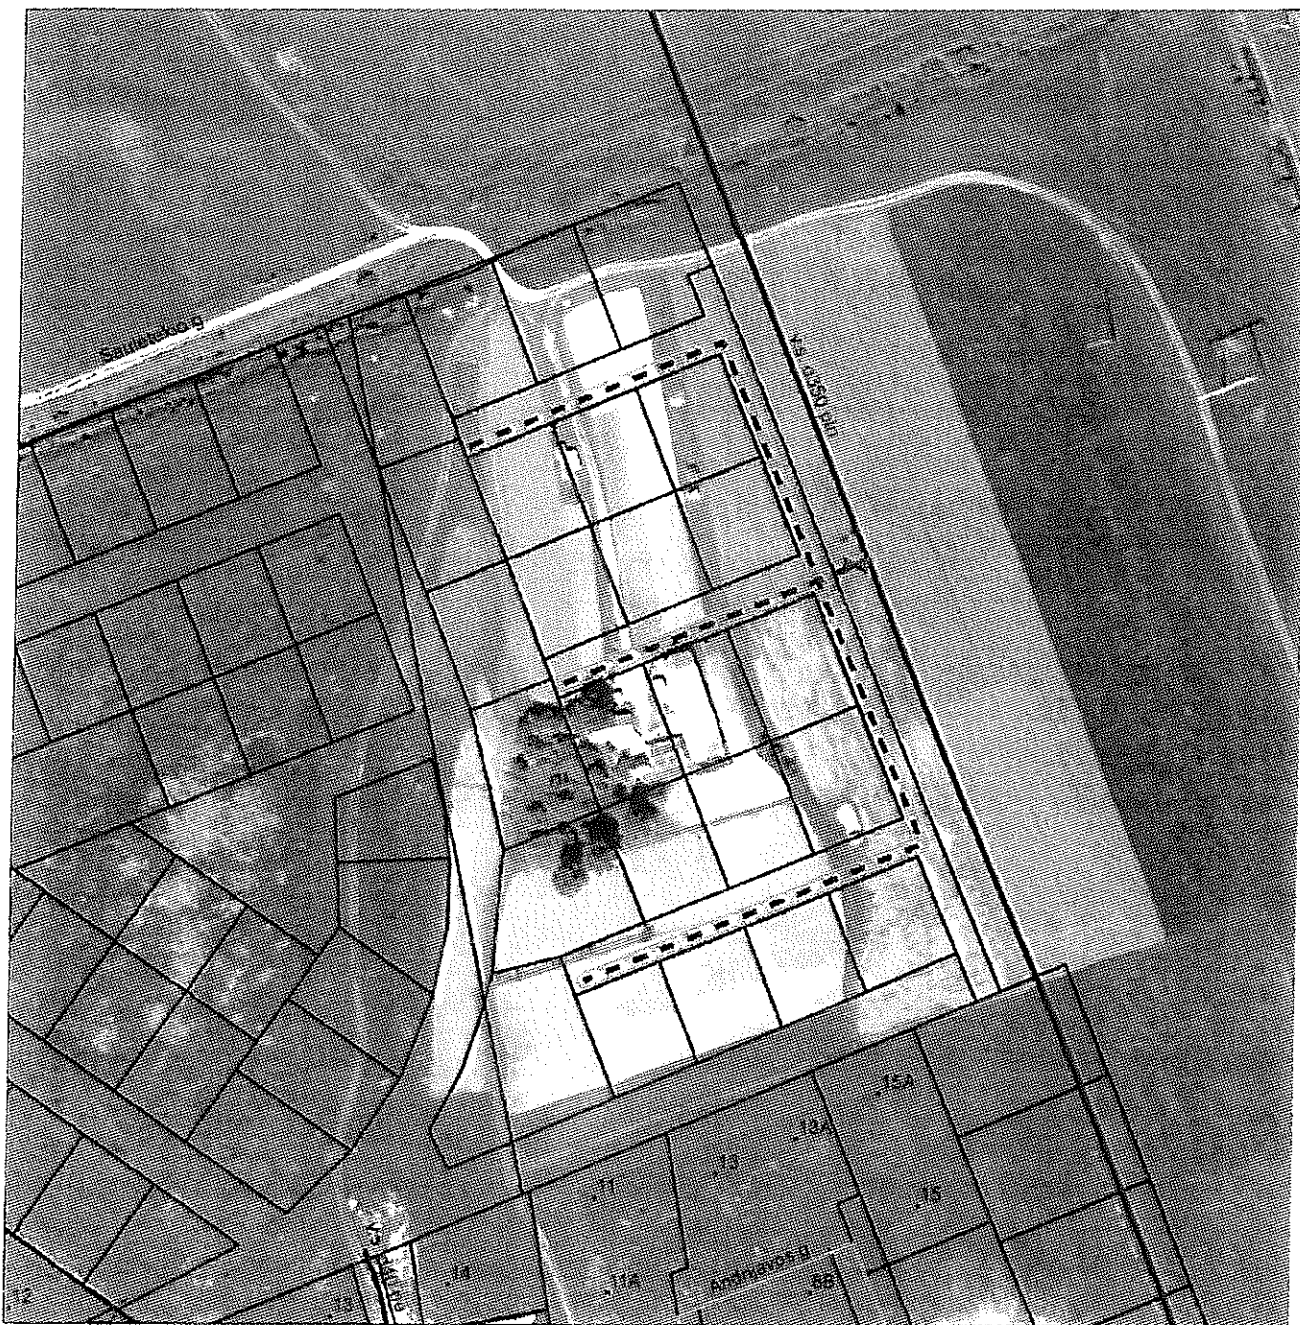

Ruošė: AB "Lietuvos dujos" Šiaulių filialo
Inžinerinio skyriaus inžinierius
Tadas Trinkūnas

1:2.000

- Sutartiniai ženklai
- Esamas vidutinio slėgio dujotiekis
 - - - Projektuojamas vidutinio slėgio dujotiekis
 - Dujotiekio apsaugos zona
 - PE DN40, preliminarus ilgis 435m

AB "LIETUVOS DUJOS" ŠIAULIŲ FILIALAS

GALUTINIS PASIŪLYMAS DĖL DARBŲ PIRKIMO

2015 02 12
(Data)

Rangovo pavadinimas	UAB "Šiaulių dujotiekio statyba"
Rangovo adresas	Bačiūnų 12LT77109 Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktoriaus pavaduotojas Povilas Gelažius
Telefono numeris	598181
Fakso numeris	598180
El. pašto adresas	sds@takas.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis ir siūlome:

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Siūloma kaina be PVM, EUR	PVM 21 %a, EUR	Siūloma kaina, EUR, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai ir PVM (skaičiais ir žodžiais)
IV	Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio sklype kad. Nr. 9177/0004:559, Voveriškių k.v., Šiaulių r., projektavimo ir statybos darbai	12283,00	2579,43	14862,43 Eur, Keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt du Eur 43 ct
V	Vidutinio slėgio skirstomasis dujotiekis Dvaro g. - Aukštojoje g., Šiaulių m. ir dujotiekio įvadas iki sklypo ribos P. Lukšio g. 9D, Šiaulių m.	6712,00	1409,52	8121,52 Eur, Aštuoni tūkstančiai šimtas dvidešimti vienas Eur 52 ct

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kvalifikacijos dokumentai	6
2.	Darbų sąmata	5
3.	Subrangovų sąrašas ir jų kvalifikacijos dokumentai	11
4.	Igaliojimas	1
5.	Isakymas dėl kasmetinių atostogų	2

3. Pateikdami pasiūlymą prisiimame visą riziką dėl galimų darbų, kurie nenumatyti pirkimo sąlygose, bet reikalingi atlikti, siekiant užbaigti darbus.

4. Pažymime ir garantuojame, kad:

4.1. Statybos darbų atlikimo terminas **I-V dalims** bus – per 35 dienų po statybą leidžiančio dokumento gavimo datos.

4.2. Projektavimo darbų atlikimo terminas **I -V dalims** bus – 30 dienų po sutarties pasirašymo datos.

4.3. Apmokėjimo terminai (visoms dalims) - per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo.

4.4. Garantinis terminas atliktiems darbams (visoms dalims) - 5 metai (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų 20 metų.

4.5. Trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas ne ilgesnis kaip 10 d.d. (visoms dalims).

5. ** Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

Eil.Nr.	Subrangovo pavadinimas	Pirkimo dalis kuriai bus pasitelktas subrangovas
1	UAB" Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai" Šiaulių grupė	I-V
2	UAB"Šiaulių ryšių objektų statyba"	I, II, V
3	UAB"Strektė"	II

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.

6. *** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

*Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Rangovui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 5 ir 6 punktus. 5 ir 6 punktų rangovas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei rangovas 5 ir (ar) 6 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subrangovų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Pasirašydamas pateiktą pasiūlymą parašu patvirtinu, kad dokumentų kopijos ir pateikti duomenys yra tikri.

Man žinoma, jog, jeigu būtų nustatyta, kad aukščiau pateikti duomenys yra klaidingi ar neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmetamas.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Rangovo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
