

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2016-04-21, Nr. 40500/560686

Užsakovas: Energijos skirstymo operatorius, AB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujamas Dujų tinklo vystymo departamento direktoriaus Karolio Rasiko, veikiančio pagal Tinklų vystymo departamento direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. nurodymą Nr. 12 (toliau – Užsakovas).

Rangovas: UAB „Labas GAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 124552684, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45D, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Žilvino Gasiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 3), pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(1465) Mažo slėgio dujotiekių rekonstravimo įveriant polietileningus vamzdžius Kalnų gatvėje, Kauno mieste projektavimo paslaugos ir rekonstravimo darbus** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimties nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 2).

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro **46.651,15 EUR** (keturiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt vienas euras, 15 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina **38.554,67 EUR** (trisdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 67 ct);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 8.096,48 EUR (aštuoni tūkstančiai devyniasdešimt šeši eurai, 48 ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas projektas(-ai), taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje, (Techninė specifikacija Priedas Nr. 2) turi atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projekcinės dokumentacijos (toliau – Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino.

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą peržiūri projekcinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma

pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.

3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.

3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.8. Projekto(-ų) parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.

3.9. Parengtą projektą(-us) su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą(-us) (Techninė specifikacija Priedas Nr. 2) turi gauti Rangovas.

3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.

3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.

3.15. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo – priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto po Sutarties pasirašymo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 2 punkte nurodytais terminais.

5.2. Darbai atliekami:

5.3. Darbai (įskaitant ir projektavimo darbų trukmę) turi būti baigti ne vėliau kaip iki 2016-08-08.

5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us). Rangovas Darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us) ir baigia pasirašius ir įregistravus (jeigu jis registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka) statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą.

5.5. Darbų pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto įregistravimo data.

5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus (atitinkamai konkrečaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.2 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLOS IR SULAIKYMAI

6.1. Perdavimo – priėmimo akte nurodomas visų Sutartyje arba konkrečiame etape numatytų atlikti darbų atlikimo faktas.

6.2. Perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas atlikus visus Sutartyje numatytus darbus.

6.3. Užsakovas Užbaigus darbus (Sutarties 5.6) ir pasirašius rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktą (F-2) ir pažymą apie rangos būdu įvykdytų darbų vertę (F-3) Rangovas Užsakovui pateikia PVM sąskaitą – faktūrą, kurią Užsakovas turi apmokėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos. Darbų pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto / deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo data.

6.4. Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktu (F-2) ir pažyma apie rangos būdu įvykdytų darbų vertę (F-3) Rangovas pateikia Užsakovui.

6.5. Rangovas PVM sąskaitą(-as)-faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu saskaitos@eso.lt.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: Darius Šiaučiulis, tel.: 8 655 93529, darius.siauciulis@eso.lt;

9. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

10. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

10.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

11. KITOS NUOSTATOS

11.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

11.2. Rangovas per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją.

11.3. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo priežiūra.

12. PRIEDAI

12.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

12.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

12.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 1 lapai;

12.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 5 lapai.

12.2.3. Priedas Nr. 3 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;

13. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas
UAB „Labas GAS“

Direktorius
Žilvinas Gasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“
A. S. LT82 7044 0600 0298 2730
AB SEB bankas,
Banko kodas 70440
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514
El. paštas: info@eso.lt

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

Kauno regiono dujų tinklo projektų valdymo grupė
Chemijos g. 4, LT-51346, Kaunas
Tel. (8 37) 401 200, faks.: (8 37) 401 260

Dujų tinklo vystymo departamento direktorius
Karolis Rasikas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“;
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį;
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto;
- 1.4. **Paslaugos** – projektavimas;
- 1.5. **Darbai** – rekonstravimas (įvėrimas).

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI/ PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS/CHARAKTERISTIKA/PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Mažo slėgio dujotiekių rekonstravimo įveriant polietileninius vamzdžius projektavimo paslaugos ir rekonstravimo darbai Kauno miesto Kalnų gatvėje.

2.1. Pirkimo objekto apimtys (maksimalus kiekis):

- 2.1.1. Parengti techninį darbo projektą (toliau – Projektas);
- 2.1.2. Rekonstruoti esamą dujotiekį įveriant PE dujotiekį - 697 m, rekonstruoti antžeminį dujotiekį - 49 m, išbandyti mažo slėgio dujotiekį ir pervesti į vidutinio slėgio dujų tiekimo sistemą - 27 m., sumontuoti DSRĮt - 20 vnt.;
- 2.1.3. Detalios pirkimo objekto apimtys nurodytos Priede Nr. C-1.1;
- 2.1.4. Dujotiekio nupjovimus, atjungimus, paleidimus, prijungimus, perjungimus prie rekonstruoto dujotiekio atlieka Pirkėjas (medžiagas, reikalingas dujotiekio nupjovimui, atjungimui, paleidimui, prijungimui, perjungimui tiekia Tiekėjas, duobės kasimą, užpylimą, dujotiekio prijungimui tiekia Tiekėjas).

2.2. Tiekėjo įsipareigojimai:

- 2.2.1. Tiekėjas savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo objekto vietą, jo aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą;
- 2.2.2. Jei reikia, archeologinius žvalgomuosius bei kitus tyrinėjimus, reikalingus objekto Darbams, užsako ir apmoka Tiekėjas;
- 2.2.3. Jei reikia, drenažo tinklų, melioracijos statinių atstatymo išlaidas apmoka Tiekėjas, kuris privalo Pirkėjui priduoti kiekvieną dujotiekio susikirtimą su naujai sumontuotais drenažo tinklais, melioracijos statiniais neužpylus grunto;
- 2.2.4. Parengti Projektą vadovaujantis pridedama Projektavimo technine užduotimi pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;
- 2.2.5. Gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomas dujotiekis, suderinimus, organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių sudarymą:
 - 2.2.5.1. Gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams;
 - 2.2.5.2. Parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų nustatymo žemės sklypams pateikti Pirkėjui peržiūrai. Pirkėjui peržiūrėjus ir pasirašius dokumentus, Tiekėjas kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką Tiekėjas informuoja Pirkėją ir žemės sklypų savininkus;
 - 2.2.5.3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo vamzdinių ir bet kokių kitų įrenginių, būtinų gamtinėms dujoms skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (dujotiekio (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami šie dujotiekiai (įrenginiai), AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudai turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir AB „Energijos skirstymo operatorius“

- pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas dujotiekiui (įrenginiams) įrengti;
- 2.2.5.4. Mokesčius notarų biurui už servitutų sutarties tvirtinimą bei registravimą apmokės Pirkėjas;
- 2.2.6. Pateikti suderintą Projekto originalą, dvi kopijas grafinėje formoje ir vieną kopiją skaitmeniniu (PDF) formatu pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus;
- 2.2.7. Prieš 3 (tris) kalendorines dienas raštiškai informuoti Pirkėjo atstovą apie numatomą Darbų pradžią, nurodant statinio specialiųjų statybos darbų vadovą. Pavėlavus Tiekėjas privalės kompensuoti išlaidas Pirkėjui dėl pavėluoto duomenų pateikimo apie numatomą Darbų pradžią bei statinio statybos darbų vadovą per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;
- 2.2.8. Tiekėjas įsipareigoja vykdyti parengto projekto vykdymo priežiūrą;
- 2.2.9. Tiekėjas apsirūpina visomis medžiagomis, įrenginiais ir mechanizmais, reikalingais darbams atlikti (išskyrus tai, ką pateikia Pirkėjas);
- 2.2.10. Tiekėjas turi atlikti visus Darbams reikalingus žemės darbus;
- 2.2.11. Rekonstruoti dujotiekį pagal parengtą ir suderintą Projektą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
- 2.2.12. Sukomplektuoti ir pateikti Pirkėjui medžiagas, reikalingas nupjovimams, atjungimams, paleidimams, prijungimams, perjungimams;
- 2.2.13. Metalą, statybinį laužą išvežti ir perduoti jį tvarkančiai įmonei bei pateikti Pirkėjui pažymą apie tai;
- 2.2.14. Organizuoti Darbus atsižvelgiant į tai, kad dujų tiekimas fiziniams ir juridiniams vartotojams gali būti nutrauktas prieš tai įspėjus fizinius vartotojus prieš 5 (penkias) dienas, juridinius – prieš 30 (trisdešimt) dienų, o su vartotojais naudojančiais dujas gamybai dujų tiekimo nutraukimą derinti papildomai;
- 2.2.15. Tiekėjas privalo suteikti Pirkėjo atstovams, Darbų techniniams priežiūrėtojams ir Projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti, testuoti medžiagas ir darbo kokybę bei tikrinti statybos eigą;
- 2.2.16. Išmontuotus įrenginius ir prietaisus pristatyti Pirkėjui;
- 2.2.17. Atlyginti dėl atliekamų Darbų patirtus nuostolius žemės sklypų savininkams (nuomotojams, naudotojams) už statybvietės ribų;
- 2.2.18. Išlaidas už leidimą žemės kasimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, VEI pažymą, archeologinius tyrinėjimus, melioracijos sistemų atstatymą, drenažo sistemų atstatymą, kelio ženklų pastatymą, statybinio laužo išvežimą (nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas) Tiekėjas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama;
- 2.2.19. Tiekėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui rekonstruoto dujotiekio geodezinę nuotrauką (jeigu objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgus) grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate LKS-94 koordinačių sistemoje ir shape formatu, pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimus (1 egz.), likus 10 (dešimt) darbo dienų iki darbų pabaigos;
- 2.2.20. Baigus Darbus pateikti Pirkėjui rekonstruoto dujotiekio techninę dokumentaciją grafinėje formoje ir skaitmeniniu (PDF) formatu.
- 2.3. **Pirkėjo įsipareigojimai:**
- 2.3.1. atlikti dujotiekio nupjovimus, atjungimus, paleidimus, prijungimus, perjungimus prie rekonstruoto dujotiekio;
- 2.3.2. tiekti DSR;t;
- 2.3.3. vykdyti sutarties kontrolę.
- 2.4. **Dujotiekio, įrenginių techniniai bei kiti reikalavimai:**
- 2.4.1. Medžiagos ir įrenginiai negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo objekto Darbų užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus);

- 2.4.2. Požeminiai polietileniniai dujotiekio vamzdžiai turi atitikti (prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4; prEN1555-5) reikalavimus
- 2.5. **Objekto Darbus sudaro:**
- 2.5.1. Darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į statybos vietą ir kita;
- 2.5.2. Bendrastatybiniai darbai;
- 2.5.3. Dujotiekio trasos nužymėjimas;
- 2.5.4. Žemės darbai:
- 2.5.4.1. Dangų ardymas ir atstatymas į buvusią padėtį;
- 2.5.4.2. Grunto iš tranšėjų kasimo ir išvežimo darbai;
- 2.5.5. Medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietyje;
- 2.5.6. Vamzdžių suvirinimo, klojimo ir įvėrimo darbai;
- 2.5.7. Dujotiekio trasos susikirtimų ir perėjimų per kelius, inžinerinius tinklus ir kitas kliūtis darbai;
- 2.5.8. Laikinų privažiavimo kelių įrengimas. Laikinus privažiuojamus įrengti suderinus su sklypų savininkais, užtikrinant jiems galimybę saugiai privažiuoti prie sklypo ar pastato dalies. Įrenginiai saugiam pėsčiųjų eismui, apšvietimas, aptvėrimai bei kitos saugos priemonės;
- 2.5.9. Vamzdinių užpylimo naujai atvežtu gruntu darbai;
- 2.5.10. Dujotiekio bandymai bei išvalymas ir nusausinimas;
- 2.5.11. Aplinkos tvarkymo darbai;
- 2.5.12. Kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti darbus;
- 2.5.13. Apsirūpinimas visais darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;
- 2.5.14. Kartu su Pirkėju darbų užbaigimo procedūrų organizavimas ir akto / deklaracijos gavimas.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 3.1. Kalnų g., Kaunas;

5. KITA SVARBI INFORMACIJA

- 5.1. **Pirkėjo įsipareigojimai:**
- 5.1.1. Sutarties pasirašymo dieną Tiekėjui pateikti projektavimo techninę užduotį ir situacijos schemą;
- 5.1.2. Priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų Darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus Darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai;
- 5.1.3. Įsigaliojus sutarčiai, raštu pranešti Tiekėjui, kas vykdys darbų techninę priežiūrą;
- 5.1.4. Vykdyti sutarties kontrolę;
- 5.1.5. Tiekėjui pradėjus dujotiekio Darbus perduoti medžiagas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. A-1.1 – projektavimo techninė užduotis, situacijos schema.

**AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS DUJOS“
KAUNO REGIONO DUJŲ TINKLO DEPARTAMENTAS**

TVIRTINU
Inžinerinio skyriaus vadovas


Gerardas Jovaras

**PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS
2015-11-19 Nr. 2419**

1. Projektavimo techninės užduoties rengėjas AB „Lietuvos dujos“ Kauno regiono dujų tinklo departamentas, Chemijos g. 4, LT-51346 Kaunas, tel. (8 37) 401 205, el. p. va.kriauciunas@lietuvosdujos.lt
2. Statytojas (užsakovas) AB „Lietuvos dujos“.
3. Statinio projekto pavadinimas ir adresas. Mažo slėgio dujotiekio rekonstravimas įveriant polietileningus vamzdžius Kalnų gatvėje (nuo 93 iki 152) Kaune.
4. Statinio projekto rūšis. Rekonstravimo projektas.
5. Nurodymai gamtinių dujų (toliau – dujų) skirstymo sistemos projektavimui:
 - 5.1. parengti projektą tokios sudėties:
 - 5.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis, detaliai aprašant rekonstravimo proceso eigą;
 - 5.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
 - 5.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;
 - 5.1.4. brėžiniai;
 - 5.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai (išskiriant AB „Lietuvos dujos“ skirstymo sistemos ir vartotojų sistemos dujotiekius).
 - 5.1. rekonstruoti mažo slėgio dujotiekį, į esamą plieninį požeminį dujotiekį įveriant polietileningus vamzdžius ir pervedant juos į vienlaipsnę vidutinio slėgio dujų tiekimo sistemą;
 - 5.2. numatyti nenaudojamo plieninio požeminio dujotiekio atplovimą, prapūtimą ir užaklinimą;
 - 5.3. dujų slėgio reguliavimo įtaisus (DSRIt) apsauginėse spintelėse su atitinkamo našumo ir išeinančio dujų slėgio regulatoriais bei vieta dujų apskaitos prietaisui įrengti prie gamtinių dujų vartotojų sklypų ribų, nesant galimybei – įvaduose į pastatus. DSRIt ir dujų apskaitos prietaisus parinkti pagal AB „Lietuvos dujos“ Kauno regiono dujų tinklo departamento pateiktus duomenis apie kvartale eksploatuojamus dujinius prietaisus.
 - 5.4. panaikinti spintinį DSRIt-51 prie Kalnų g. 101 Kaune;
 - 5.5. numatyti esamo plieninio antžeminio dujotiekio pertvarkymą;
 - 5.6. projektuojamo dujotiekio skersmenį ir medžiagą parinkti įvertinus esamus ir perspektyvinius valandinius gamtinių dujų poreikius;
 - 5.7. dujų skirstymo sistemos prijungimo vietos: esamas vidutinio slėgio antžeminis plieninis dujotiekis prie Kalnų g. 101 Kaune;
 - 5.8. dujotiekio skersmuo dujų skirstymo sistemos prijungimo taške 76 mm.
 - 5.9. dujų slėgis dujų skirstymo sistemos prijungimo taške 3 bar;
 - 5.10. projektuojant vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais pridedamoje schemoje;
 - 5.11. projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu pažeisto gerbūvio dangų atstatymą;

5.12. detalizuoti rekonstruojamos dujų skirstymo sistemos prijungimus prie veikiančio dujotiekio;

5.13. rengiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;

5.14. dujų skirstymo sistemos projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams įgyvendinti;

5.15. projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;

5.16. parengtą projektą pateikti patikrinimui AB „Lietuvos dujos“ Kauno regiono dujų tinklo departamentui;


5.17. projektą teikti tikrinimui normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;

5.18. projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;

5.19. parengtam projektui gauti leidimą rekonstruoti statinius.

6. Projektavimo techninę užduotį parengė Inžinerinio skyriaus vyresnysis įrenginių remonto planavimo ir priežiūros inžinierius Valentinas Kriaučiūnas.

Mažo slėgio dujotiekių rekonstravimas įvairiant polietilenuis vamzdžius Kalnų gatvėje Kaune

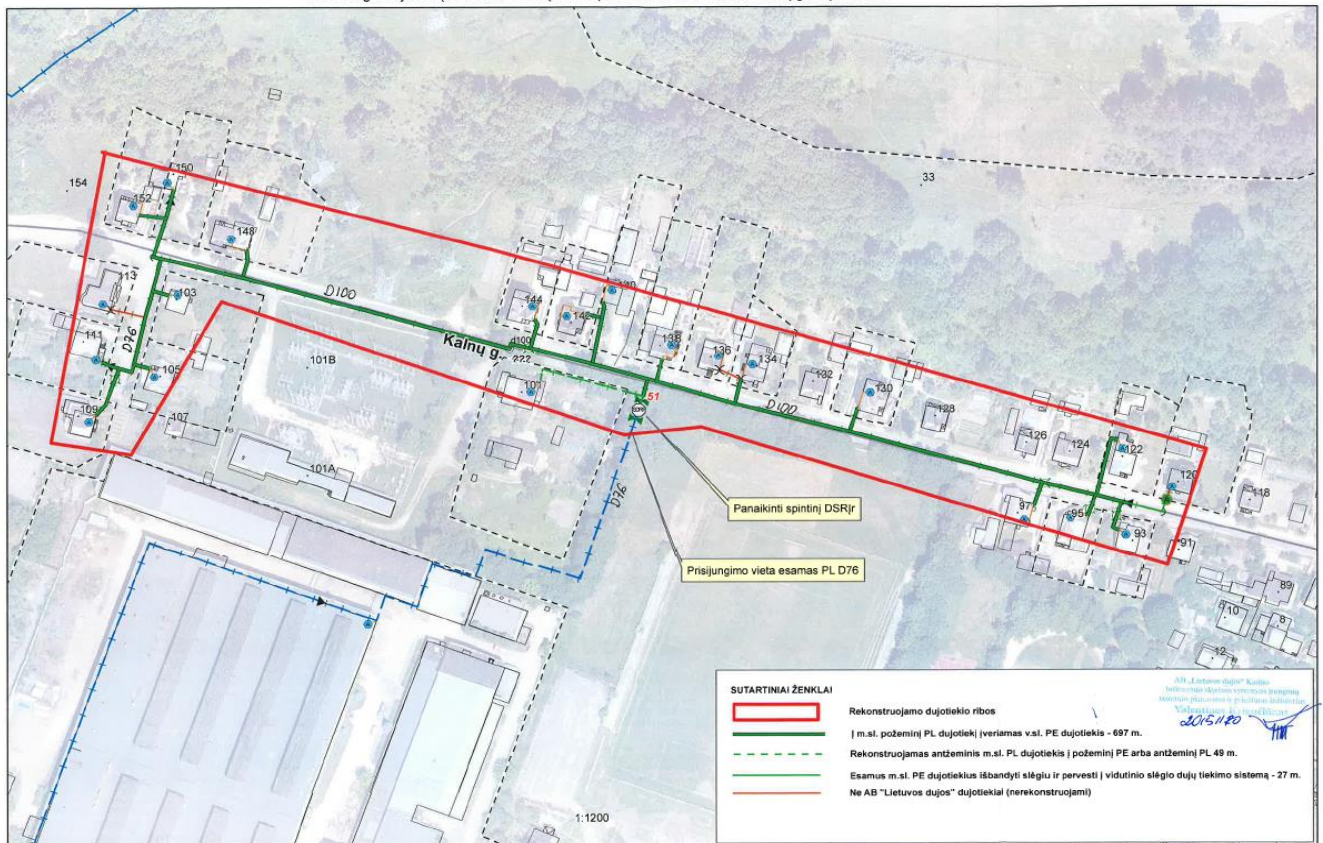

Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	DSRlt Q6 G4-T	vnt.	13
2.	DSRlt Q10	vnt.	7

MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS

Chemijos g. 23, Kaunas, AB „Energijos skirstymo operatorius“	Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą: Dujų tinklo projektų valdymo grupė (Kaunas), projektų vadovas Arūnas Bernatavičius Tel. + 370 37 401 235; Mob. +370 699 0754
---	---
