

RANGOS SUTARTIS

2015 m. birželio 23 d. Nr. 99 - 997
Klaipėda

I. SUTARTIES ŠALYS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir UAB „Konsolė“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Kazio Skutulo, toliau kartu vadinamos šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcijos III-iojo etapo baigiamųjų darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2015 m. birželio 11 d. protokolas Nr. ADM-363.

II. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas – VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcijos III-iojo etapo baigiamieji darbai. Detalus darbų aprašymas, kiekis ir kiti reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose Darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties priedai).

2. Bendra Sutarties kaina – **70 958,78 Eur (septyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 78 ct)**, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).

3. Sutartyje fiksuojama bendra **kaina**, kuri galioja visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina būtų perskaičiuojama tokiu pat santykiu, koku pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma už tuos Darbus, už kuriuos PVM sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo ar kitų priežasčių kaina neperskaičiuojama.

4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus nenumatytus darbus, kurių Užsakovas negalėjo žinoti iš anksto ir Rangovas pasiūlymo rengimo ir Sutarties pasirašymo metu negalėjo numatyti ir be kurių jis negali užbaigti Sutarties, Užsakovas numato galimybę šiuos darbus pirkti papildomai vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

III. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

5. Prievolių įvykdymo terminai:

5.1. Prievolių vykdymo pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena;

5.2. Darbai turi būti atlikti per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

6. **Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka:** už faktiškai atliktus darbus apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir nuo Rangovo

pateiktų dokumentų, patvirtinančių atliktus darbus (sąskaitos faktūros, pasirašytų atliktų darbų aktų) gavimo dienos.

7. **Finansavimo šaltinis:** Sveikatos apsaugos programa (Nr. 13). priemonė 01.03.01. „VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija“, Valstybės kapitalo investicijų lėšos (VIP).

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Sutarties šalių teisės ir pareigos:

8.1. Užsakovas įsipareigoja:

8.1.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus darbams atlikti;

8.1.2. priimti Rangovo atliktus darbus ir atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus pagal Sutarties sąlygas.

8.2. **Užsakovas turi teisę** tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą.

8.3. Rangovas įsipareigoja:

8.3.1. atlikti darbus pagal Sutarties sąlygas, savo rizika ir sąskaita, kaip įmanoma rūpestingai ir efektyviai;

8.3.2. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui užbaigti darbų atlikimą Sutartyje nustatytais terminais;

8.3.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Konkurso sąlygų apraše ir galiojančiuose teisės aktuose;

8.3.4. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

8.3.5. Rangovas subrangovų nepasitelkia.

8.4. Rangovas turi teisę:

8.4.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais rangovo teisėmis;

8.4.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

9. Garantijos:

9.1. Darbams suteikiamas garantinis terminas skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos yra 5 (penkeri) metai.

9.2. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo reikalavimų be Perkančiosios organizacijos raštiško sutikimo, sudaromas abiejų šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir išsiunčiamas Rangovui registruotu paštu. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

9.3. Užsakovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami šios 9.2 punkte nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

9.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10. Užsakovas, nesumokėjęs Rangovui už atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

11. Rangovas, pažeidęs darbų atlikimo terminus ir (ar) tvarką, Užsakovui moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

12. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdama apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

13. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują to paties dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

14. **Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai:** jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartyje ir jos prieduose numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

14.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

14.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

14.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

14.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

14.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

15. Užtikrinimai ir draudimai:

15.1. Rangovas ne vėliau kaip per **5 darbo dienas** nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti **Sutarties įvykdymo užtikrinimą** – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Užtikrinimo vertė – **5 procentai** nuo bendros Sutarties kainos (su PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą Sutarties galiojimo terminą ir 30 kalendorinių dienų po Sutarties galiojimo termino. Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavėja – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, kodas 188710823. **Sutartis įsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.**

15.2. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę jį įsigyti savo lėšomis ir patirtas išlaidas išskaičiuoti iš galutinės pagal Sutartį Rangovui mokėtinos sumos arba nutraukti Sutartį.

16. Sutarties nutraukimas prieš terminą:

16.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

16.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

16.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

16.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

16.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.

16.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas.

16.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas privalo sumokėti už atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

16.4. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 2 % dydžio baudą nuo visos Sutarties kainos (su PVM).

17. Nenugalimos jėgos aplinkybės:

17.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsdama pranešė kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

17.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

17.3. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

17.4. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

17.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

17.6. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

17.7. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 15 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 15 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

18. **Ginčų sprendimo tvarka:** kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir Konkurso sąlygų aprašu su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tai šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

19. Kitos Sutarties sąlygos:

19.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų šalių įgalioti atstovai ir Rangovas pateikia reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

19.2. Sutartis galioja 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų, atsiradusių iki Sutarties galiojimo pabaigos, įvykdymo.

19.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Konkurso sąlygų apraše. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant Konkurso sąlygų aprašą ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas (pasikeitus Sutarties koordinatoriui, pasikeitus finansavimo šaltiniams, pasikeitus rekvizitams).

19.5. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad konkurso metu sužinota informacija apie kitą šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

19.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

19.7. Kiekviena Sutarties šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

19.8. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka toliau galioti.

19.9. Užsakovas laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems Rangovo komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

20. Baigiamosios nuostatos: visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai ar pranešimai yra laikomi gautais.

21. Sutarties dokumentai:

21.1. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie čia yra išvardyti pagal svarbą:

21.2. Konkurso sąlygų aprašas; Techninė specifikacija ir jos priedai; Užsakovo iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai;

21.3. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus); (dokumentai saugomi pas Užsakovą);

21.4. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka.

22. VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcijos III-iojo etapo baigiamųjų darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų aprašas (Sutartyje vadinama Konkurso sąlygų aprašas), patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. AD1-1413, ir Užsakovo pasiūlymas yra neatsiejamos Sutarties dalys, kurių reikalavimai yra privalomi abiem Sutarties šalims.

23. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros įgyvendinimo poskyrio vedėja Vaida Lendraitienė, tel. (8 46) 39 63 03, el. p. vaida.lendraitiene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Savivaldybės administracijos įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja darbų vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties ir Konkurso sąlygų aprašo reikalavimams, organizuoja visą susirašinęją su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo Sutarties garanto pateikimą bei kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

24. Techninė specifikacija ir jos priedai, 5 lapai.

25. Darbų kiekių žiniaraščiai, 9 lapai.

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Kodas 188710823

PVM mokėtojo kodas LT887108219

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08

A. s. LT76 7300 0100 0233 2508

„Swedbank“, AB, b. k. 73000

Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)

Saulius Budinas

(data)



Rangovas

UAB „Konsolė“

Kodas 140582050

PVM mokėtojo kodas LT405820515

Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda

Tel. (8 46) 40 14 33

A. s. LT807300010002310902


„Swedbank“, AB, b. k. 73000

Generalinis direktorius

(parašas)

Kazys Skutulas

(data)




V. Kasmačiauskė, tel. 39 61 04

2015-06-23 12.79-557

**VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS CENTRINIO KORPUSO
OPERACINIŲ REKONSTRUKCIJOS III-IOJO ETAPŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Bendri duomenys:		
1.1.	Priemonės pavadinimas, adresas, statybos rūšis	VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija (III-io etapo baigiamieji darbai). Statybos adresas - Liepojos g. 41, Klaipėda.
1.2.	Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas	Klaipėdos miesto savivaldybė Kodas 111100775, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda Kontaktinis asmuo – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus, Statybos ir infrastruktūros įgyvendinimo poskyrio vedėja Vaida Lendraitienė, Tel.39 63 03; el.paštas: vaida.lendraitiene@klaipeda.lt.
1.3.	Statinio kategorija, Statinio rūšis ir naudojimo paskirtis	Kategorija – statinys priskiriamas ypatingų statinių kategorijai Rūšis – rekonstravimas Naudojimo paskirtis – gydymo.
1.4.	Pastato, statinio apibūdinimas, esama padėtis	Pastato paskirtis – pastatas ligoninė; (nurodyti mokymo , sporto ir kt .) 2007 metais buvo pradėta centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija. Šiuo pirkimu perkami baigiamieji papildomi darbai pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį III-iojo etapo užbaigimui.
2. Pagrindiniai reikalavimai paslaugų vykdymui:		
2.1.	Perkamų paslaugų apibūdinimas	Perkamų paslaugų apimtys – pagal pridedamą kiekių žiniaraštį ir brėžinius.
3. Statytojo teikiamų dokumentų sąrašas:		
3.1.	Dokumentų kopijos	Statytojo pateikiami dokumentai: 1. Darbų kiekių žiniaraščiai, 7 lapai; 2. Pastatų eksplikacija, 1 lapas; 3. Šilumos punkto montavimo ir valdymo schema. Medžiagų ir įrengimų specifikacija, 1 lapas; 4. Centrinė operacinė. 2 aukšto planas su baldų išdėstymu, 1 lapas; 5. A dalies I aukšto planas, 1 lapas.
4. Kiti reikalavimai:		
4.1..	Paslaugų atlikimo terminas	Rekonstravimo darbų trukmė – 3 mėnesiai .
4.2.	Reikalavimai kainos paskaičiavimui	Tiekėjas pateikia sąmatinius skaičiavimus – lokalinę, objektinę bei suvestinę sąmatas, su visų išlaidų priskaitymais.
4.3.	Papildomi reikalavimai	- Tiekėjas turi netrukdyti dirbti specialistams, vykdančioms techninę priežiūrą; - Tiekėjas turi nepažeisti Užsakovo ir trečiųjų asmenų turto ir atsakyti už galimus pažeidimus; - Prieš pateikiant pasiūlymą Tiekėjas turi nuvykti į objektą ir pateikiant pasiūlymą įvertinti visas išlaidas, būtinas darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytiems darbams atlikti; - Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; - Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti prisilaikant visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda – Klaipėdos

		miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės; - Informacija teikiama Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g. 11, Klaipėdoje 108 kab. Kontaktinis asmuo Vaida Lendraitienė. tel. (8 46) 39 63 03.
--	--	--

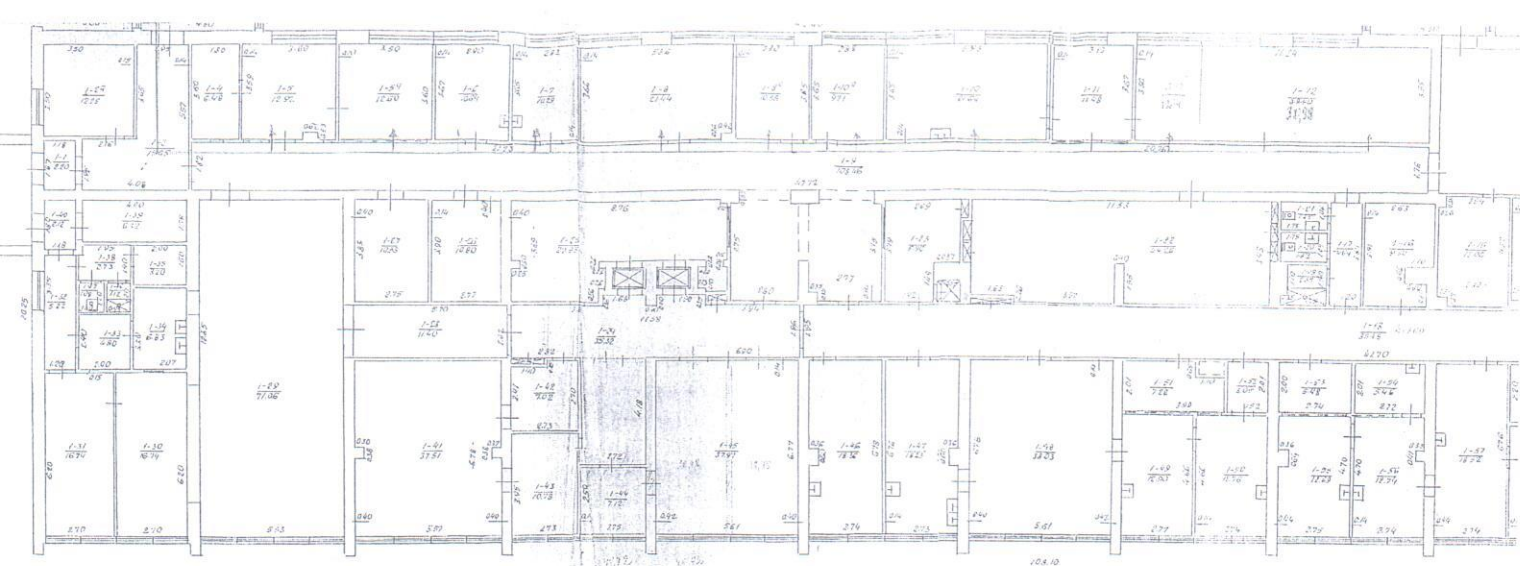

A salis I aut to plus

Bro pntakipima silencia

Industria

July

- PASTATŲ EKSPLIKACIJA
1. ADMINISTRACIJA, LABORATORIJA, OPERACIJOS
 2. STACIONARUSIS
 3. PRILIEKIMO SKYRIUS
 4. MŪŠTO B.I.O.L.O.G.
 5. AKUSIRIUS-GINEKOLOGIJOS SKYRIUS
 6. PATINATONIJOS SKYRIUS
 7. RADIOLOGIJOS SKYRIUS




REKONSTRUOJAMOS
OPFERACIJOS



Suderinta
[Signature]

EIL. Nr.	RENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ PAVADINIMAS, CHARAKT. FIRMA	RENGINIŲ TIPAS	MATO KIEKIS
1	ELEKTRONINIS REGULIATORIUS	"SIEMENS"	VNT
2	LAUKO ORO TEMPERATŪROS DAVIKLIS	OAC 11/109	VNT
3	ŠILUMOTIEKIO TEMPERATŪROS DAVIKLIS (UŽDEDAMAS)	OAC 11/109	VNT
4	KARŠTO VANDENS TEMP. DAVIKLIS (ILEIDŽIAMAS)	OAC 11/109	VNT
5	REGULIUOJAMAS VENTILIS (ŠILDYMUJ) Kvs=16,0m³/h DN32	QAE22A	VNT
6	SERVO PAVARA (ŠILDYMUJ)	VVG 41 32-16	VNT
7	REGULIUOJAMAS VENTILIS (KV) Kvs=16,0m³/h DN32	SOX32 00	VNT
8	SERVO PAVARA (KV)	VVG 41 32-16	VNT
9	CIRKULIACINIS SIURBLIUS ŠILDYMUJ	SOX32 03	VNT
10	CIRKULIACINIS SIURBLIUS KARŠTAM VANDENIUI	TOP 65873	VNT
11	ŠILUMOKAITIS ŠILDYMUJ	TOP 7367	VNT
12	ŠILUMOKAITIS KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI	HL2-155	VNT
13	APSAUGINIS VENTILIS (4bar)	HR3-54/54	VNT
14	APSAUGINIS VENTILIS (4bar)	HR3-54/54	VNT
15	RUTULINIS VENTILIS PN25, T=150°C	DN25 "MTR"	VNT
16	RUTULINIS VENTILIS PN25, T=150°C	DN25 "MTR"	VNT
17	RUTULINIS VENTILIS PN25, T=150°C	DN50 "GIACOMINI"	VNT
18	RUTULINIS VENTILIS PN25, T=150°C	DN50 "GIACOMINI"	VNT
19	RUTULINIS VENTILIS PN25, T=150°C	DN50 "GIACOMINI"	VNT
20	RUTULINIS VENTILIS PN10, T=120°C	DN50	VNT
21	RUTULINIS VENTILIS PN16, T=150°C	DN80	VNT
22	RUTULINIS VENTILIS PN16, T=150°C	DN15	VNT
23	RUTULINIS VENTILIS PN10, T=120°C	DN15	VNT
24	RUTULINIS VENTILIS PN10, T=120°C	DN32	VNT
25	FILTRAS PRIE VANDENS PN25, T=150°C	DN50	VNT
26	FILTRAS PN10, T=100°C (FLANŠINIS)	DN50	VNT
27	FILTRAS PN10, T=100°C (FLANŠINIS)	DN50	VNT
28	FILTRAS PN10, T=100°C	DN50	VNT
29	FILTRAS PN16, T=150°C	DN15	VNT
30	ATBULINIS VOŽTUVAS PN10, T=100°C (FLANŠINIS)	DN80	VNT
31	ATBULINIS VOŽTUVAS PN10, T=100°C	DN50	VNT
32	ATBULINIS VOŽTUVAS PN10, T=100°C	DN32	VNT
33	ATBULINIS VOŽTUVAS PN16, T=150°C	DN15	VNT
34	SLEGIO PALAIKYMO VOŽTUVAS T=90°C	DN15	VNT
35	KARŠTO VANDENS SKAITIKLIS T=90°C, G=1,5m³/h	DN15	VNT
36	SALTO VANDENS SKAITIKLIS T=30°C, G=10m³/h	DN40	VNT
37	ŠILUMOS ŠVIATIKLIO BRAUTO JUOKLIS G=22,0m³/h	DN50	VNT
38	TERMOMETRAS SU JIVORE G=120°C	DN50	VNT
39	MANOMETRAS G=55m³/h T=1,5	DN50	VNT
40	MANOMETRAS G=10m³/h T=1,5	DN50	VNT
41	MANOMETRAS G=10m³/h T=1,5	DN50	VNT
42	TRIEGBIS MANOMETRINIS VENTILIS PN16 T=150°C	DN15	VNT
43	ISARDOMA JUNGTIJ	DN50	VNT
44	ISARDOMA JUNGTIJ	DN50	VNT
45	VAMZDIS PLENNIS	DN60	M
46	VAMZDIS PLENNIS	DN50	M
47	VAMZDIS PLENNIS	DN50	M
48	VAMZDIS PLENNIS	DN50	M
49	VAMZDIS PLENNIS (CINKUOTAS)	DN15	M
50	VAMZDIS PLENNIS (CINKUOTAS)	DN50	M
51	AKLES DN15	DN32	M
52	HIDRAULINIS BANDYMAS 1,0MPa	DN15	M
53	VAMZDŲ GRUNTAVIMAS IR DAŽYMAS	DN15	M
54	PRIDėti prie punkto	DN15	M
55	ISSIPLETIMO INDAS (4bar) SU VIDINIŲ SLEGIŲ PRESE SLEGIŲ 3 bar	DN15	M

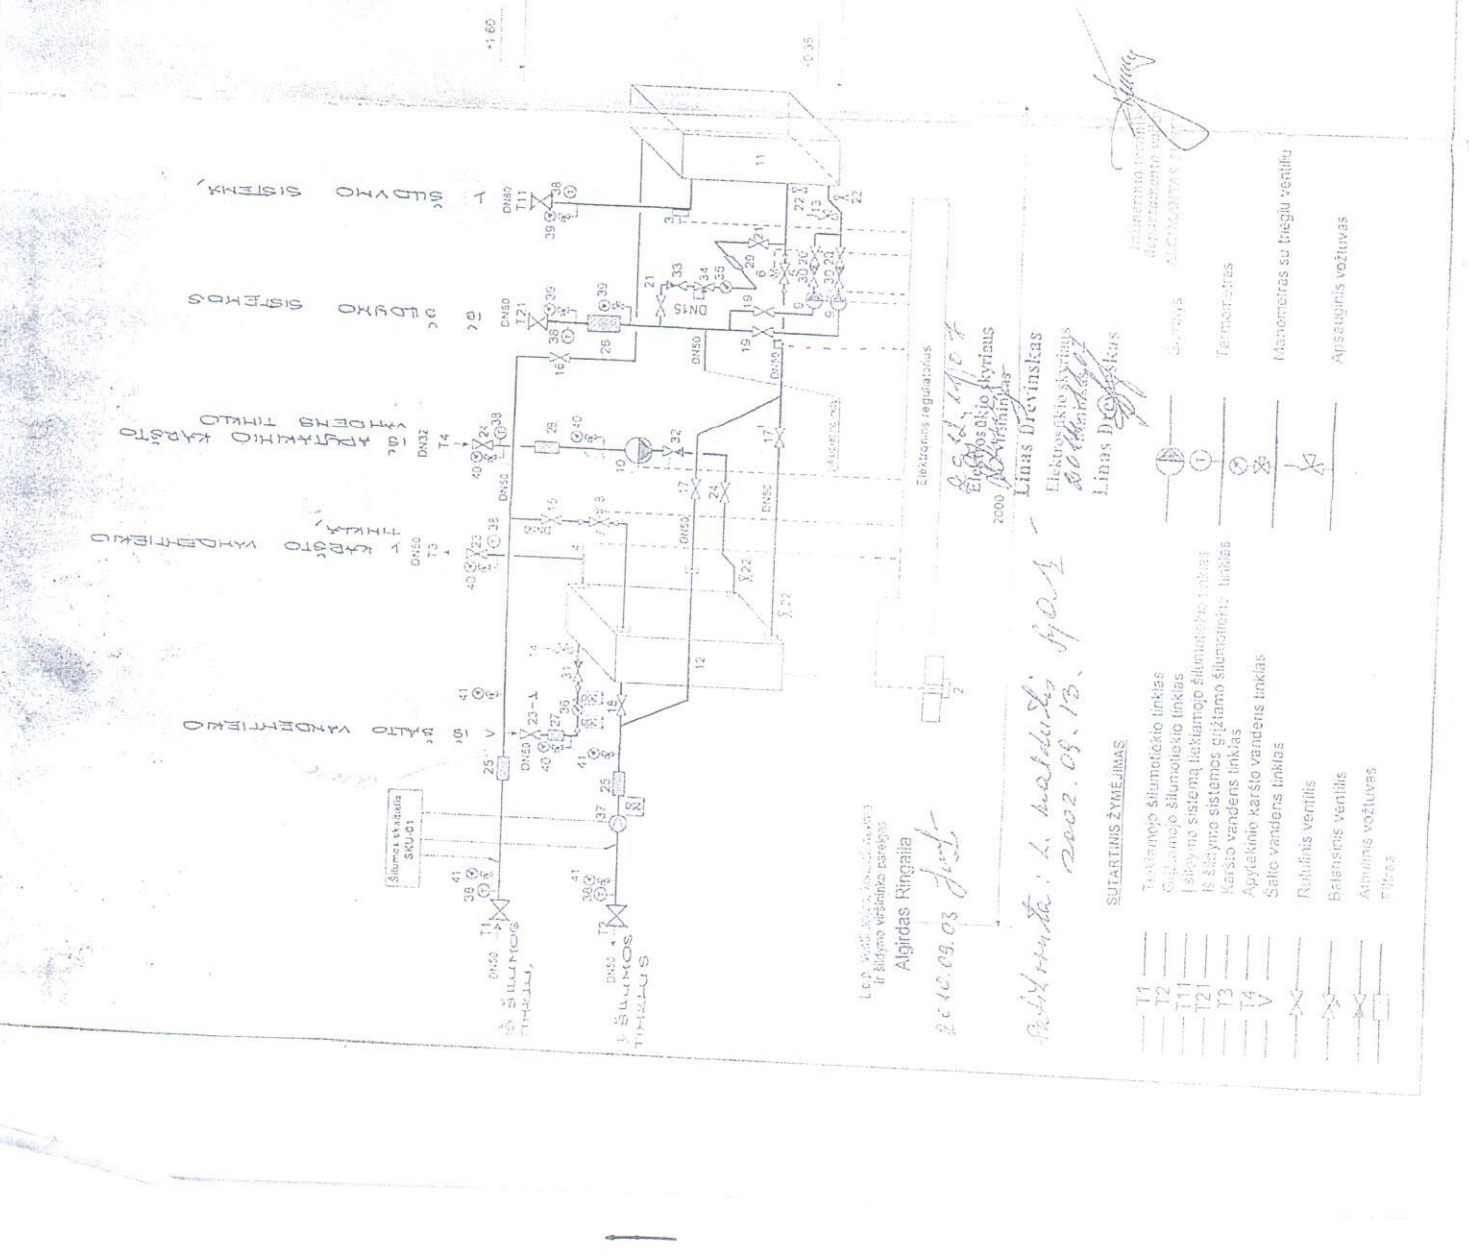

Lėg. 10.09.03
 Aljardas Ringaila
 2002.09.13.
 L. Katalauskis
 2002.09.13.
 L. Katalauskis
 2002.09.13.

SĄMATA

SUDERINTA 70958,78 EUR.
UAB "KONSOLĖ"
GENERALINIS DIREKTORIUS
KAZYS SKUTULAS
2015M. _____ MEN. _____ D.

PATVIRTINTA _____ EUR.
UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDĖ
2015M. _____ MĖN. _____ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė

K0705 VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija

Lapas 1

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Sąmatinė kaina (EUR)			Sąmatinė kaina su PVM (EUR)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

7054 VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija-Apkeičiami darbai	16913.79	54044.99		70958.78
Viso III:	16913.79	54044.99		70958.78
Viso II-III:	16913.79	54044.99		70958.78

SUDARĖ: Alimpa Kovalenko
(Pavardė)

SUDERINTA 70958,78 EUR.
UAB "KONSOLÉ"
GENERALINIS DIREKTORIUS
KAZYS SKUTULAS
2015M. _____ MĖN. _____ D.
SĄMATA



TVIRTINU _____ EUR.
UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

2015M. _____ MĖN. _____ D.

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė

K0705 VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija

Statinsys

7054 VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija-Apkeičiami darbai

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Vėdinimas	16070.66	8077.66	24148.32	19957.29
2	Operacinės su anesteziologija technologinė įranga		35217.56	35217.56	29105.42
3	Šilumokaičio keitimas karštam vandeniui	843.13	3372.28	4215.41	3483.81
4	Operacinių technologiniai įrenginiai		7377.49	7377.49	6097.10
Iš viso:		16913.79	54044.99	70958.78	58643.62

SUDARĖ: Alimpa Kovalenko
(PAVARDĖ)

SUDERINTA: 16070,66 EUR.

UAB "KONSOLĖ"

GENERALINIS DIREKTORIUS

KAZYS SKUTULAS

2015 M. _____ MĖN. _____ D.

TVIRTINU: _____ EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

2015 M. _____ MĖN. _____ D.

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė

K0705 VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija

Statinsys

7054 VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija-Apkeičiami darbai

Žiniaraštis

1 Vėdinimas

Suma žiniaraščiui 16070.66 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimo darbai								
1	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos	m2	75.0	474.21	1427.61		1901.82
2	N20-785	Pritekėjimo kamerų montavimas	vnt	1.0	155.2	7.12		162.32
3	N20-994	Šalčio mašinos montavimas	vnt	1.0	26.77	2.15	32.22	61.14
6	N26P-0201	Ortakių izoliavimas	100m2	0.83	208.23	530.12		738.35
7	N26P-0601	Ortakių izoliacijos padengimas	100m2	0.24	141.8	166.45	21.58	329.83
		cinkuotais lakštais, gaminant detales						
8	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų montavimas	vnt	2.0	12.17	290.69		302.86
9	N20-924	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas	vnt.	14.0	28.47	118.57	0.9	147.94
		apvaliuose ortakiuose						
10	N20-506	Įvairių tipų plieninių grotelių montavimas	vnt	28.0	125.26	482.88		608.14
11	N20P-0207	Difuzorių montavimas	vnt.	6.0	21.21	135.54		156.75
12	N16P-0401	Vandentiekio, šildymo vamzdinių iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų	m	18.0	33.63	157.86	0.33	191.82
13	N26-218	Vamzdinių izoliavimas	100m	0.18	12.77	66.37		79.14
14	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	0.92	67.45	19.83	9.14	96.42
15	88001003	Kabelis 5x6	m	35.0		99.05		99.05
16	88001004	Kabelis 3x1,5	m	27.0		13.23		13.23
17	88001005	Kabelis 5x2,5	m	30.0		37.5		37.5
18	N20-936	Triukšmo slopintuvų montavimas	vnt.	2.0	13.64	231.23	0.28	245.15
19	N20P-0602	Šalčio sekcijos montavimas	vnt.	1.0	25.25	0.42	0.06	25.73
20	N21-457	Automatikos skydo montavimas	vnt	1.0	111.1	1408.16		1519.26
21	N46-81	Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr.,kai armat.iki 40 mm,o skylės D iki 160 mm ir gylis 200 mm	100vnt	0.31	281.15		79.28	360.43
22	N46-97	Kai gylis daugiau kaip 200 mm ir skylės D iki 160 mm kiekvieniems 10 mm pridėti k4=10.0	100vnt	0.31	34.62		9.38	44.0
23	D3-33	Paleidimas- derinimas	vnt.	2.0	97.58			97.58
Skyriuje 1					1870.51	5194.78	153.17	7218.46

2 Bendrastatybiniai darbai

1	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo	m3	0.73	14.05			14.05
2	N46-151	Pakabinamų lubų išardymas	100m2	1.0503	329.7			329.7
3	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	106.9	788.92	88.08	13.77	890.77

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	0.7	6.03	1.28		7.31
5	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	1.4	19.57	6.46		26.03
6	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.042	5.64	1.58		7.22
7	N15-132	Paruoštų dažymui sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais	100m2	0.042	4.77	7.18		11.95
8	N2P-0103	Langų blokų montavimas	m2	3.86	44.83	1.7	0.37	46.9
9	88001002	Langų blokai	m2	3.86		366.7		366.7
10	R7-2	Durų varčių išėmimas	vnt	10.0	14.08			14.08
11	R7-50	Angų įrengimas ventiliacijai duryse	m	11.0	92.27	4.88		97.15
12	R7-4	Langų su staktomis rėmų išėmimas	vnt	1.0	4.13			4.13
13	N20-506	Ventiliacijos grotelių montavimas duryse	vnt	10.0	44.74	197.68		242.42
14	N7-50-1	Sąramų, kurių masė iki 0,3 t, montavimas	vnt	1.0	3.1	12.24	3.75	19.09
Skyriuje 2					1371.83	687.78	17.89	2077.50

Viso žiniaraštyje 1

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3242.34)

Viso:

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(3242.34+259.39)

Viso:**Statinio statybos išlaidos**

Statybvietės išlaidos 9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 30.00%(3242.34+259.39)

Pelnas 5.00%(11598.57+1050.52)

Iš viso netiesioginės išlaidos**Bendra vertė be PVM**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė su PVMSUDARĖ: Alimpa Kovalenko
(Pavardė)

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė

K0705 VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija

Statinsys

7054 VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija-Apkeičiami darbai

Žiniaraštis

1 Vėdinimas

Suma žiniaraščiui 8077.66 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	---------------	--------	--------------	--------------

1 Montavimo darbai

4	705414	Tiekimo kamera	kompl.	1.000	3295.88	3295.88
5	705415	Šalčio mašina	kompl.	1.000	3379.87	3379.87

Skyriuje 1 6675.75

žiniaraštyje 1 6675.75

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00% 1401.91

Iš viso žiniaraštyje 1 8077.66

SUDARĖ: Alimpa Kovalenko
(Pavardė)



ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė

K0705 VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija

Statiny

7054 VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija-Apkeičiami darbai

Žiniaraštis

2 Operacinės su anesteziologija technologinė įranga

Suma žiniaraščiui 35217.56 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Technologinė įranga						
1	888002001	Reguliuojamo aukščio operacinė kėdė	kompl.	1.000	341.56	341.56
2	888002002	Reguliuojamo aukščio operacinės kėdės	kompl.	8.000	230.27	1842.16
3	888002003	Instrumentinis staliukas 760x490x840mm	kompl.	5.000	405.47	2027.35
4	888002004	Instrumentinis staliukas su 2 lentynomis	kompl.	5.000	440.18	2200.9
5	888002005	Anestezijos staliukas su 3 lentynomis	kompl.	5.000	406.9	2034.5
6	888002006	Mayo tipo instrumentinis staliukas	kompl.	5.000	952.42	4762.1
7	888002007	Mayo tipo instrumentinis staliukas	kompl.	7.000	388.0	2716.0
8	888002008	Vienos pakopos laiptelis	vnt	5.000	147.68	738.4
9	888002009	Skalbinių maišų stovas	vnt	4.000	312.6	1250.4
10	888002010	Stovas infuzinių tirpalų flakonams	vnt	4.000	174.2	696.8
11	888002011	Anesteziologo vežimėliai	vnt	5.000	2099.05	10495.25

Skyriuje 1

29105.42

žiniaraštyje 2

29105.42

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%

6112.14

Iš viso žiniaraštyje 2

35217.56

SUDARĖ: Alimpa Kovalenko
(Pavardė)



SUDERINTA: 843.13 EUR.
UAB "KONSOLĖ"
GENERALINIS DIREKTORIUS
KAZYS SKUTULAS
2015 M. _____ MĖN. _____ D. _____

TVIRTINU: _____ EUR.
UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

2015 M. _____ MĖN. _____ D. _____

SAŲMATA



LOKALINĖ SAŲMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė

K0705 VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija

Statinsys

7054 VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija-Apkeičiami darbai

Žiniaraštis

3 Šilumokaičio keitimas karštam vandeniui

Suma žiniaraščiui 843.13 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimas ir medžiagos								
1	N16P-0602	Šilumokaičio demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	vnt.	1.0	9.38		1.37	10.75
2	R19-9	Uždarnosios armatūros nuėmimas	vnt.	6.0	37.94			37.94
3	N16P-0602	Šilumokaičių montavimas	vnt.	1.0	21.36	7.35	3.1	31.81
5	88003002	Plieno flanšai	vnt.	6.0		46.92		46.92
6	88003004	Šilumokaičio izoliacija	vnt.	1.0		124.25		124.25
7	N16P-0108	Trišakių demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	vnt.	3.0	17.82		4.53	22.35
8	N16P-0108	Trišakių montavimas	vnt.	3.0	29.7	9.3	7.54	46.54
9	88003005	Trišakiai d57	vnt.	3.0		53.31		53.31
10	N18-109	Iki 100 mm skersmens privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, privirinant objekte	vnt.	4.0	31.71	3.41	8.8	43.92
11	88003006	Ventiliai d57	vnt.	4.0		85.72		85.72

Skylėje 1

147.91 330.26 25.34 503.51

Viso žiniaraštyje 3

147.91 330.26 25.34 503.51

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(147.91)

11.83

Viso:

159.74 330.26 25.34 515.34

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(147.91+11.83)

49.52

Viso:

209.26 330.26 25.34 564.86

Statinio statybos išlaidos

Statyb vietės išlaidos 9.00%

50.84

Iš viso tiesioginės išlaidos

615.70

Pridėtinės išlaidos 30.00%(147.91+11.83)

47.92

Pelnas 5.00%(615.70+47.92)

33.18

Iš viso netiesioginės išlaidos

81.10

Bendra vertė be PVM

696.80

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

146.33

Bendra vertė su PVM

843.13

SUDARĖ: Alimpa Kovalenko
(Pavardė)

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė

K0705 VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija

Statyns

7054 VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija-Apkeičiami darbai

Žiniaraštis

3 Šilumokačio keitimas karštam vandeniui

Suma žiniaraščiui 3372.28 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	---------------	--------	--------------	--------------

4	88003001	1 Montavimas ir medžiagos Šilumokaitis XB 60-2-54/54	vnt	1.000	2787.01	2787.01
---	----------	---	-----	-------	---------	---------

Skyriuje	1					2787.01
----------	---	--	--	--	--	---------

žiniaraštyje	3					2787.01
--------------	---	--	--	--	--	---------

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS	21.00%	585.27
----------------------------	--------	--------

Iš viso žiniaraštyje	3	3372.28
----------------------	---	---------

SUDARĖ: _____
(Pavardė)



ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė

K0705 VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija

Statinys

7054 VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinių rekonstrukcija-Apkeičiami darbai

Žiniaraštis

4 Operacinių technologiniai įrenginiai

Suma žiniaraščiui 7377.49 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Operacinių technologiniai įrenginiai						
1	988002001	Spinta stumdomom durim 330x39x210cm ant kojelių	kompl.	1.000	1192.59	1192.59
2	988002002	Spinta su stumdomom durim 197x49x210cm ant kojelių	kompl.	1.000	770.21	770.21
3	988002003	Spinta stumdomom durim 257x39x210cm ant kojelių	kompl.	1.000	1105.63	1105.63
4	988002004	Spinta atidaromom durim 90x40x120cm	kompl.	1.000	253.42	253.42
5	988002005	Spinta stumdomom durim 200x39x210cm ant kojelių	kompl.	1.000	770.21	770.21
6	988002006	Spinta stumdomom durim 352x39x210cm ant kojelių	kompl.	1.000	1329.24	1329.24
7	988002007	Spinta stumdomom durim 182x49x122 ant kojelių	kompl.	1.000	675.8	675.8

Skyriuje 1

6097.1

žiniaraštyje 4

6097.1

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%

1280.39

Iš viso žiniaraštyje 4

7377.49

SUDARĖ: Alimpa Kovalenko
(Pavardė)

