

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2016-03-15, Nr. 40500/560394

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujamas Dujų tinklo vystymo departamento direktoriaus Karolio Rasiko, veikiančio pagal Tinklų vystymo departamento direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. nurodymą Nr. 12 (toliau – Užsakovas).

Uždaroji akcinė bendrovė "DUJOTIEKIO STATYBA", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147651435, PVM mokėtojo kodas LT47651435, registruotos buveinės adresas Elektronikos g. 7, Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Liudviko Zinevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas) (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo teikiamas Medžiagas), pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **NV (780) gamtinių dujų polietileninių dujotiekio įvadų projektavimo ir statybos Panevėžio rajono savivaldybės zonoje darbus** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priede Nr. 5) ir Darbų įkainių lentelėje (Sutarties SD Priede Nr. 1).

2.2. Bendra Darbų kaina **EUR 174.240,00 (vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt eurų, 00 ct)**, įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina **144.000,00 EUR (vienas šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai eurų, 00 ct)**;

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **30.240,00 EUR (trisdešimt tūkstančių du šimtai keturiasdešimt eurų, 00 ct)**.

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte.

2.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 3 nurodyto maksimalaus objektų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.6. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis Darbų įkainiais, nurodytais Sutarties SD Priede Nr. 1, kurie Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

2.7. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimų sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas (toliau tekste - Projektas) privalo atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų po projektinės dokumentacijos (Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia Projektavimo atlikimo termino, nurodyto Sutarties 5.1 punkte.

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.

- 3.6. Jei Uždavovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Uždavovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.
- 3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.
- 3.8. Techninio darbo projekto parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Uždavovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.
- 3.9. Parengtą statinio Projektą su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą turi gauti Rangovas.
- 3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Uždavovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.
- 3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.
- 3.12. Uždavovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.
- 3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Uždavovui pareikalavus, moka Uždavovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
- 3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.
- 3.15. Esant Uždavovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

- 4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: nurodyta Sutarties priede Nr. 4.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

- 5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip iki Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.
- 5.2. Darbai atliekami: **Panevėžio raj.**
- 5.3. Darbų atlikimo terminai:
- 5.3.1. Darbų atlikimo pabaiga - **per 30 kalendorinių dienų** nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos, arba per nurodytą terminą darbų užsakyme;
- 5.3.2. Projektavimo darbų pabaiga - **per 70 kalendorinių dienų** nuo užsakymo gavimo dienos arba per nurodytą terminą užsakyme.
- 5.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
- 5.5. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomas visų Sutartyje numatytų atlikti darbų faktas.
- 5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Uždavovui pareikalavus, moka Uždavovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Uždavovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Uždavovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Uždavovo reikalavimas sumažinamas priskačiuotų delspinigių suma.

6. ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMAS

- 6.1. Sutarties priede Nr. 1 nurodyti Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties priede Nr. 9 nurodytomis sąlygomis.

7. MEDŽIAGOS

- 7.1. Uždavovas Rangovui tiekia šias Darbams atlikti reikalingas Medžiagas: namų dujų apskaitos įtaisų (toliau - NDAI), namų dujų slėgio reguliavimo įtaisų (toliau - NDSRI), namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (toliau - NDSRAI) spintas be spintas laikančių rėmų, požeminius uždarymo įtaisus (esant galimybei, kitu atveju tiekia Rangovas pagal pasiūlytus Įkainius (Sutarties SD priedai)), apsauginius šulinėlius su pagrindais bei dujotiekių žymėjimo ženklus (be tvirtinimo stovo).

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 8.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: **taip**.
- 8.2. Sutarties garanto dydis: **6000,00 EUR**.

9. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLEŠ IR SULAIKYMAI

- 9.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus visus numatytus Darbus pasirašius deklaraciją apie statybos užbaigimą) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, pasirašius atliktų darbų aktą (F-2). Darbų pabaiga laikoma deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo data.
- 9.2. Sąskaitą už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu Darbų perdavimo - priėmimo aktu Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos.
- 9.3. Rangovas pasirašytą PVM sąskaitą-faktūrą nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu: saskaitos@eso.lt.

10. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 10.1. **Sutartis įsigalioja nuo Sutarties garanto pateikimo dienos.**
- 10.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus.
- 10.3. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams.

11. KONTAKTINIAI ASMENYS

- 11.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: **Jaunius Audickas, tel.: 8 650 77682.**
- 11.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

12. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

- 12.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000,00 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

13. PRIEDAI

- 13.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 13.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 13.2.1. Priedas Nr. 1 – Įkainiai dujotiekio įvadų pirkimui, 1 lapas;
- 13.2.2. Priedas Nr. 2 – Dujotiekio įvadų projektavimo ir statybos darbų užsakymas, 3 lapai;
- 13.2.3. Priedas Nr. 3 - Preliminarūs kiekliai, 1 lapas;
- 13.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapai;
- 13.2.5. Priedas Nr. 5 – Techninė specifikacija, 3 lapai;
- 13.2.6. Priedas Nr. 6 – Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas, 1 lapas;
- 13.2.7. Priedas Nr. 7 – Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAI, NDSRI, NDSRAI) spintelės montavimo schema, 1 lapas;
- 13.2.8. Priedas Nr. 8 – Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2), 5 lapai;
- 13.2.9. Priedas Nr. 9 – Įkainių perskaičiavimo formulė, 1 lapas.

14. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė „Dujotiekio statyba“

Direktorius

Liudvikas Zinevičius

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“
A. S. LT82 7044 0600 0298 2730
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

Dujų tinklo vystymo departamento direktorius

Karolis Rasikas

Dujotiekio įvadų projektavimo ir statybos darbų užsakymas

DUJOTIEKIO ĮVADO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
UŽSAKYMAS

Data: _____

Užsakovas, įmonės kodas: _____

Rangovas, įmonės kodas: _____

Objekto pavadinimas: _____

Dujotiekio įvado diametras (mm), ilgis (m):

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Iš viso be PVM, Eur
1	Žemės darbai	m'			0,00
2	Grunto transportavimas iš objekto ir į objektą (įvertinant grunto kainą)	m'			0,00
3	Dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m'			0,00
4	Dujotiekio vamzdžiai	m'			0,00
5	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys)*****	vnt.			0,00
6	Dangų ardymas				
6.1	asfalto dangos ardymas	m ²			0,00
6.2	žvyro dangos ardymas	m ²			0,00
6.3	šaligatvio (plytelių) ardymas	m ²			0,00
6.4	trinkelio dangos ardymas	m ²			0,00
6.5	kelio bortų ardymas	m'			0,00
6.6	šaligatvio bortų ardymas	m'			0,00
6.7	akmens grindinio ardymas	m ²			0,00
6.8	vejos ardymas	m ²			0,00
7	Dangų atstatymas				
7.1	asfalto dangos atstatymas 1 sl.	m ²			0,00
7.2	asfalto dangos atstatymas 2 sl.	m ²			0,00
7.3	žvyro dangos atstatymas važiuojamoje dalyje	m ²			0,00
7.4	žvyro dangos atstatymas nevažiuojamoje dalyje	m ²			0,00
7.5	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų plytelių)	m ²			0,00
7.6	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 15% naujų plytelių)	m ²			0,00
7.7	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų plytelių)	m ²			0,00
7.8	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų plytelių)	m ²			0,00
7.9	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų šaligatvio bortų)	m'			0,00
7.10	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų šaligatvio bortų)	m'			0,00
7.11	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų šaligatvio bortų)	m'			0,00
7.12	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų kelio bortų)	m'			0,00
7.13	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų kelio bortų)	m'			0,00

7.14	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų kelio bortų)	m'			0,00
7.15	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų trinkelų)	m ²			0,00
7.16	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų trinkelų)	m ²			0,00
7.17	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų trinkelų)	m ²			0,00
7.18	akmens grindinio atstatymas	m ²			0,00
7.19	vejos atstatymas (be juodžemio, su sėklomis)	m ²			0,00
7.20	vejos (visų tipų) atstatymas (su juodžemiu ir sėklomis)	m ²			0,00
8	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių tiesimas uždaru būdu (įvertinant dėklus)	m'			0,00
9	Dujotiekio vamzdžių tiesimas dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus)	m'			0,00
10	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos) (be spintelės kainos)				
10.1	Pakabinamos spintelės (iki 2 apskaitos prietaisų) (be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.2	Pakabinamos spintelės (su 3, 4, 5, 6 apskaitos prietaisais) (be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.3	Spintelės su baze ir viena apskaita (be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.4	Spintelės su baze ir dviem apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.5	Spintelės su trim apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.6	Spintelės su keturiom apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.7	Spintelės su penkiom apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.8	Spintelės su šešiom apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.9	Spintelės keitimas (ant sklypo ribos, be spintelės kainos)	vnt.			0,00
10.10	Spintelės keitimas (ant pastato sienos, be spintelės kainos)	vnt.			0,00
11	Uždaromosios armatūros montavimo darbai (be armatūros kainos)	vnt.			0,00
12	Uždaromosios armatūros kaina (naudojama Užsakovui neturint galimybės pateikti uždaromąją armatūrą)	vnt.			0,00
13	Kondensato rinktuvo montavimo darbai (su kondensato rinktuvu)	vnt.			0,00
14	Įsipjovimas į veikiantį dujotiekį (įpjova)				
14.1	Į požeminį PE dujotiekį, kai įpjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, įpjovos darbais ir medžiagomis)	vnt.			0,00
14.2	Į požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas	vnt.			0,00
15	Pridėtinės išlaidos (darbams (pagal Eil. Nr. 1-3, 6-11, 13-14))	%			0,00
16	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos				
16.1	Projektavimo paslaugos	obj.			0,00
16.2	Darbo projekto rengimas	obj.			0,00
16.3	Topografinė nuotrauka	obj.			0,00
16.4	Rašytinis pritarimas statinio projektui *****	obj.			0,00
16.5	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.			0,00
16.6	Leidimas žemės kasinėjimo darbams**	obj.			0,00
16.7	Trasos nužymėjimas**	obj.			0,00
17	Kitos statinio išlaidos				
17.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą ****	obj.			0,00
17.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą**	obj.			0,00
17.3	Mokestis už žvalgomojus archeologinius tyrinėjimus *	obj.			0,00

17.4	Mokestis už detaliuosius archeologinius tyrinėjimus *	obj.			0,00
17.5	Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę**	obj.			0,00
17.6	Melioracijos, drenažo sistemų atstatymas**	susikirt.			0,00
17.7	Kelių ženklų pastatymas **	obj.			0,00
17.8	Statybinio laužo išvežimas ***	t.			0,00
Suma be PVM					0,00

PASTABOS :

- 1) * sumokama pagal Rangovo pateiktą archeologinių žvalgomųjų/detaliųjų tyrimų ataskaitą, sutartį su archeologinės priežiūros vykdytoju (neviršijant numatyto įkainio);
- 2) ** sumokama kai Rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas, kurioje nurodytas objekto adresas;
- 3) *** sumokama kai Rangovas pateikia atliekų priėmimo akto, kuriame nurodytas objekto adresas kopiją;
- 4) **** sumokama kai Rangovas pateikia atliktų darbų aktą, kuriame nurodytas objekto adresas;
- 5) ***** pagal pateiktą vidutinį vienos fasoninės dalies įkainį (5 punktas);
- 6) ***** darbai atliekami tik gavus Užsakovo įgaliojimą.

Faktiškai atliktų darbų kiekiai negali būti didesni kaip 20 % užsakyme nurodytų darbų kiekių. Projektavimo darbų pabaiga (gavus statybą leidžiantį dokumentą) iki:

Statybos darbų pabaiga (gavus VEI pažymą):

Statybos užbaigimo data:

Pridedami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1	Vartotojų kontaktiniai duomenys	
2	Projektavimo techninė užduotis	
3	Schema su numatoma dujotiekio vieta	
4	Žemės sklypo(-ų) planas	
5	Žemės sklypo(-ų) nuosavybės pažymėjimas (-ai)	
...		

Užsakovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

A.V.

Rangovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

A.V.

Preliminarūs kiekiai 3 (trims) metams

Eil. Nr.	Skelbiamų darbų zonos	Dujotiekio įvadai (Paslaugos ir/arba Darbai)	
		Min. objektų skaičius, vnt.	Max. objektų skaičius, vnt.
1	Panevėžio rajonas	30	300

Techninė specifikacija

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – Akcinė bendrovė "Energijos skirstymo operatorius"
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Paslaugos** - gamtinių dujų polietileninių dujotiekio įvadų projektavimas.
- 1.5. **Darbai** – gamtinių dujų polietileninių dujotiekio įvadų statybos darbai.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI/ PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS/CHARAKTERISTIKA/PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 2.1. **Pirkimo objekto apimtys pateiktos Sutarties SD 3 priede.**
- 2.2. **Tiekėjo įsipareigojimai:**
 - 2.2.1. Jei reikia, archeologinius žvalgomuosius bei kitus tyrinėjimus, reikalingus objekto statybai, užsako ir apmoka Tiekėjas;
 - 2.2.2. Jei reikia, drenažo tinklų, melioracijos statinių atstatymo išlaidas apmoka Tiekėjas, kuris privalo Pirkėjui priduoti kiekvieną dujotiekio susikirtimą su naujai sumontuotais drenažo tinklais, melioracijos statiniais neužpylus grunto;
 - 2.2.3. Parengti Dujotiekio įvado projektą (toliau – Projektas) vadovaujantis pridedama Projektavimo technine užduotimi pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;
 - 2.2.4. Suderinti Dujotiekio įvado (namų dujų apskaitos įtaiso (toliau - NDA)), namų dujų slėgio reguliavimo įtaiso (toliau - NDSR)), namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaiso (toliau - NDSRA)), uždarymo įtaiso, aklės) vietą su sklypo (valdos) savininku (nauju dujų vartotoju). Esant būtinumui pakeisti schemoje nurodytos dujotiekio trasos vietą, šį sprendimą suderinti su Pirkėju.
 - 2.2.5. Jei reikia, gauti NŽT pritarimą statyti dujotiekį valstybinėje nesuformuotoje žemėje/teritorijoje, pagal tuo metu galiojančius norminius dokumentus.
 - 2.2.6. Gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomas dujotiekis, suderinimus, organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių sudarymą:
 - 2.2.6.1. Gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams;
 - 2.2.6.2. Parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų nustatymo žemės sklypams pateikti Pirkėjui peržiūrai. Pirkėjui peržiūrėjus ir pasirašius dokumentus, Tiekėjas kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką Tiekėjas informuoja Pirkėją ir žemės sklypų savininkus;
 - 2.2.6.3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo vamzdynų ir bet kokių kitų įrenginių, būtinų gamtinėms dujoms skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (dujotiekio (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami šie dujotiekiai (įrenginiai), AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudai turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas dujotiekiiui (įrenginiams) įrengti;
 - 2.2.6.4. Mokesčius notarų biurui už servitutų sutarties tvirtinimą bei registravimą apmokės Pirkėjas;
 - 2.2.7. Pateikti suderintą Projekto originalą, dvi kopijas grafinėje formoje ir vieną kopiją skaitmeniniu (PDF) formatu pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus;
 - 2.2.8. Prieš 3 (tris) kalendorines dienas raštiškai informuoti Pirkėjo atstovą apie numatomą Darbų pradžią;
 - 2.2.9. Tiekėjas įsipareigoja vykdyti parengto projekto vykdymo priežiūrą;

- 2.2.10. Tiekėjas apsirūpina visomis medžiagomis, įrenginiais ir mechanizmais, reikalingais darbams atlikti (išskyrus tai, ką pateikia Pirkėjas);
- 2.2.11. Tiekėjas turi atlikti visus dujotiekio statybai reikalingus žemės darbus;
- 2.2.12. Pagal parengtą ir suderintą Projektą pastatyti dujotiekio įvadą;
- 2.2.13. Tiekėjas privalo suteikti Pirkėjo atstovams, Darbų techniniams prižiūrėtojams ir Projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti, testuoti medžiagas ir darbo kokybę bei tikrinti statybos eigą;
- 2.2.14. Dujotiekio prijungimą prie veikiančio dujotiekio atlieka Tiekėjas arba Pirkėjas pagal pateikiamą užsakymą (bet kuriuo atveju medžiagas, reikalingas dujotiekio prijungimui, tiekia Tiekėjas, duobės kasimą, užpylimą, dujotiekio prijungimui, atlieka Tiekėjas);
- 2.2.15. Statybinės atliekas išvežti ir perduoti jas tvarkančiai įmonei bei pateikti Pirkėjui pažymą apie tai;
- 2.2.16. Atlyginti dėl atliekamų Darbų patirtus nuostolius žemės sklypų savininkams (nuomotojams, naudotojams) už statybvietės ribų;
- 2.2.17. Išlaidas už leidimą žemės kasimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, VEI pažymą, archeologinius tyrinėjimus, melioracijos sistemų atstatymą, drenažo sistemų atstatymą, kelio ženklų pastatymą, statybinio laužo išvežimą (nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas) Tiekėjas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama;
- 2.2.18. Tiekėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio geodezinę nuotrauką (jeigu objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgus) grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate LKS-94 koordinatų sistemoje ir shape formatu, pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimus (1 egz.);
- 2.2.19. Baigus Darbus pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio techninę dokumentaciją grafinėje formoje ir skaitmeniniu (PDF) formatu.

2.3. **Dujotiekio, įrenginių techniniai bei kiti reikalavimai:**

- 2.3.1. Medžiagos ir įrenginiai negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo objekto Darbų užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus);
- 2.3.2. Požeminiai polietileniniai dujotiekio vamzdžiai turi atitikti (prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4; prEN1555-5) reikalavimus.

2.4. **Objekto Darbus sudaro:**

- 2.4.1. Žemės kasimo darbų leidimo gavimas
- 2.4.2. Darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į statybos vietą ir kita;
- 2.4.3. Bendrastatybiniai darbai;
- 2.4.4. Dujotiekio trasos nužymėjimas;
- 2.4.5. Žemės darbai:
 - 2.4.5.1. Dangų ardymas ir atstatymas į buvusią padėtį;
 - 2.4.5.2. Grunto iš tranšėjų kasimo ir išvežimo darbai;
- 2.4.6. Medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietėje;
- 2.4.7. Vamzdžių suvirinimo, klojimo ir įvėrimo darbai, fasoninių dalių, dujotiekio įtaisų montavimo darbai;
- 2.4.8. Suvirinimo siūlių kontrolė;
- 2.4.9. Įvadinę spintelę (NDAI, NDSRI, NDSRAI) 1-2 apskaitos prietaisams montuoti (arba keisti) pagal Pirkėjo pateiktą montavimo schemą (Priedas Nr. 7). Kitas įvadinės spintelės montuoti vadovaujantis Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis.
- 2.4.10. Dujotiekio trasos susikirtimų ir perėjimų per kelius, inžinerinius tinklus ir kitas kliūtis įrengimo darbai;

- 2.4.11. Laikinių privažiavimo kelių įrengimas. Laikinus privažiavimus įrengti suderinus su sklypų savininkais, užtikrinant jiems galimybę saugiai privažiuoti prie sklypo ar pastato dalies. Įrenginiai saugiam pėsčiųjų eismui, apšvietimas, aptvėrimai bei kitos saugos priemonės;
- 2.4.12. Vamzdynų užpylimo naujai atvežtu gruntu darbai;
- 2.4.13. Dujotiekio bandymai bei išvalymas ir nusausinimas;
- 2.4.14. Aplinkos tvarkymo darbai;
- 2.4.15. Kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti statybos projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą;
- 2.4.16. Apsirūpinimas visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;
- 2.4.17. Kartu su Pirkėju statybos darbų užbaigimo procedūrų organizavimas ir akto / deklaracijos gavimas.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 3.1. Panevėžio rajono savivaldybės teritorija
-

4. KITA SVARBI INFORMACIJA

4.1. Pirkėjo įsipareigojimai:

- 4.1.1. Sutarties pasirašymo dieną Tiekėjui perduoti projektavimo paslaugoms vykdyti būtinus dokumentus:
- vartotojų kontaktinius duomenis;
 - projektavimo techninę užduotį;
 - schemą su numatoma dujotiekio vieta;
 - žemės sklypo planą;
 - Žemės sklypo nusavybės pažymėjimą;
- 4.1.2. Priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų Darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus Darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai;
- 4.1.3. Įsigaliojus sutarčiai, raštu pranešti Tiekėjui, kas vykdys darbų techninę priežiūrą;
- 4.1.4. Vykdyti sutarties kontrolę;
- 4.1.5. Pirkėjas tiekia NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ be spintas laikančių rėmų, požeminius uždarymo įtaisus (esant galimybei, kitu atveju tiekia Tiekėjas pagal pasiūlytus įkainius), apsauginius šulinėlius su pagrindais bei dujotiekių žymėjimo ženklus.

Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas

PATVIRTINTA
AB „Energijos skirstymo operatorius“
.....direktoriaus
201..... m.d. potvarkiu Nr.

VERTYBIŲ (MEDŽIAGŲ) PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

20..... m. d.

Užsakovas:

Rangovas:

Eil. Nr.	Vertybių kodas	Perduodamos vertybės (medžiagos) pavadinimas ir jos charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma, EUR	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Rangos sutarties data

Viso:

Nuo vertybių (medžiagų) priėmimo dienos gavėjas pilnai atsako už jų saugumą, tinkamą ir kokybišką jų sandėliavimą bei sumontavimą iki atliktų darbų priėmimo akto pasirašymo.

Išduoti leido:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Vertybės išdavė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20..... m. d.

A.V.

Vertybės priėmė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)


20..... m. d.

A.V.

Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAI, NDSRI, NDSRAI) spintelės montavimo schema

1 pav. Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAI, NDSRI, NDSRAI) spintelės montavimo schema.

Pastaba: visi dujotiekio įvado įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis *Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis*.

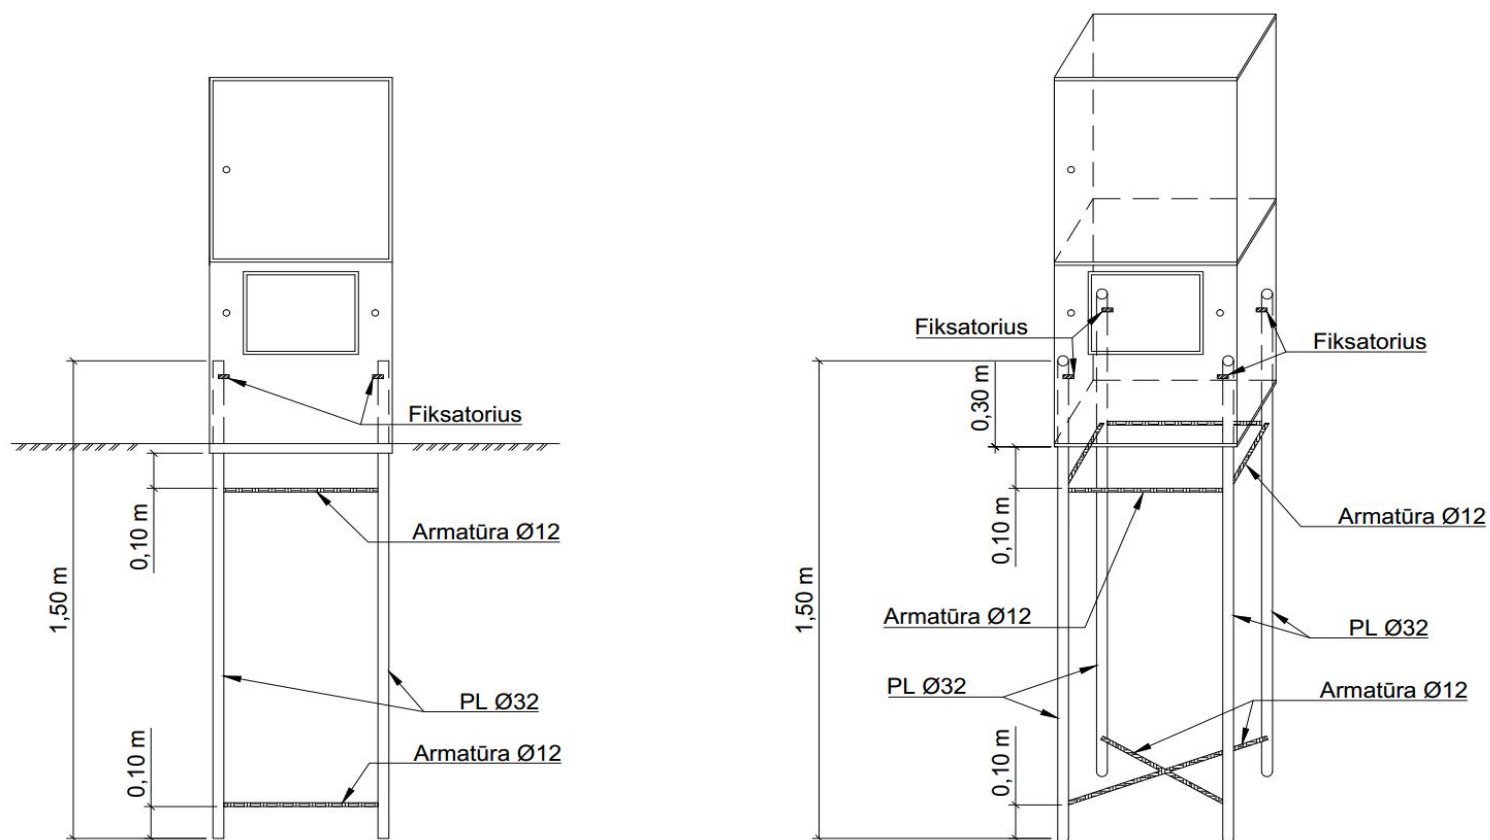

Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2)

PATVIRTINTA
AB „Energijos skirstymo operatorius“
.....direktoriaus
201..... m.d. potvarkiu Nr.

Užsakovas, įmonės kodas:

Rangovas, įmonės kodas:

Objekto pavadinimas:

Sutarties Nr.:

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Diametras, mm		Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Iš viso be PVM, Eur
1	Žemės darbai	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
2	Grunto transportavimas iš objekto ir į objektą (įvertinant grunto kainą)	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
3	Dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
4	Dujotiekio vamzdžiai	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
5	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys)	vnt.	d ₁				0,00
		vnt.	d ₂				0,00

		vnt.	d _n				0,00
6	Dangų ardymas						
6.1	asfalto dangos ardymas	m ²	d _n				0,00
6.2	žvyro dangos ardymas	m ²	d _n				0,00
6.3	šaligatvio (plytelių) ardymas	m ²	d _n				0,00
6.4	trinkelų dangos ardymas	m ²	d _n				0,00
6.5	kelio bortų ardymas	m'	d _n				0,00
6.6	šaligatvio bortų ardymas	m'	d _n				0,00
6.7	akmens grindinio ardymas	m ²	d _n				0,00
6.8	vejos ardymas	m ²	d _n				0,00
7	Dangų atstatymas						
7.1	asfalto dangos atstatymas 1 sl.	m ²	d _n				0,00
7.2	asfalto dangos atstatymas 2 sl.	m ²	d _n				0,00
7.3	žvyro dangos atstatymas važiuojamoje dalyje	m ²	d _n				0,00
7.4	žvyro dangos atstatymas nevažiuojamoje dalyje	m ²	d _n				0,00
7.5	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų plytelių)	m ²	d _n				0,00
7.6	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 15% naujų plytelių)	m ²	d _n				0,00
7.7	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų plytelių)	m ²	d _n				0,00
7.8	šaligatvio (plytelių) atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų plytelių)	m ²	d _n				0,00
7.9	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų šaligatvio bortų)	m'	d _n				0,00
7.10	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų šaligatvio bortų)	m'	d _n				0,00
7.11	šaligatvio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų šaligatvio bortų)	m'	d _n				0,00
7.12	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų kelio bortų)	m'	d _n				0,00
7.13	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų kelio bortų)	m'	d _n				0,00
7.14	kelio bortų atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų kelio bortų)	m'	d _n				0,00
7.15	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 0% naujų trinkelų)	m ²	d _n				0,00
7.16	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 50% naujų trinkelų)	m ²	d _n				0,00

7.17	trinkelų dangos atstatymas (pakeičiant iki 100% naujų trinkelų)	m ²	d _n				0,00
7.18	akmens grindinio atstatymas	m ²	d _n				0,00
7.19	vejos atstatymas (be juodžemio, su sėklomis)	m ²	d _n				0,00
7.20	vejos (visų tipų) atstatymas (su juodžemiu ir sėklomis)	m ²	d _n				0,00
8	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių tiesimas uždaru būdu (įvertinant dėklus)	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
9	Dujotiekio vamzdžių tiesimas dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus)	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
10	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos) (be spintelės kainos)						
10.1	Pakabinamos spintelės (iki 2 apskaitos prietaisų) (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.2	Pakabinamos spintelės (su 3, 4, 5, 6 apskaitos prietaisais) (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.3	Spintelės su baze ir viena apskaita (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.4	Spintelės su baze ir dviem apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.5	Spintelės su trim apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.6	Spintelės su keturiomis apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.7	Spintelės su penkiomis apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.8	Spintelės su šešiomis apskaitom (be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.9	Spintelės keitimas (ant sklypo ribos, be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
10.10	Spintelės keitimas (ant pastato sienos, be spintelės kainos)	vnt.	d _n				0,00
11	Uždaromosios armatūros montavimo darbai (be armatūros kainos)	vnt.	d ₁				0,00
		vnt.	d ₂				0,00
		vnt.	d _n				0,00

12	Uždarnosios armatūros kaina (naudojama Užsakovui neturint galimybės pateikti uždaromąją armatūrą)	vnt.	d ₁				0,00
		vnt.	d ₂				0,00
		vnt.	d _n				0,00
13	Kondensato rinktuvo montavimo darbai (su kondensato rinktuvu)	vnt.	d ₁				0,00
		vnt.	d ₂				0,00
		vnt.	d _n				0,00
14	Išipjovimas į veikiančią dujotiekį (įpjova)						
14.1	Į požeminį PE dujotiekį, kai įpjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, įpjovos darbais ir medžiagomis)	vnt.	d _n				0,00
14.2	Į požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas	vnt.	d _n				0,00
15	Pridėtinės išlaidos (darbams (pagal Eil. Nr. 1-3, 6-11, 13-14))	%					0,00
16	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos						
16.1	Projektavimo paslaugos	obj.					0,00
16.2	Darbo projekto rengimas	obj.					0,00
16.3	Topografinė nuotrauka	obj.					0,00
16.4	Leidimas statyti naujus statinius arba Rašytinis pritarimas statinio projektui	obj.					0,00
16.5	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.					0,00
16.6	Leidimas žemės kasinėjimo darbams	obj.					0,00
16.7	Trasos nužymėjimas	obj.					0,00
17	Kitos statinio išlaidos						
17.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą	obj.					0,00
17.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą	obj.					0,00
17.3	Mokestis už žvalgomojusius archeologinius tyrinėjimus	obj.					0,00
17.4	Mokestis už detaliuosius archeologinius tyrinėjimus	obj.					0,00
17.5	Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę	obj.					0,00
17.6	Melioracijos, drenažo sistemų atstatymas	susikirt.					0,00
17.7	Kelių ženklų pastatymas	obj.					0,00
17.8	Statybinio laužo išvežimas	t.					0,00

Suma be PVM	0,00
PVM 21%	0,00
Viso su PVM	0,00

Užsakovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas, data)

A.V.

Rangovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas, data)

A.V.

Įkainių perskaičiavimo formulė

Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis:

1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per Kalendorinius metus tokiomis sąlygomis:
 - 1.1. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo Kalendorinių metu paskutinį mėnesį;
 - 1.2. jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc.;
 - 1.3. pirmą kartą perskaičiuojant ne ankščiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Įkainių perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti Įkainius. Įkainiai perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:

$$C_{pn} = S_n \times (1 + (I - X) / 100)$$

C_{pn} – perskaičiuotas Darbui taikomas įkainis

S_n – Sutartyje numatytas Darbui taikomas įkainis

I – infliacijos arba defliacijos dydis procentais;

X - defliacijos atveju (- 5), infliacijos 5.

- 1.4. Duomenų šaltinis - <http://www.stat.gov.lt>, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai;
 - 1.5. perskaičiuoti Įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip.
2. Už Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl Įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Pirkėjas apmoka taikant iki tol galiojusius Įkainius, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naujus Įkainius.
