

DARBŲ SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2016 m. rugpjūčio 18 d. Nr. **S1-445**
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija, (toliau - Užsakovas), atstovaujama Kretingos miesto seniūnijos seniūno, Stanislovo Juknevičiaus, veikiančio pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. A1-32 „Dėl įgaliojimų seniūnijų seniūnams“ ir UAB „Arkosta“ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Paulausko, iš kitos pusės sudarėme, šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarėme:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra civilinių kapinių tvoros, Vilniaus g. 19A, Kretinga, remonto darbai (toliau – Darbai). Darbai atliekami pagal šios sutarties sąlygas, lokalinę sąmatą, techninę specifikaciją (sutarties 1 priedas)

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties objekto kaina nustatyta supaprastinto pirkimo, taikant mažos vertės (tiekėjų apklausos raštu) pirkimų būdą yra 18532,38 Eur be PVM, PVM – 3891,80 Eur, bendra kaina su PVM - Dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt keturi eurai 18 ct.

2.2. Sutarties taikomi fiksuotos kainos kainodaros principai.

2.3. Kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Pirkimo kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus, kai padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui neatliktų darbų kaina atitinkamai didinama arba mažinama, pasirašant Šalims papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos - perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

2.4. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

2.5. Užsakovas už atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (PVM sąskaita- faktūra bei darbų perdavimo ir priėmimo aktą) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po šių dokumentų pateikimo dienos.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

3.1. Darbų atlikimo terminas:

3.1.1. Darbų pradžia - apklausą laimėjęs Vykdytojas darbus privalės pradėti per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos;

3.1.2. Darbų pabaiga – 3 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Sutarties objektui nustatomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatyti garantiniai terminai. Vykdytojas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laiką.

4.2. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, normatyviniais statybos dokumentais, apklausos dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

4.3. Vykdytojas įsipareigoja:

4.3.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės normų ir taisyklių, standartų;

4.3.2. darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje;

Direktorius
Mindaugas Paulauskas

4.3.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę;

4.3.4. vykdydamas darbus objekte garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, paminklų, esančių kapinėse, Vilniaus g. 19A, Kretinga, ir statinių, esančių Vilniaus g. 19, Kretinga, saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeltų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

4.3.5. vykdant civilinių kapinių tvoros remonto darbus, atsiradusią žalą (sugadinus paminklus, kitus statinius, sunaikinus augalus ir t.t.) atlyginti savo lėšomis;

4.3.6. informuoti apie darbų pradžią ir numatomus vykdyti darbus šalia Sutarties objekto esančio žemės sklypo Vilniaus g. 19, Kretinga, savininę Zuzaną Albina Šalnienę (Ryšiui palaikyti mob. 8 671 34864);

4.3.7. pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau, kaip priešpaskutinę darbo dieną, prašant organizuoti jo priėmimą;

4.3.8. pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia Sutartimi susiję darbai, įvairias atliekas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant objekto vietą švarią;

4.3.9. darbus užbaigti šioje sutartyje nustatytais terminais.

4.4. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas:

4.4.1. apmokėti Vykdytojui už tinkamai atliktus darbus pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;

4.4.2. raštu pranešti Vykdytojui apie garantiniu laiku atsiradusius defektus.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

5.1.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 15 dienų nuo Vykdytojo pranešimo apie objekto užbaigimą termino moka Vykdytojui 0,02 % dydžio delspinigius nuo sutarties 2.1. punkte nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Rangovas:

5.2.1. Užsakovo nurodytu laiku nepašalines defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 200,00 (dviejų šimtų) eurų baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

5.2.2. uždelsęs 1.1. punkte nurodytus darbus, moka, Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties 2.1. punkte nurodytos sumos ir moka 10,00 (dešimt) eurų baudą už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra bauda ir delspinigių suma pagal šį sutarties punktą negali viršyti 20 % sutarties objekto kainos.

5.3. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti sutarties 5.2. punkte nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Vykdytojui atliekamų mokėjimų.

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

6.1. Nė viena iš sutarties šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Force majeure).

6.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos atitinkamose LR civilinio kodekso nuostatose ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

6.3. Sutarties Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie paaiškinusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.

6.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Direktorius
Mindaugas Paulauskas

VII. PAKEITIMAI

7.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą.

Nuo sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties Šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų ir pagal Sutarties 7.2. punktą įforminti pakeitimą. Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

7.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą;

7.1.2. vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis. Nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu:

7.1.3. jei nevykdomų Darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal 7.1.2. punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrenginių kaina nustatoma ne didesnė nei Vykdytojo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesnis nei 5% tiesioginių išlaidų.

7.2. Pakeitimai nurodyti 7.1. punkte forminami tokia tvarka:

7.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Vykdytojas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pritaikant Sutarties priede „Apklausa laimėjusio dalyvio pasiūlymo darbų lokalinė sąmata“ numatytus Darbų įkainius, ir kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

7.2.2. jeigu dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą ar jo dalį būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Vykdytojas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą, pritaikant numatytus Darbų įkainius bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą ir, Užsakovui įvertinus Vykdytojo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atlikus Darbų vykdymo pakeitimus.

7.3. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 7.1. punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 30%.

7.4. Bet kokią papildomą Darbą, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti Darbus, Užsakovas turi pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

VIII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA, SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

8.1. Užsakovas, raštu nuroydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ar panašiai), gali bet kada nurodyti Vykdytojui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau, nei 30 (trisdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo

Directorius
Mindaugas Paulius

terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Vykdytojo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

8.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjęs Vykdytoją prieš 14 kalendorinių dienų, ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius:

8.2.1. kai Vykdytojas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši: Vykdytojui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

8.2.2. jei Vykdytojas nepradeda laiku vykdyti darbų arba dėl Vykdytojo kaltės vėluoja vykdyti darbus, arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

8.3. Sutarties nuostatos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias darbų pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.

8.4. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teismingumo taisyklės sprendžia Kretingos rajono apylinkės teismas arba Klaipėdos apygardos teismas.

8.5. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

8.6. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Vykdytojui.

8.7. Sutarties priedai:

8.7.1. Apklausa laimėjusio dalyvio pasiūlymo darbų lokalinė sąmata, techninė specifikacija, schema.

IX. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR PARAŠAI

9.1. Užsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, kodas 188715222, tel. Nr. (8 445) 52552, faks. Nr. (8 445) 52448, A. s. LT734010041800000035, AB bankas DNB, banko kodas 40100.

9.2. Vykdytojas UAB „Arkosta“, Klaipėdos g. 127S, LT- 97156 Kretinga, įmonės kodas 300638988, tel. Nr.(8 614) 26 732, faks. Nr. (8 445) 77 698, A. s. LT064010041800490412, AB bankas DNB, banko kodas 40100.

Užsakovas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Kretingos miesto seniūnijos seniūnas



Stanislovas Juknevičius

Vykdytojas

UAB „Arkosta“ direktorius



CIVILINIŲ KAPINIŲ TVOROS, VILNIAUS G. 19A, KRETINGA, REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA,

Apklausos laimėtojas privalo atlikti šiuos civilinių kapinių, Vilniaus g. 19A, Kretinga, tvoros remonto darbus:

1. Atstatyti išgriuvusios akmeninės civilinių kapinių tvoros dalį (apie 5 m), prieš tai sutvirtinus tvoros pagrindą gelžbetonu.

2. Nuo civilinių kapinių tvoros galo (vakarinėje dalyje) iki gyvenamojo namo Vilniaus g. 19, Kretinga, įrengti atraminę gelžbetoninę sienutę, nuo akmeninės tvoros į gyvenamojo namo valdos pusę atitrauktą 1 m. Sienutė turi būti įrengta ant gelžbetoninių polių, įgiltų ne mažiau kaip 1,20 m, 0,30 m pločio, 1 m aukščio nuo žemės paviršiaus. Ne rečiau, kaip 2,5 m tarp atraminės sienutės ir akmeninės tvoros būtina įrengti gelžbetonines atotampas. Tarpą tarp akmeninės tvoros ir atraminės sienutės užpildyti žemėmis.

3. Ant akmeninės tvoros naujai įrengti betoninį stogelį (apie 67 m).

4. Gyvenamojo namo valdos Vilniaus g. 19, Kretinga, teritorijoje pašalinti tris vaismedžius, kurie trukdys atraminės sienutės įrengimui, o šuns voljerą perkelti į kitą vietą.

5. Gyvenamojo namo valdos Vilniaus g. 19, Kretinga, teritorijoje darbų atlikimo metu išardyti betoninių trinkelų dangą, kad ji nebūtų sugadinta į statybą privežant statybines medžiagas. Atlikus civilinių kapinių tvoros remonto darbus trinkelų dangą atstatyti.

Statybos darbų atlikimui reikalinga prieiga aikštelė medžiagų sandėliavimui, atliekamų darbų vieta, šuns voljeras, šalinami medžiai nurodyti pridedamoje schemoje.

Kretingos miesto seniūnijos
seniūnas
Stanislovas Juknevičius



Direktorius
Mindaugas Paulauskas

APKLAUSĄ LAIMĖJUSIO DALYVIO PASIŪLYMO DARBŲ LOKALINĖ SAMATA

erinta: _____ Eur.

Tvirtinu: 22424,18 Eur.

6 m. _____ mėn. d.

2016 m. 08 mėn. 12 d.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

darbų grupė 346 CIVILINIŲ KAPINIŲ TVOROS REMONTAS KRETINGOJE

skaičius 1

įrašytas 1

2016.08.12

Suma žiniaraščiui 22424,18 EUR

Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Matavimų vienetai	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	4,24	302,4163	1282,25
2	N6-22	Gelžb. juostiniai pamatai, alumininės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinčius iš skydų	m3	15,84	559,7146	8865,98
3	F1-1-4	Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą	100 m3	0,45	5313,3242	2391,0
4	F8-1-f	Lauko akmenų mūras	m3	8,0	295,6128	2364,1
5	N1P-1105	Beloninių kepurinių įrengimas	100m	0,67	4077,576	2731,98
6	N7P-0806	Šums voļjero aptvėrimo išardymas ir įrengimas	m	11,2	41,0963	480,28
7	N27P-27-2	Dolomito skaldaies šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0,28	295,0405	82,61
8	R61P-0107	Prieigrindų remontas, atstatant dangą, kai dangą m2 betoninių trinkelų (be trinkelų kainos)	m2	28,0	12,6528	354,28

Skaičiuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00%

Iš viso žiniaraštyje 1

18532,38


18532,38

3891,8

22424,18

Kretingos miesto seniūnijos
seniūnas
Stanislovas Juknevičius



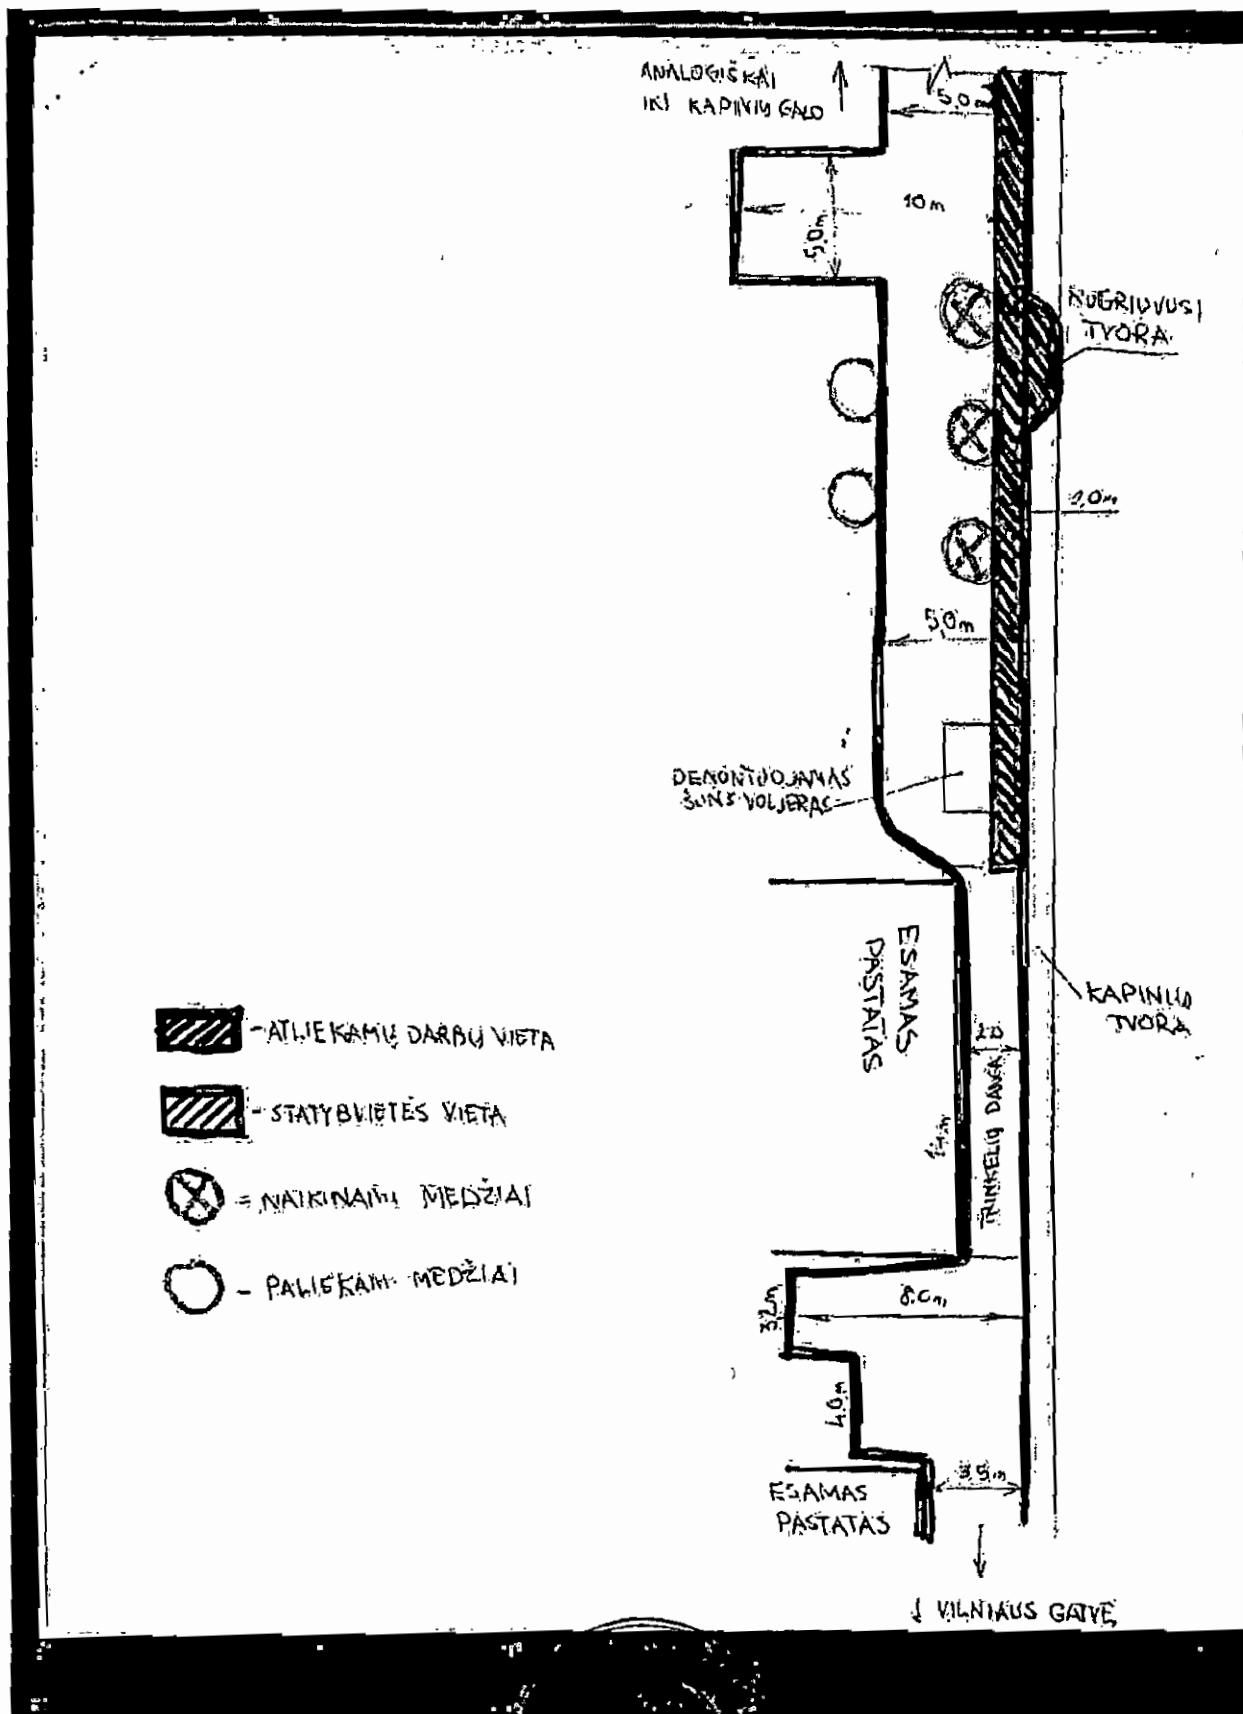

Kretingos miesto seniūnas
seniūnas
Stanislovas Juknevičius



Direktorius
Mindaugas Pukštelis



arkosta

statybų sistemos

Įmonės kodas 300638988, PVM kodas LT100003033418 Tel/fax.8(445)77698; mob.tel. +37061426732

DnB NORD bankas a/s LT064010041800490412 Kretingos skyrius b/k 40100

Adresas: Klaipėdos g. 127s, Kretinga LT-97156; arkosta@gmail.com

www.arkosta.lt

2016-08-12

(6.31) 212.7

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Kretingos miesto seniūnijai

**PASIŪLYMAS
DĖL CIVILINIŲ KAPINIŲ TVOROS, VILNIAUS G. 19A, KRETINGA,
REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2016-08-12

(Data)

Kretinga

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Arkosta“
Tiekėjo adresas	Klaipėdos g.127s, Kretinga
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Mindaugas Paulauskas
Telefono numeris	861426732
Fakso numeris	8445 77698
El. pašto adresas	arkosta@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis apklausos sąlygose, taip pat ir su sutarties projekte išdėstytomis nuostatomis.

Pranešame, kad, išanalizavę apklausos dokumentus ir sąlygas, esame suinteresuoti dalyvauti šioje darbų pirkimo apklausoje ir sudaryti darbų sutartį. Sutinkame atlikti visus darbų kiekių žiniaraštyje nurodytus darbus.

Mes siūlome atlikti civilinių kapinių tvoros, Vilniaus g. 19A, Kretinga, remonto darbus už šią paskaičiuotą kainą be PVM 18532,38 Eur PVM – 3891,80 Eur, **bendra kaina su PVM - 22424,18 Eur** (Dvidešim du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt keturi Eur 18ct)

(suma žodžiais)

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo



statybų ir statybos

Įmonės kodas 300638988, PVM kodas LT100003033418 Tel/fax.8(445)77698; mob.tel. +37061426732
DnB NORD bankas a/s LT064010041800490412 Kretingos skyrius b/k 40100
Adresas: Klapėdos g. 127s, Kretinga LT-97156; arkosta@gmail.com
www.arkosta.lt

kainą.

Taip pat, patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visą, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.		
2.		

/Pastaba. Pildoma tuomet, jei bus pateikiama konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visus pasiūlymus yra konfidencialus./

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinė sąmata	1
2.	Įmonės atestato kopija	1

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. d.

* Pasiūlymas galioja jame teikėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau, nei 120 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

Direktorius

Mindaugas Paulauskas

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

erinta: _____ Eur.

Tvrtinu: 22424 _____ Eur.

6 m. _____ mėn. d.

2016 m. 08 _____ mėn. 12 d.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Atlinų grupė 348 CIVILINIŲ KAPINIŲ TVOROS REMONTAS KRETINGOJE

Atinys 1

Išrašas 1

2016.08.12

Suma žiniaraščiui 22424,18 EUR

n.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	4,24	302,4163	1282,25
2	N6-22	Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų	m3	15,84	559,7146	8865,88
3	F1-1-4	Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, perstumliant, palaistant ir sutankinant gruntą	100 m3	0,45	5313,3242	2391,0
4	F8-1-1	Lauko akmenų mūras	m3	8,0	295,5128	2364,1
5	N1P-1105	Betoninių kepurų įrengimas	100m	0,67	4077,576	2731,98
6	N7P-0806	Šums voljero aptvėrimo išardymas ir įrengimas	m	11,2	41,0963	460,28
7	N27P-27-2	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0,28	295,0405	82,61
8	R61P-0107	Prie grindų remontas, atstatant dangą, kai dangą betoninių trinkelų (be trinkelų kainos)	m2	28,0	12,6528	354,28
		Skyriuje 1				18532,38
		Žiniaraštyje 1				18532,38
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3891,8
		Iš viso žiniaraštyje 1				22424,18



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras. Įmonės kodas 110068926. Linkmenų g. 28, LT-05217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.5224

UAB "Arkosta"

Įmonės kodas: 300638988

Klaipėdos g. 127s, LT-97195 Kretinga

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai.

Kopija tikra

2016-08-12

Direktorius




Robertas Encius

Išduotas 2014 m. birželio 26 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. kovo 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

01291

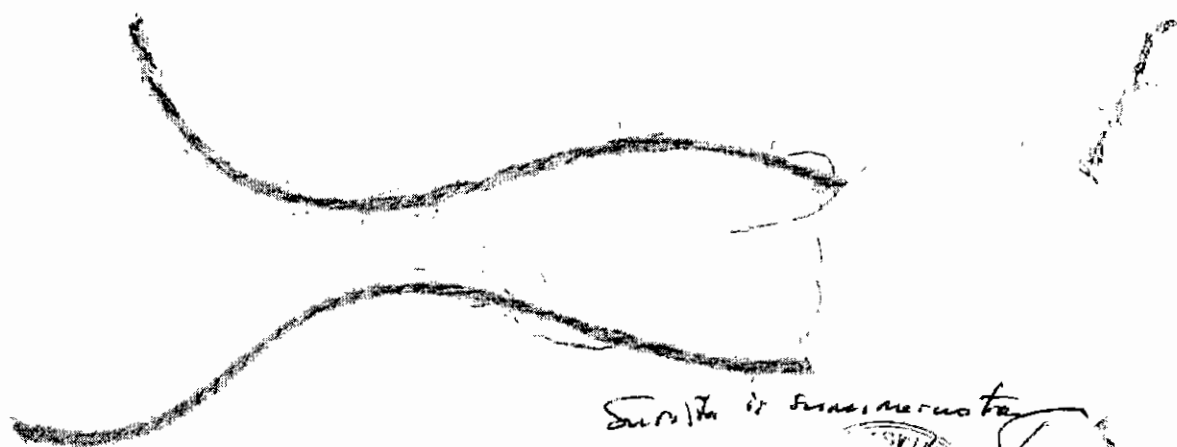

Surin & Surin



4/1/1961
