

RANGOS SUTARTIS Nr. 176433

2016 m. rugsėjo 16d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Alvora“ atstovaujama Nikolaj Kolesnik, toliau vadinama Rangovu, kartu vadinamos **Šalys**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**, remdamiesi 2016-07-04 Viešųjų pirkimo komisijos protokolu Nr. 160704/1 patvirtintomis magistralinio dujotiekio į Kaliningradą atkarpos po geležinkeliu Vilnius-Kaunas perklojimo darbų pirkimo supaprastintų skelbiamų derybų būdu (pirkimo Nr. 160704/1) sąlygomis (toliau – **Pirkimo sąlygos**), Rangovo pateiktu galutiniu pasiūlymu (toliau – **Pasiūlymas**) ir rezultatais, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutarį).

1. Sutarties objektas:

1.1. Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą atkarpos po geležinkeliu Vilnius-Kaunas (toliau – **Objektas**) perklojimo darbai ir su jais susijusios paslaugos, atliekami pagal techninį darbo projektą (toliau – **Projektas**), kuriuos Sutarties vykdymo eigoje rengia Rangovas arba jo pasirinktas subrangovas, turintis atestatą projektuoti magistralinius dujotiekius, taip pat pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Pirkimo sąlygose įtvirtintas darbų apimtis ir atlikimo sąlygas, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra būtini siekiamam rezultatui pasiekti (toliau – **Darbai**). Darbų apimtys ir atlikimo sąlygos yra pateiktos šioje Sutartyje, jos priede B (pridedama) ir Pirkimo sąlygose.

1.2. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina ir mokėjimo tvarka:

2.1. Sutarties Objekto kaina yra 134.000,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai eurų 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir PVM (toliau – **Kaina**). PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais. Taikomas sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojantis PVM tarifas.

2.2. Atskirai pagal Sutarties objekto dedamąsias kainas yra išdėstytos šios Sutarties priede A.

2.3. Darbų priėmimas – perdavimas fiksuojamas Šalims pasirašant atliktų Darbų aktą.

2.4. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui Šalims pasirašant atliktų Darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas atlieka mokėjimą Rangovui pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo atliktų Darbų akto pasirašymo, Sutarties 6.7 punkte nurodytos techninės dokumentacijos pateikimo ir sąskaitos gavimo dienos.

2.5. Pasirašytas atliktų Darbų aktas ir PVM sąskaitos faktūra turi būti pristatyti Užsakovui į Eksploatavimo departamentą (Gudelių g. 49, Vilnius) ne vėliau, kaip 1-ją po ataskaitinio mėnesio darbo dieną.

2.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus Darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Užsakovo nurodytų Darbų trūkumų arba pažeidė dujotiekį bei įrenginius ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą ar kitaip pažeidė šios Sutarties sąlygas bei šių pažeidimų nepašalina.

2.7. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami *eurais* bankiniu pavedimu į Rangovo nurodytą Rangovo sąskaitą.

2.8. Draudžiama didinti Darbų kainą per visą Sutarties galiojimo laiką ir keisti esmines supaprastintų skelbiamų derybų metu nustatytas sudarytos Sutarties sąlygas, išskyrus kainų pasikeitimą dėl pasikeitusio PVM.

3. Darbų atlikimo trukmė ir jų eiga:

3.1. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus šiai Sutarčiai ir užbaigia ne vėliau, kaip iki 2016 m. spalio 30 d., o pagalbinius darbus (gerovės sutvarkymą, dokumentacijos parengimą) - ne vėliau, nei iki 2016 m. lapkričio 30 d.

3.2. Darbai atliekami vadovaujantis Darbų vykdymo darbų atlikimo grafiku, kurį Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo. Šalys susitaria, kad esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, Darbų vykdymo grafikas gali būti keičiamas raštu sudarytu susitarimu pagal motyvuotą Rangovo pasiūlymą, jeigu tai nekeičia galutinio Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 3.1 punkte. Darbų vykdymo grafiką būtina patikslinti, jeigu Darbų atlikimo terminai pratęsimi Sutarties 3.3 punkte nustatytais atvejais, kartu su tokio pratęsimo įforminimu Šalių raštišku susitarimu. Sutarties pasirašymo.

3.3. Sutarties 3.1 punkte nurodytas galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsimas esant šioms aplinkybėms:

3.3.1. užsitęsios (trunkančios ilgiau nei 14 dienų) nepalankios oro sąlygos, dėl kurių neįmanoma vykdyti Darbų – intensyvios liūtys, potvyniai, tirštas rūkas, škvaliniai vėjai, gausus sniegas, pūga ar pan. Ši galimybė taikoma tik Darbams, kurių atlikimo kokybė ir atlikimas priklauso nuo gamtinių sąlygų;

3.3.2. nepravažiuojami ar sunkiai pravažiuojami (reikalinga speciali technika) privažiavimo prie inžinerinių statinių keliai;

3.3.3. Užsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant Užsakovo vėlavimą deleguoti specialistus, atsakingus už Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, statybietės neperdavimą Rangovui, Sutarties 4.2.3 punkte nurodyto sutikimo ar kitų Darbų vykdymui būtinų sutikimų, už kurių išdavimą yra atsakingas Užsakovas, neišdavimas, kitų Užsakovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;

3.3.4. matavimo prietaisų, Darbams reikalingos įrangos nepataisomi gedimai, kiek šie gedimai turi esminės įtakos Darbų atlikimui;

3.3.5. bet kurios valstybės ar savivaldybės institucijos jai priskirtinų funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą) terminą.

3.4. Rangovas, prašydamas galutinio Darbų įvykdymo termino pratęsimo pagal 3.3 punktą, privalo pagrįsti atitinkamų sąlygų egzistavimą ir jų įtaką Darbų atlikimo terminams. Sutarties 3.1 punkte nurodytas terminas gali būti pratęstas tik tokiam laikui, kol egzistuoja Sutarties 3.3 punkte nurodytos aplinkybės. Dėl termino pratęsimo Šalys sudaro papildomą susitarimą raštu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.5. Užsakovas turi Darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus Sutartyje numatytų Darbų atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu.

3.3. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teisę raštu pareikšti savo abejones per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 7 darbo dienos.

4. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai:

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus išduoti raštišką sutikimą atlikti darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje.

4.1.2. Priimti Rangovo faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal šios Sutarties 2.4 punkte nurodytą mokėjimo tvarką. Darbus priimti pasirašant atliktų Darbų aktą 5 darbo dienų laikotarpyje nuo jo gavimo. Nustačius Darbų trūkumus, nurodyti juos atliktų Darbų akte bei nustatyti terminus trūkumams pašalinti.

4.1.3. Vykdyti Darbų techninę priežiūrą.

4.1.4. Įsigaliojus Sutarčiai, raštu pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą.

4.2. Rangovas įsipareigoja:

4.2.1. Darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis šia Sutartimi, Pirkimo sąlygomis, Pasiūlymu, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

- 4.2.1. Darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis šia Sutartimi, Pirkimo sąlygomis, Pasiūlymu, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
- 4.2.2. Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui.
- 4.2.3. Prieš pradėdant Darbų atlikimą - gauti AB „Amber Grid“ Eksploatavimo departamento raštišką sutikimą dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje iki šių darbų atlikimo pradžios ir neatlikti jokių darbų veikiančio magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje be šio sutikimo (informacija apie reikalingus dokumentus sutikimui vykdyti darbus pateikta AB „Amber Grid“ internetiniame puslapyje www.ambergrid.lt). Užsakovo išduotas sutikimas turi galioti visu šių darbų atlikimo metu. Rangovas privalo užtikrinti, kad šį sutikimą gautų ir visi darbus veikiančio dujotiekio apsaugos zonoje vykdantys subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu šiems darbams šios Sutarties apimtyje.
- 4.2.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje teisės aktais atlikti paruošiamuosius ir laikinus darbus, parinkti saugius bei optimalius darbų atlikimo metodus.
- 4.2.5. Įsigaliojus sutarčiai, raštu pranešti Užsakovui darbų vadovo pavardę, adresą ir telefono numerį.
- 4.2.6. Atsakyti ir padengti visus Užsakovo patirtus nuostolius už sutrikdytą magistralinio dujotiekio darbą ir jo pažeidimus, taip pat magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimus, jei jie padaryti dėl Rangovo kaltės ar kitokio šios sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
- 4.2.7. Darbų metu užtikrinti patekimą ir, jei taikoma, privažiavimą į žemės savininkų / valdytojų sklypus, tol, kol įprastą patekimą ar privažiavimą apsunkina vykdomi Darbai.
- 4.2.8. Atlikti žemės rekultivavimo ir atsakymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas melioracijos, drenažo ir kitas inžinerines sistemas.
- 4.2.9. Savo lėšomis išmokėti kompensacijas žemės savininkams ir/ar naudotojams už Darbų vykdymo metu padarytą žalą ir pateikti Užsakovui pažymas apie tai, kad žemės savininkai ir/ar naudotojai pretenzijų neturi. Užsakovas neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas gavo ir Užsakovui pateikė visų žemės savininkų ir/ar naudotojų pažymas, patvirtinančias, jog jie pretenzijų neturi. Rangovas privalo savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą ištaisyti šiame punkte nustatytų Darbų trūkumus, neatsižvelgiant į tai, kad Užsakovas Darbus priėmė Rangovui neįvykdžius ar tik iš dalies įvykdžius šiame punkte įtvirtintą pareigą. Neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs šiame punkte įtvirtintą pareigą Rangovas veikia išimtinai tik savo riziką.
- 4.2.10. Atsakyti ir savo lėšomis padengti nuostolius žemės savininkams/valdytojams ar trečiosioms šalims, jei pažeistos jų teisės ar interesai dėl Rangovo kaltės ar kitokio šios sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, bei atlyginti Užsakovui visus jo patirtus nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl Rangovo netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų (įskaitant, bet neapsiribojant, Sutartyje nurodytų terminų praleidimą).
- 4.2.11. Visiškai atsakyti už savo ir subrangovų darbuotojų saugą ir sveikatą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visu Darbų vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų Rangovo, subrangovų bei Užsakovo darbuotojų saugumą, bei bendradarbiaujant su vietinėmis sveikatos apsaugos institucijomis ir laikydamasis jų reikalavimų užtikrinti, kad bet kuriuo sutarties vykdymo metu darbų atlikimo vietoje būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai pagalbai suteikti. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį darbus atliktų kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojančius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, darbuotojai.
- 4.2.12. Užtikrinti statybvietyje gaisrinę apsaugą, aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi, tinkamą atliekų laikymą, išvežimą ir utilizavimą bei visų kitų taikytinų reikalavimų laikymąsi.
- 4.2.13. Gauti visus Darbų vykdymui reikalingus leidimus ir sutikimus.
- 4.2.14. Įsigyti statybos darbų žurnalą ir užtikrinti, kad jis būtų kasdien tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovo atstovams tikrinti statybos darbų žurnalą.
- 4.2.15. Atliekant Darbus, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant:

- (i) Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.1-12;
- (ii) Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128;
- (iii) Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1-213, ir kt.
- 4.2.16. Nekokybiškai atliktus Darbus perdaryti savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą.
- 4.2.17. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Darbus atliktų kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojančius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys. Paraiškoje ir/ar Pasiūlyme nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti kitais specialistais tik dėl objektyvių priežasčių (specialisto mirtis, liga, darbo santykių su Rangovu ar jo subrangovu nutraukimas ir pan.), ne žemesnės kvalifikacijos ir patirties nei keičiamas, specialistus, taip pat turi teisę pasitelkti naujus specialistus, ir tik šioje Sutartyje nustatyta tvarka gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą tokiame pakeitimui.
- 4.2.18. Bet kuriuo metu vykdyti reikalavimus, kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, suteikti galimybę juos išdavusioms institucijoms kontroliuoti ir tikrinti darbus.
- 4.2.19. Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinką ir žmonių saugą pažeidžiančius incidentus.
- 4.2.20. Užbaigus Darbus ne vėliau kaip 7 dienų laikotarpyje raštu pranešti Užsakovui apie Darbų atlikimo pabaigą.
- 4.2.21. Priduoti Sutartyje numatytas Darbus Užsakovui pagal jo nustatytą tvarką ir reikalavimus.
- 4.2.22. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, prižiūrinčiomis statybos darbų vykdymo procesus, dalyvauti šių institucijų atliekamuose tikrinimuose ir savo sąskaita ištaisyti tikrinimų metu nustatytus trūkumus.
- 4.2.23. Suteikti Užsakovo atstovams, Darbų techniniams prižiūrėtojams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietsės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas, darbo eigą ir kokybę, taip pat Darbų atlikimo metu ar juos atlikus per Užsakovo nurodytą protingą terminą teikti bet kokią Užsakovo teisėtai prašomą informaciją ir dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus Darbus (jų dalį) bei atlyginti visą Užsakovo žalą, kurią jis patyrė dėl to, kad Rangovas nepateikė, atsisakė pateikti, pateikė netinkamą informaciją ir/ar dokumentus.
- 4.2.24. Baigus Darbus sutvarkyti aplinką bei tinkamai sutvirtinti geležinkelio sankasą.
- 4.2.25. Visiškai atsakyti už subrangovinę veiklą.
- 4.2.26. Prievolių pagal šią Sutartį įvykdymui užtikrinti Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui priimtina bei su Užsakovu suderintomis sąlygomis pasirašytą besąlyginę neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo kompanijos laidavimą. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties užtikrinimo laidavimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo raštu turi pateikti ir draudimo liudijimo bei mokestinio pavedimo kopijas, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo raštą yra sumokėta. Garantijos dydis – ne mažiau kaip 10 (dešimt) procentų Kainos. Jeigu Rangovas nepateikia garantijos šiame punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis, yra laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti šią Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kviešti sudaryti Sutartį kitą tiekėją ir gali pasinaudoti Rangovo pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pateiktu pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, taip pat pareikalauti Rangovo atlyginti dėl Sutarties neįsigaliojimo patirtus nuostolius, įskaitant naujo Sutartį pasirašyti kviečiamo tiekėjo ir Rangovo pasiūlytų kainų skirtumą, kiek tokių nuostolių nepadengia Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Garantija tokiomis pačiomis arba neblogesnėmis negu tos, kurios nustatytos šiame punkte, sąlygomis turi galioti nuo Sutarties pasirašymo iki galutinio Darbų užbaigimo akto pasirašymo. Jeigu ši garantija pasibaigs anksčiau ar dėl bet kokių priežasčių taps neatitinkančia šiame punkte nustatytų sąlygų, Rangovas ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki garantinio rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šią garantiją bei

pateikti ją Užsakovui. Jei Užsakovas pasinaudoja garantija, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantiją. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis Rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdymo. Nepateikus laiku naujos garantijos, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 0,1 procento nuo Kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki prievolės įvykdymo dienos.

Garantija turi būti garantuojama, kad Rangovas:

- 4.2.26.1. atliks Darbus pagal šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus;
- 4.2.26.2. atliks Darbus nepažeisdamas šioje Sutartyje nustatytų terminų;
- 4.2.26.3. neteisėtai neatsisakys vykdyti arba tęsti jau pradėtų Darbų pagal šią Sutartį;
- 4.2.26.4. sumokės Sutartyje numatytas netesybas bei pagal šios Sutarties nuostatas atlygins visus Užsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, neturtinę žalą dėl netinkamo Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo arba jų nevykdymo;
- 4.2.26.5. šiame punkte nustatytais terminais sudarys naują Sutarties įvykdymo garantiją, jei garantija pasibaigtų anksčiau nei numatyta šiame punkte.

5. Garantijos ir atsakomybė:

5.1. Rangovas garantuoja, kad atliktų Darbų aktų pasirašymo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutarties 1 punkte išdėstytus reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

5.2. Darbai, atlikti su trūkumais, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmesti Užsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostatų, turi būti perdirbami Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą. Jei minėtas terminas viršija šios Sutarties 3 punkte nustatytus terminus, tai Rangovas moka Užsakovui šios Sutarties 7.5 punkte nustatytus delspinigius.

5.3. Jei Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytų Sutarties 5.2 punkte, per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar Šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti bet koki mokėjimą Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

5.4. Rangovas Objekto statybos darbams suteikia 5 metų (*jeigu Pasiūlyme nenurodyta kitaip*), paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) – 10 metų (*jeigu Pasiūlyme nenurodyta kitaip*), tyčia paslėptiems Objekto defektams – 20 metų (*jeigu Pasiūlyme nenurodyta kitaip*) garantiją, Darbų atlikimui Rangovo panaudotoms medžiagoms ir įrangai – 5 metų garantiją (*jeigu Pasiūlyme nenurodyta kitaip*). Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo dienos.

5.5. Jei kokia nors Objekto dalis negali būti naudojama pagal paskirtį dėl Darbų trūkumų, garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratęsimi.

5.6. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darbų gedimus ir trūkumus pašalinti per Užsakovo nustatytą protingą terminą ir atlyginti visus dėl tokių gedimų ar trūkumų Užsakovo patirtus nuostolius.

5.7. Garantiniu laikotarpiu nustatęs Darbų gedimus ir trūkumus, Užsakovas turi teisę reikalauti:

- (i) neatlygintinai pašalinti gedimus ir trūkumus per protingą terminą;
 - (ii) atitinkamai sumažinti Darbų kainą;
 - (iii) atlyginti gedimų ir trūkumų šalinimo išlaidas;
 - (iv) jeigu Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.
- 5.8. Rangovas sutinka su Sutarties Objekto kaina ir už ją įsipareigoja įvykdyti visus šios Sutarties 1 punkte nustatytus Darbus, taip pat kitus papildomus darbus, kurių būtinybė išaiškėjo Sutarties vykdymo eigoje.

5.9. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, taip pat, kad darbai neareštuoti ir kad jie nėra teismo ginčo objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja, kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Užsakovo nuosavybės teisei į perduodamus Darbus.

5.10. Rangovui pažeidus šios Sutarties 5.98. punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties objekto kainą, sustabdyti mokėjimą Rangovui pagal šią Sutartį ir/arba nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės.

5.11. Rangovas apmoka už visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iškvietimus, vertimus ir kt., kurių gali reikalauti bet kuri trečioji šalis bet kuriai darbų daliai patikrinti, bei pateikia visus pranešimus, įsipareigojimus, garantijas ar užstatus, reikalingus gauti leidimą darbų atlikimui ar panašiai.

5.12. Rangovas garantuoja, kad Darbų rezultate sukurtas bet koks autorinių teisių produktas negali būti, nėra ir nebus apsunkintas jokiais Rangovo ar trečiųjų asmenų turinėmis teisėmis, reikalavimais ar pretenzijomis į juos. Tokios autorinės teisės įeina į Kainą ir yra laikomos perleistomis Užsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatšaukiamai ir besąlygiškai nuo Užsakovo sumokėjimo Rangovui už Darbų dalį, kurios rezultate atsirado bet koks autorinių teisių produktas, nuo Užsakovo Darbų priėmimo dienos. Rangovas įsipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius Užsakovo nuostolius, patirtus dėl Rangovo įsipareigojimų pagal šį punktą nesilaikymo.

6. Įranga, medžiagos, darbų kokybė ir statybos techninė dokumentacija:

6.1. Darbuose naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti, naujausio arba šiuo metu naudojamo pavyzdžio ir iš patobulintų medžiagų, jei projekto specifikacijose ir brėžiniuose nenurodyta kitaip.

6.2. Rangovas Darbams atlikti naudoja medžiagas, gaminius ir įrenginius pagal su Užsakovu suderintus reikalavimus techninėms charakteristikoms.

6.3. Jei Rangovas naudoja su Užsakovu nesuderintas medžiagas, gaminius ir įrangą, ir jų techniniai duomenys netenkina projekto techninių specifikacijų Užsakovo, techninis priežiūrėtojas ar Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovą juos pakeisti tinkamais Rangovo sąskaita.

6.4. Sumontuotos dujotiekio dalys turi būti pažymėti tinkamais identifikaciniais ženklais ir nudažytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvus.

6.5. Rangovas užtikrina, kad darbų kokybė atitiks tokios rūšies darbams taikomus reikalavimus.

6.6. Rangovas sutinka, kad netinkama Darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami perdavimo-priėmimo aktuose arba Rangovo rašytiniais nurodymais.

6.7. Prieš surašant Darbų užbaigimo aktą, Rangovas turi pateikti Užsakovui popieriuje (1 egz.) šią techninę dokumentaciją:

- techninius ir naudojimo duomenis;
- tikrinimų, bandymų rezultatų protokolus ir dokumentus;
- sertifikatus;
- technines specifikacijas ir parašais bei kitus reikalingus dokumentus (pateikiama dokumentacija turi būti sukomplektuota byloje ir sutvarkyta pagal turinį, o visos naudojimo instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba).

7. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:

7.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant raštu pranešti apie tai kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

7.2. Vienai iš Šalių daugiau kaip 10 kalendorinių dienų laikotarpyje nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, antroji Šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą.

7.3. Jei Rangovas vėluoja įvykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus iki Sutartyje numatytų terminų, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių,

numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną. Rangovas privalo mokėti Užsakovui 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną iki prievolės įvykdymo dienos. Nesant galimybių nustatyti neįvykdytų įsipareigojimų vertę, delspinigių dydis atitinkamai nustatomas po 50 (penkiasdešimt) Eur dienai.

7.4. Atsiskaitant, priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigių) suma bus mažinama Rangovo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma.

7.5. Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

7.6. Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos, darbų saugos, sveikatos saugos, dujų ūkio, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi tenka Rangovui.

7.7. Rangovas yra atsakingas už savo ir Užsakovo turto saugumą, įskaitant darbuotojų, darbo priemonių, įrenginių, mechanizmų ir trečiųjų asmenų nuosavybės saugumą.

7.8. Jeigu Rangovas ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų (jų darbuotojai) atlieka Darbus neturėdamas tam reikalingos kvalifikacijos, arba jei Rangovas ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų atliekant Darbus neturėjo 4.2.3 punkte nurodyto Užsakovo sutikimo (jo negavus, pasibaigus sutikimo galiojimui, Užsakovui panaikinus ar sustabdžius sutikimo galiojimą ar pan.), ar jeigu Užsakovas panaikina ar sustabdo minimame punkte nurodyto sutikimo galiojimą dėl to, kad Rangovas ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų nesilaikė sutikime nurodytų sąlygų (Darbus atliko nekvalifikuoti, išduotame sutikime nenurodyti darbuotojai, Darbus atliekantys darbuotojai nedėvėjo asmeninių apsaugos priemonių ir pan.), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 500 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatyta bauda yra laikoma iš anksto aptartais minimaliais Užsakovo nuostoliais ir yra proporcinga pažeidimams.

7.9. Jei Rangovas vykdydamas Darbus, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliami bankroto byla, ar jei Užsakovas dėl nesilaikymo darbų atlikimo grafiko turi pagrindo manyti, kad Rangovas negalės užbaigti darbų Sutartyje nustatytu laiku, Užsakovas gali, prieš keturiasdešimt aštuonias (48) valandas raštiškai pranešęs Rangovui, nutraukti jo teises tęsti darbus ar jų dalį arba nutraukti šią Sutartį, sustabdyti mokėjimą už darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

7.8. Užsakovui turi būti iš anksto pranešta raštu ir su juo suderinti Darbai, kurių vykdymui Rangovas sudarys subrangos sutartis. Rangovo pasiūlyme nurodyti šie subrangovai: UAB „Ardynas“, UAB „GEO9“, UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“, UAB „Elektromontuotojas“, UAB „METESTA“, UAB „Dekra Industrial“, VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, UAB „Tomida“, UAB „Šakių hidrotechnika“. Jeigu Darbams vykdyti pasitelkiami subrangovai, subtiekJai ar subtiekJai, pagrindinius darbus privalo vykdyti pats Rangovas. **Pagrindiniai darbai: magistralinio dujotiekio į Kaliningradą atkarpos po geležinkelio Vilnius-Kaunas perklojimo (dujotiekio demontavimas-sumontavimas, bandymas, virinimas, prijungimas prie veikiančio dujotiekio) darbai.** Jei nustatoma, kad pagrindinius darbus atlieka ne pats Rangovas, tai laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir Užsakovas, prieš 7 (septynias) dienas pranešęs raštu, turi teisę nutraukti Sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, sustabdyti mokėjimą pagal šią Sutartį ir reikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius dėl Sutarties nutraukimo. Pasitelkti kitus subrangovus, arba pakeisti šioje Sutartyje nurodytą subrangovą kitu, Rangovas gali tik kai to reikia dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip: netinkamas subrangovo Darbų vykdymas, dėl ko Rangovui sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali būti pritaikyta atsakomybė; atsisakymas vykdyti subrangovo įsipareigojimus, susijusius su Darbų vykdymu, arba netinkamas jų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus dėl Darbų kokybės ir/ar atlikimo terminų; subrangovo nemokumas, bankrotas ar restruktūrizacija; pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams; siekiant išvengti Sutarties pratęsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (*jeigu tokia galimybė Sutartyje numatyta*), dėl valstybės ir savivaldybės institucijų reikalavimų, pateiktų Darbų vykdymo ir/ar jų pridavimo metu, ir pan. Norėdamas pakeisti esamą arba pasitelkti naują subrangovą, Rangovas privalo tam iš anksto pateikti Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius objektyvias priežastis, dėl kurių būtų būtinybė pakeisti esamą arba pasitelkti naują subrangovą, bei tai, kad norimas pasitelkti subrangovas atitinka Sąlygose ir sutartyje jam

keliamus reikalavimus, bei gauti Užsakovo sutikimą. Užsakovui davus sutikimą subrangovų papildymui ar pakeitimui, toks papildymas ar pakeitimas įforminamas šalių raštišku susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi. Jei Rangovas pasamdo subrangovą nesilaikydamas šioje Sutartyje nustatytos tvarkos, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu subrangovu ir Užsakovui sumokėti 500 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus šiame punkte įtvirtintos subrangovų papildymo ar pakeitimo procedūros.

7.9. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

7.10. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, prieš 14 dienų raštiškai įspėjęs Rangovą, atsisakyti Sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už iki pranešimo dėl Sutarties nutraukimo dienos atliktą darbo dalį ir atlygindamas tiesioginius ir pagrįstus nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo.

7.11. Jei Darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

7.12. Šalys susitaria, kad jei Sutartis vienašališkai Užsakovo nutraukiama dėl Rangovo kaltės, ar dėl Rangovo padaryto esminio šios Sutarties pažeidimo, ar dėl bet kokių aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas, Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio baudą ir atlygina visus nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda. Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatyta bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais dėl Sutarties nutraukimo.

8. Nenugalima jėga:

8.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

8.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus sutartį, šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

9. Bendrosios sąlygos:

9.1. Ši Sutartis įsigalioja, kai Šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais bei kai Rangovas pateikia šioje Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visų Šalių visų šia Sutartimi priimtų įsipareigojimų įvykdymo.

9.2. Visi vykdant šią sutartį Užsakovo Rangovui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip pat šios Sutarties pagrindu Rangovo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra konfidencialūs (toliau – konfidenciali informacija). Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja laikyti konfidencialią informaciją paslaptyste ir be išankstinio rašytinio atitinkamo Užsakovo sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims jokia forma ir būdu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus privalomo informacijos teikimo atvejus. Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja nenaudoti konfidencialios informacijos bet koku būdu,

dėl kurio Užsakovas gali būti padaryta žala / atsirasti nuostolių. Šiame punkte įtvirtintos pareigos Rangovas privalo laikytis 5 metus, pradedamus skaičiuoti nuo Darbų perdavimo Užsakovui dienos.

9.3. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų Šalių pasirašyti.

9.4. Šalys susitaria ir patvirtina, kad vykdydamos šią Sutartį bendradarbiaus lietuvių kalba. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Užsakovui būtų lietuvių kalba, o komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas.

9.5. Iškilusius nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

9.6. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuvių kalba bei saugoma ją pasirašiusių šalių.

9.7. Užsakovas turi teisę perleisti visas iš šios Sutarties kylančias teises ir pareigas be atskiros kitos Šalies sutikimo, informuodamas kitą Šalį apie perleidimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokio perleidimo dienos.

10. Sutarties priedai:

10.1. Priedas A. Sutarties kainų dedamosios, 2 lapai.

10.2. Priedas B. Techninė specifikacija, 3 lapai.

11. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

11.1. Užsakovo: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras.

Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

11.2. Rangovo: Visorių g. 33, LT-08300 Vilnius, tel. +370 5 2700718, faks. +370 5 2700717, el. p. info@alvora.lt, www.alvora.lt, įmonės kodas 122049143, PVM mokėtojo kodas LT220491413, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras.

Užsakovas

AB „Amber Grid“

Technikos direktorius
Andrius Dagys

Rangovas

UAB „Alvora“

Generalinis direktorius
Nikolaj Kolesnik

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO Į KALININGRADĄ ATKARPOS PO GELEŽINKELIU VILNIUS-KAUNAS PERKLOJIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą atkarpos po geležinkeliu Vilnius-Kaunas perklojimo darbus Rangovas atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, „Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėmis“, „Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės“, statybos techniniais reglamentais, dujų ūkio priežiūros, statybos, melioracijos nuostatomis ir kitais teisės aktų reikalavimais.

Perklojimo darbų (ir su jais susijusių paslaugų) apimtys yra šios:

Rangovas privalo parengti techninį darbo projektą ir su Užsakovu suderinti techninius sprendinius ir darbų vykdymo grafiką.

Užsakovas nepateikia jokių medžiagų perklojimo darbams vykdyti visas medžiagas privalo įsigyti Rangovas.

Numatomas remonto darbams Rangovui reikalingas įsigyti medžiagų kiekis:

Eil.	Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos	Mato	Kiekis
1. MEDŽIAGOS			
1.1.	Plieniniai vamzdžiai $\varnothing 720 \times 8,0$ mm, $P_{\text{darb.}} = 54$ bar, $P_{\text{gamykl.}} \geq 82,5$ bar, izoliuoti polimerine izoliacija	m	72,0
1.2.	Centravimo žiedai DN720	kompl.	17
1.3.	Dėklo galų sandarinimo medžiagos	kompl.	2
1.4.	Kontrolės matavimo kolonėlės	kompl.	2
1.5.	Izoliacinė danga pagal LST EN 12068 ne žemesnės kaip B-30 klasės suvirinimo vietoms izoliuoti	kompl.	7
1.6.	Plieninis vamzdis dėklui $\varnothing 1020 \times 14,0$, neizoliuotas	m	5,0

Remonto darbus sudaro:

- Rangovas privalo parengti techninį darbo projektą bei gauti visus reikalingus leidimus darbams vykdyti.
- Parengti sutarčių projektus su žemių savininkais (ar asmenimis, disponuojančiais žeme) dėl žemės laikino naudojimo dujotiekio atkarpoje darbų metu, pasirašyti sutartis ir išmokėti kompensacijas žemės savininkams už patirtus nuostolius, pateikiant tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui.
- Rangovas, laimėjęs konkursą, privalo glaudžiai bendradarbiauti ir susiderinti su Užsakovu visus veiksmus bei darbų atlikimo grafiką. Rangovas privalo iki dujotiekio atkarpos atjungimo būti pilnai pasiruošęs, t.y. gavęs visą būtiną įrangą, suvirinęs, išbandęs, atlikęs žemės ir kitus paruošiamuosius darbus.**
- Likutinių dujų pašalinimo iš remontuojamo vamzdžio po dujų išleidimo darbus, prižiūrint Užsakovo specialistams (dujų išleidimo iki 0 bar operaciją iš dujotiekio prieš vykdant darbus atliks Užsakovas), bei dujotiekio vamzdžio atjungimo ir prijungimo prie esamo veikiančio dujotiekio darbai atliekami Rangovo jėgomis.
- Bendrastatybiniai darbai atliekami Rangovo arba jo pasitelktų subrangovų jėgomis.
- Defektuoto dėklo galo demontavimas ir naujo dėklo galo įrengimas atliekamas Rangovo arba jo pasitelktų subrangovų jėgomis.
- Augalinio dirvožemio sluoksnio nustūmimo (nesumaišant dirvožemio sluoksnių) ir sandėliavimo darbai atliekami Rangovo arba jo pasitelktų subrangovų jėgomis.
- Žemės iš tranšėjų kasimo ir sandėliavimo darbai atliekami Rangovo arba jo pasitelktų subrangovų jėgomis.
- Suvirinimo siūlių švietimas, kontrolė ir izoliavimo darbai atliekami Rangovo arba jo pasitelktų subrangovų jėgomis.
- Rangovo suvirintų siūlių kokybės tikrinimo negali vykdyti jam pavaldi laboratorija, t.y. siūlių švietimą, tikrinimą gali atlikti tik Rangovui nuosavybės teise nepriklausanti laboratorija.

11. Dėl nustatytų defektų suvirinimo siūlė negali būti taisoma daugiau kaip du kartus. Tokia siūlė privalo būti išpjauta ir suvirinta iš naujo. Užsakovui nustačius, kad siūlė buvo taisyta daugiau kaip 2 kartus, suvirintojų grandis, virinusi tą siūlę privalo būti nušalinta nuo suvirinimo darbų, visam remonto darbų laikotarpiui. Rangovas privalo užtikrinti, kad nušalinti suvirintojai nebetęstų suvirinimo darbų ir pasitelkti kitus suvirintojus, turinčius reikiamą kvalifikaciją.
12. Antžemines naujai sumontuotas dujotiekio dalis nudažyti geltona spalva. Antžeminis dujotiekis nuo atmosferinės korozijos turi būti apsaugotas aukšto patvarumo lygio danga, atitinkančia LST EN ISO 12944-1 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 1 dalis. Bendras įvadas“ reikalavimus. Dangos storis turi būti ne mažesnis kaip 0,28 mm, spalva – RAL 1021 (geltona).
13. Izoliavimo darbai atliekami pagal iš anksto su AB „Amber Grid“ Dujotiekių saugos nuo korozijos tarnyba suderintomis izoliavimo darbų instrukcijomis naudojant suderintas izoliacines medžiagas pagal LST EN 12068.
14. Suvirintų ir izoliuotų vamzdynų užpylimo žemėmis darbai atliekami Rangovo arba jo pasitelktų subrangovų jėgomis.
15. Hidrauliniai bandymai atliekami Rangovo jėgomis ir medžiagomis.
16. Aplinkos tvarkymo darbai, dujotiekio trasos ženklėjimas atliekamas Rangovo arba jo pasitelktų subrangovų jėgomis.
17. Paskleidžiant augalinį dirvožemio sluoksnį būtina nesumaišyti su kitais dirvožemio sluoksniais.
18. Laikinių privažiavimo kelių įrengimas ir dujotiekio remonto darbų metu pažeistų privažiavimo kelių atstatymas atliekamas Rangovo arba jo pasitelktų subrangovų jėgomis.
19. Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo nufotografuoti ir užfiksuoti esamą privažiavimo kelių, kuriais statybos metu planuojama, kad važinės Rangovo transportas, būklę.
20. Laikinus privažiavimus įrengti suderinus su sklypų savininkais, užtikrinant jiems galimybę privažiuoti prie sklypo dalies už iškastos tranšėjos, privažiuoti prie sodybos, praginti gyvulius.
21. Pažeistų melioracijos ir drenažo sistemų atstatymas ir už statybvietės ribų kompensacijų žemės savininkams išmokėjimas.
22. Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo nufotografuoti ir užfiksuoti esamus apsemtus, drėgnus žemės plotus, kad būtų nustatyta esamos melioracijos-drenažo sistemos būklė.
23. Elektrocheminės apsaugos ir elektros įrenginių atstatymas atliekamas Rangovo arba jo pasitelktų subrangovų jėgomis.
24. Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo dalyvauti AB „Amber Grid“ atstovams nužymint esantį magistralinį dujotiekį ir jo įrenginius, kad statybos-montavimo darbų metu nebūtų pažeistas veikiantis dujotiekis.
25. Rangovas privalo imtis visų būtinų papildomų priemonių, kad darbų metu būtų apsaugotas šalimais esantis magistralinis dujotiekis ir jo įrenginiai.
26. Rangovas privalo pilnai atsakyti ir padengti nuostolius už sutrikdytą magistralinio dujotiekio darbą ir jo pažeidimus, taip pat magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimus, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovų kaltės.
27. Mechaniniu būdu dirvos rekultivacijos darbai atliekami Rangovo arba jo pasitelktų subrangovų jėgomis.
28. Dujotiekio vamzdyno prijungimai prie esamo veikiančio dujotiekio. Prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbus gali vykdyti tik Rangovas, turintis Lietuvos Respublikos Valstybinės Energetikos inspekcijos atestatą, leidžiantį vykdyti tokius darbus.
29. Geodezinių nuotraukų atlikimas (dujotiekio išpildomosios geodezinės nuotraukos turi būti atliktos įprastu ir skaitmeniniu variantais, iš kurių pastarasis turi atitikti geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimams) arba lygiaverčio. Ne dujotiekio objektų duomenis pateikti skaitmeninėje formoje pagal InGIS specifikaciją (Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacija. II redakcija (Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija/Įsakymas/46/32/2000 04 25/Įsigalioja nuo 2000 05

04/Valstybės žinios'2000 Nr.36-1019)) ESRI Personal Geodatabase arba ESRI SHP formatu. Užsakovui pateikti skaitmenines bylas iš kurių spausdinami brėžiniai.

30. Naudotis (samdyti) įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos paslaugomis, siekiant įvertinti statinio ir jo įrenginių techninę būklę ir pateikti išvadas dėl įrenginių tinkamumo pradėti eksploatuoti.

31. Apsirūpinimas visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais. Statybos darbų žurnalas pateikiamas Užsakovo, t.y. tęsiamas esamas eksploatuojamo dujotiekio statybos darbų žurnalas. Esant poreikiui pradėti naują statybos žurnalo tomą, jo įsigijimo ir forminimo rūpinasi Rangovas.

32. Rangovas privalo užpildyti, sukomplektuoti visus privalomus dokumentus dėl darbų užbaigimo akto gavimo, Užsakovas turi tik pasirašyti parengtą prašymą.

33. Organizuoti komisijų darbą, operatyviai ištaisyti nustatytus trūkumus.

34. Komplektavimas statybos dokumentų (popierinė ir skaitmeninė versijos), įskaitant:

- * techninį darbo projektą;

- * statybos produktų sertifikatus ir atitikties deklaracijas lietuvių kalba;

- * statybos ir išpildomąją dokumentaciją;

- * prekių gamintojų gamybos kokybės užtikrinimo ISO sertifikatų kopijas, prekių kokybės sertifikatų kopijas, Ex išpildymo sertifikatus, išsamius prekių aprašymus, technines charakteristikas.

35. Rangovas turi užtikrinti racionalų vamzdžių ir kitų medžiagų ir įrangos naudojimą statybos metu.

36. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Užsakovui būtų lietuvių kalba, o komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas.


37. Atlikti visus kitus su pirkimo objektu ir su projekto įgyvendinimu susijusius darbus bei paslaugas, kurių nėra numatyta šioje techninėje specifikacijoje, bet reikalinga atlikti, siekiant užbaigti remonto darbus.

38. Dujotiekio dėklo sandarinimo darbai bei kontrolės matavimo kolonėlių įrengimas atliekami Rangovo arba jo pasitelktų subrangovų įėjomis.

39. Geležinkelio sankasos grunto tvirtinimo darbai atliekami Rangovo arba jo pasitelktų subrangovų įėjomis.

Pastaba: Jei šiose sąlygose bei prieduose yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“.

Darbo vietos lokacija:

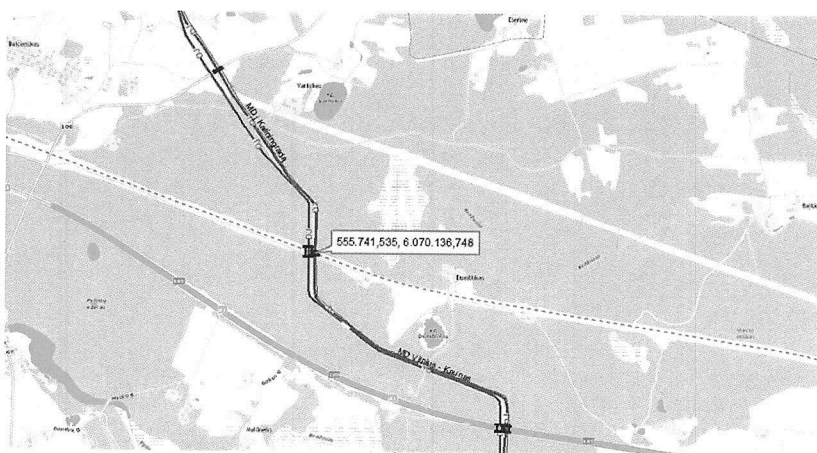

Užsakovas

AB „Amber Grid“

Rangovas

UAB „Alvora“
