

## DUJOTIEKIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS / REKONSTRAVIMO DARBŲ SUTARTIS

### SPECIALIOJI DALIS

**Sutarties sudarymo data:** 2016 m. lapkričio 16 d.

**Sutarties Nr.** 40500/562212

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama Finansų ir administravimo tarnybos direktoriaus Augusto Dragūno veikiančio pagal 2016 m. lapkričio 9 d., L. e. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 883. (toliau – Užsakovas), ir

**UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

#### 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
  - 1.2.1. Pirkimo sąlygomis 2016 m. rugsėjo 14 d.
  - 1.2.2. Rangovo 2016 m. spalio 4 d. pasiūlymu Nr. 59, bei 2016 m. spalio 17 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 60.

#### 2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo Teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(6408) Dujotiekių projektavimo paslaugas ir statybos/ rekonstravimo darbus, kurių vertė iki 50.000,00 EUR be PVM, Šiaulių regione 1 dalyje** ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

#### 3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 3.1. Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminai, kai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas:
  - 3.1.1. Dujotiekio įvadų projektavimo Paslaugai ir Darbams atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 95 kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.
  - 3.1.2. Skirstomųjų dujotiekių projektavimo Paslaugai ir Darbams atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 140 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.
- 3.2. Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminai, kai nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas:
  - 3.2.1. Dujotiekio įvadų projektavimo Paslaugai ir Darbams atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 71 kalendorinę dieną nuo Užsakymo pateikimo dienos.
  - 3.2.2. Skirstomųjų dujotiekių projektavimo Paslaugai ir Darbams atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 85 kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.
- 3.3. Vartotojų dujų sistemų įrengimo Darbus Tiekėjas atlieka per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per:
  - 3.3.1. 30 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai topografinę nuotrauką Tiekėjas turi arba ją pateikia Užsakovas.
  - 3.3.2. 45 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai Tiekėjas topografinės nuotraukos neturi ir Užsakovas negali jos pateikti ir ją reikia užsakyti papildomai.
  - 3.3.3. Vidaus dujų sistemos montavimo darbus Tiekėjas atlieka ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo informacijos iš Užsakovo gavimo dienos, kad klientas yra įsirengęs dujinį (-ius) prietaisą (-us) ir turi visą reikiamą dokumentaciją (dėl dujinių prietaisų, ventiliacijos angų, dūmtraukių įrengimo).

#### 4. SUTARTIES KAINA. ATSISKAITYMO TERMINAI

- 4.1. Bendra Sutarties kaina, įskaitant PVM – **3.025.000,00 EUR** (trys milijonai dvidešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct). Bendrą Sutarties kainą sudaro:
  - 4.1.1. Darbų kaina – 2.500.000,00 EUR (du milijonai penki šimtai tūkstančių eurų 00 ct);
  - 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis – 525.000,00 EUR (penki šimtai dvidešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct).
- 4.2. Apmokėjimo už Darbus tvarka ir terminai pateikti Sutarties BD dalyje.

#### 5. ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMAS

- 5.1. Sutarties SD priede Nr. 3 nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties SD priede Nr. 8 ir Sutarties BD nurodytomis sąlygomis.

#### 6. MEDŽIAGOS

- 6.1. Užsakovas Rangovui tiekia šias Darbams atlikti reikalingas medžiagas (esant galimybei, kitu atveju tiekia Rangovas pagal pasiūlytus įkainius (Sutarties SD priedas Nr.3): namų dujų apskaitos įtaisų (toliau - NDAI), namų dujų slėgio reguliavimo įtaisų (toliau - NDSRI), namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (toliau - NDSRAI) spintas be spintas laikančių rėmų, požeminius uždarymo įtaisus, apsauginius šulinėlius su pagrindais, dujotiekių žymėjimo ženklus, stulpelius ženklams bei dujų srauto ribotuvus (stop movas).

## 7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: **taip**.  
7.2. Sutarties garanto dydis: **5.000,00 EUR**.

## 8. SUBRANGA, JUNG TINĖ VEIKLA

- 8.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus**.  
8.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5.

## 9. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja nuo **Sutarties garanto pateikimo dienos**.  
9.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus.  
9.3. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsimas dar vieneriems metams.

## 10. PRIEDAI

- 10.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.  
10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:  
10.2.1. Priedas Nr. 1 – Projektavimo paslaugų ir statybos / rekonstravimo darbų užsakymas;  
10.2.2. Priedas Nr. 2 – Pirkimo objekto apimtys;  
10.2.3. Priedas Nr. 3 – Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai;  
10.2.4. Priedas Nr. 4 – Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas;  
10.2.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai;  
10.2.6. Priedas Nr. 6 – Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAĮ, NDSRJ, NDSRAĮ) spintelės montavimo schema;  
10.2.7. Priedas Nr. 7 – Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2);  
10.2.8. Priedas Nr. 8 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;  
10.2.9. Priedas Nr. 9 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;  
10.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija;  
10.2.11. Priedas Nr. 11 – Gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė;  
10.2.12. Priedas Nr. 12 – Pavyzdinis dujotiekių techninis darbo projektas;  
10.2.13. Priedas Nr. 13 – Preliminari dujotiekių projektavimo paslaugų ir statybos/rekonstravimo darbų sąmata.

## 11. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

**UAB „Šiaulių dujotiekių statyba“**

Direktorius  
Leonas Čepulis

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovo vardu:

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius  
Įmonės kodas: 304151376  
PVM kodas: LT100009860612  
A.s. Nr. LT82 7044 0600 0298 2730  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440  
Tel. Nr.(8 5) 277 7524  
Faks. (8 5) 277 7514

Finansų ir administravimo tarnybos direktorius  
Augustas Dragūnas

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

## Projektavimo paslaugų ir statybos / rekonstravimo darbų užsakymas

PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS / REKONSTRAVIMO DARBŲ  
UŽSAKYMAS

Data: \_\_\_\_\_

Užsakovas, įmonės kodas: \_\_\_\_\_

Rangovas, įmonės kodas: \_\_\_\_\_

Objekto pavadinimas: \_\_\_\_\_

*Darbų pabaiga (gavus statybos užbaigimo dokumentus/vartotojo dujų sistemai  
- VEI pažymą):* \_\_\_\_\_

Pridedami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1	Vartotojų kontaktiniai duomenys	
2	Žemės sklypo(-ų) planas	
3	Žemės sklypo(-ų) nuosavybės pažymėjimas (-ai)	
4	Prisijungimo sąlygos	
5	Topografinė nuotrauka (jeigu turime)	
6	...	

**Užsakovas:****Rangovas:**\_\_\_\_\_  
(pareigos,  
vardas,  
pavardė)\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė)\_\_\_\_\_  
(parašas)\_\_\_\_\_  
(parašas)

A.V.

A.V.

## Pirkimo objekto apimtys

Eil. Nr.	Skelbiamų darbų zonos	Preliminarūs kiekiai 3 metams	
		Min. objektų skaičius, vnt.	Max. objektų skaičius, vnt.
1	Dujotiekių Projektavimo paslaugos ir statybos/ rekonstravimo darbai Šiaulių regione 1 dalyje.	10	5000

Rangovo vardu:

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

Direktorius  
Leonas Čepulis

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, Vilnius  
Įmonės kodas: 304151376  
PVM kodas: LT100009860612Finansų ir administravimo tarnybos direktorius  
Augustas Dragūnas

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

## Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas

PATVIRTINTA  
AB „Lietuvos dujos“  
dujų tinklo tarnybos direktoriaus  
2015 m. vasario 26 d. potvarkiu Nr. 2-7

## VERTYBIŲ (MEDŽIAGŲ) PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

20..... m. .... d.

**Užsakovas:** \_\_\_\_\_

**Rangovas:** \_\_\_\_\_

Eil. Nr.	Vertybių kodas	Perduodamos vertybės (medžiagos) pavadinimas ir jos charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma, EUR	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Rangos sutarties data

**Viso:**

Nuo vertybių (medžiagų) priėmimo dienos gavėjas pilnai atsako už jų saugumą, tinkamą ir kokybišką jų sandėliavimą bei sumontavimą iki atliktų darbų priėmimo akto pasirašymo.

**Išduoti leido:** \_\_\_\_\_

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**Vertybės išdavė:** \_\_\_\_\_

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20..... m. .... d.

A.V.

**Vertybės priėmė:** \_\_\_\_\_


(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20..... m. .... d.

A.V.

# **Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAI, NDSRI, NDSRAI) spintelės montavimo schema**

1 pav. Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAI, NDSRI, NDSRAI) spintelės montavimo schema.

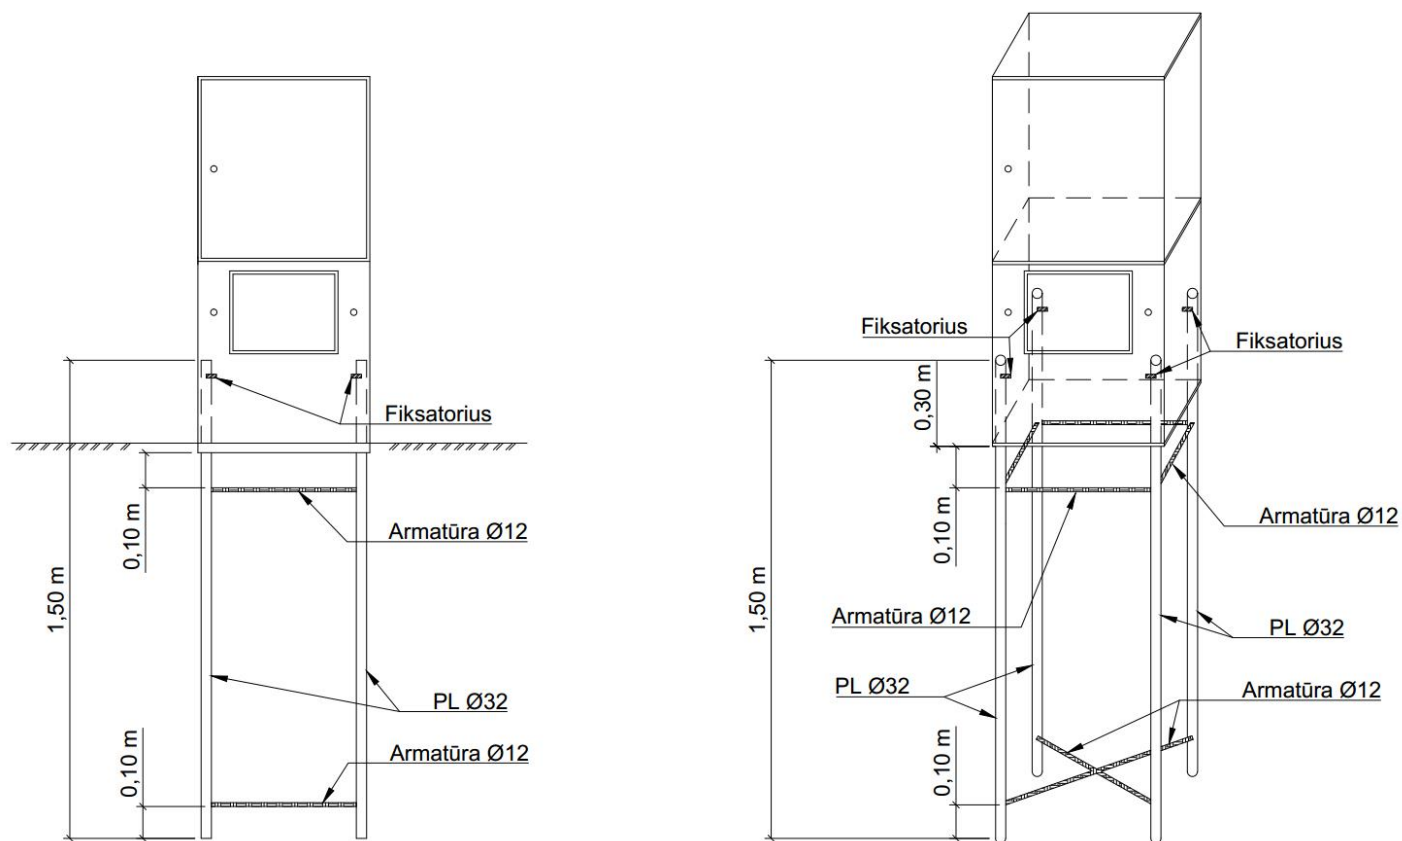

Pastaba: visi dujotiekio įvado įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis *Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis*.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

**UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“**

Direktorius  
Leonas Čepulis

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius

Įmonės kodas: 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Finansų ir administravimo tarnybos direktorius  
Augustas Dragūnas

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

## RANGOS BŪDU ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS (F-2)

Užsakovas, įmonės kodas:

Rangovas, įmonės kodas:

Objekto pavadinimas:

Sutarties Nr.:

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Diametras, mm		Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Iš viso be PVM, Eur
1	Žemės darbai	m'	d <sub>1</sub>				0,00
		m'	d <sub>2</sub>				0,00
		m'	d <sub>n</sub>				0,00
2	Požeminio PE dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai	m'	d <sub>1</sub>				0,00
		m'	d <sub>2</sub>				0,00
		m'	d <sub>n</sub>				0,00
3	PL dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai (iki d <sub>i</sub> 375,0 mm)	m'	d <sub>1</sub>				0,00
		m'	d <sub>2</sub>				0,00
		m'	d <sub>n</sub>				0,00
4	Dujotiekio demontavimas	m'	d <sub>1</sub>				0,00
		m'	d <sub>2</sub>				0,00
		m'	d <sub>n</sub>				0,00
5	Dėklo montavimas						
5.1	Dėklo montavimas uždaru būdu	m'	d <sub>n</sub>				0,00
5.2	Dėklo montavimas atviru būdu	m'	d <sub>n</sub>				0,00
6	Vidaus dujų sistemos montavimo darbai	obj'	d <sub>n</sub>				0,00
7	Pirminis dujų paleidimas	obj	d <sub>n</sub>				0,00
8	Dangų ardymas ir atstatymas						
8.1	asfalto dangos	m <sup>2</sup>	d <sub>n</sub>				0,00
8.2	žvyro dangos	m <sup>2</sup>	d <sub>n</sub>				0,00



8.3	šaligatvio (plytelių)	m2	d <sub>n</sub>				0,00
8.4	trinkelų dangos atstatymas	m2	d <sub>n</sub>				0,00
8.5	akmens grindinio	m2	d <sub>n</sub>				0,00
8.6	vejos (visų tipų)	m2	d <sub>n</sub>				0,00
<b>9</b>	<b>Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės, reguliavimo ir apskaitos įtaisų montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos)</b>						
9.1	Pakabinamos spintelės	vnt	d <sub>n</sub>				0,00
9.2	Pastatomos spintelės	vnt	d <sub>n</sub>				0,00
9.3	Spintelės keitimas	vnt	d <sub>n</sub>				0,00
<b>10</b>	<b>Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės su reguliavimo įtaisais</b>						
10.1	Dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelė su reguliavimo įtaisu	vnt	d <sub>n</sub>				0,00
10.2	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė su reguliavimo įtaisu (1-2 apskaitos įtaisams)	vnt	d <sub>n</sub>				0,00
10.3	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė su reguliavimo įtaisu (3-6 apskaitos įtaisams)	vnt	d <sub>n</sub>				0,00
<b>11</b>	<b>Uždaromosios armatūros montavimo darbai</b>	vnt	d <sub>n</sub>				0,00
<b>12</b>	<b>Uždaromoji armatūra</b>	vnt	d <sub>n</sub>				0,00
<b>13</b>	<b>Įsipjovimas į veikiantį dujotiekį (įpjova)</b>						
13.1	Į požeminį PE dujotiekį, kai įpjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, įpjovos darbais ir medžiagomis)	vnt	d <sub>n</sub>				0,00
13.2	Į požeminį PL dujotiekį (frezavimo būdu), kai įpjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, įpjovos darbais ir medžiagomis)	vnt	d <sub>n</sub>				0,00
13.3	Į požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas	vnt	d <sub>n</sub>				0,00
<b>14</b>	<b>Projektavimas ir inžinerinės paslaugos</b>						
14.1	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 20,00 m.	projektui	-				0,00
14.2	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 20,01 - 100,00 m.	projektui	-				0,00
14.3	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥ 100,01 m.	projektui	-				0,00
14.4	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 20,00 m.	obj	-				0,00
14.5	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 20,01 - 100,00 m.	obj	-				0,00

14.6	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis $\geq 100,01$ m.	obj	-				0,00
14.7	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 20,00 m.	obj	-				0,00
14.8	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 20,01 - 100,00 m.	obj	-				0,00
14.9	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis $\geq 100,01$ m.	obj	-				0,00
14.10	Vartotojo dujų sistemos projektavimo paslaugos (požeminio dujotiekio/vidaus dujų sistemos daliai)	projektui	-				0,00
14.11	Leidimas statyti naujus statinius	obj	-				0,00
14.12	Rašytinis pritarimas statinio projektui	obj	-				0,00
14.13	Leidimas žemės kasinėjimo darbams	obj	-				0,00
14.14	Trasos nužymėjimas	obj	-				0,00
<b>15</b>	<b>Kitos statinio išlaidos</b>						
15.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą	obj	-				0,00
15.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą požeminiam dujotiekiui**	pažymai	-				0,00
15.3	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą vidaus dujų sistemai	pažymai	-				0,00
15.4	Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę	obj	-				0,00
15.5	Kelių ženklų pastatymas	obj	-				0,00
15.6	Statybinio laužo išvežimas	t	-				0,00
<b>Suma be PVM</b>							0,00
<b>PVM 21%</b>							0,00
<b>Viso su PVM</b>							0,00

**Užsakovas:**

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(parašas, data)

A.V.

**Rangovas:**

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(parašas, data)

A.V.

**Įkainių perskaičiavimo sąlygos**

Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis:

1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per Kalendorinius metus tokiomis sąlygomis:

- 1.1. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo Kalendorinių metu paskutinį mėnesį;
- 1.2. jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc.;
- 1.3. pirmą kartą perskaičiuojant ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Įkainių perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti įkainius. Įkainiai perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:

$$C_{pn} = S_n \times (1 + (I - X) / 100)$$

$C_{pn}$  – perskaičiuotas Darbui taikomas įkainis

$S_n$  – Sutartyje numatytas Darbui taikomas įkainis

$I$  – infliacijos arba defliacijos dydis procentais;

$X$  - defliacijos atveju (- 5), infliacijos 5.

- 1.4. Duomenų šaltinis - <http://www.stat.gov.lt>, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai;
  - 1.5. perskaičiuoti įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip.
2. Už Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl Įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Pirkėjas apmoka taikant iki tol galiojusius įkainius, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naujus įkainius.

**Rangovo vardu:**

**UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“**

Direktorius  
Leonas Čepulis

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**Užsakovo vardu:**

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius  
Įmonės kodas: 304151376  
PVM kodas: LT100009860612

Finansų ir administravimo tarnybos direktorius  
Augustas Dragūnas

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą**

**1. Užsakovo kontaktai:**

- 1.1. Sąskaitos pateikiamos: [saskaitos@eso.lt](mailto:saskaitos@eso.lt); Šiaulių regiono dujų tinklo projektų valdymo grupė, P.Cvirkos g. 77, Šiauliai, [aurimas.aleksas@eso.lt](mailto:aurimas.aleksas@eso.lt), tel. 8656 30091; [tadas.trinkunas@eso.lt](mailto:tadas.trinkunas@eso.lt), tel 8699 06748.
- 1.2. Paslaugos rezultatai pateikiami: P.Cvirkos g. 77, Šiauliai, 220 kab. arba 219 kab.
- 1.3. Aktai pateikiami: Šiaulių regiono dujų tinklo projektų valdymo grupė, [aurimas.aleksas@eso.lt](mailto:aurimas.aleksas@eso.lt), tel. 8656 30091; [tadas.trinkunas@eso.lt](mailto:tadas.trinkunas@eso.lt), tel 8699 06748; [rita.navickiene@eso.lt](mailto:rita.navickiene@eso.lt), tel. 8699 06709.
- 1.4. Apie medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas: Šiaulių regiono dujų tinklo projektų valdymo grupė, [tadas.trinkunas@eso.lt](mailto:tadas.trinkunas@eso.lt), tel. 8699 06748; [aurimas.aleksas@eso.lt](mailto:aurimas.aleksas@eso.lt), tel. 8656 30091.
- 1.5. Medžiagų perdavimas – priėmimas: Šiaulių regiono dujų tinklo projektų valdymo grupė, [tadas.trinkunas@eso.lt](mailto:tadas.trinkunas@eso.lt), tel. 869906748; [aurimas.aleksas@eso.lt](mailto:aurimas.aleksas@eso.lt), tel. 8656 30091.
- 1.6. Darbų techninę priežiūrą vykdydys: Šiaulių regiono dujų tinklo eksploatavimo skyrius, [mindaugas.miniotas@eso.lt](mailto:mindaugas.miniotas@eso.lt), tel 8630 05953.

**2. Rangovo kontaktai:**

**Rangovo vardu:**

**UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“**

Direktorius  
Leonas Čepulis

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**Užsakovo vardu:**

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius  
Įmonės kodas: 304151376  
PVM kodas: LT100009860612

Finansų ir administravimo tarnybos direktorius  
Augustas Dragūnas

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**Gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė**

Gamtinių dujų skirstymas esamiems vartotojams gali būti apribotas ar nutrauktas vadovaujantis Sutarties BD sąlygomis. Maksimali gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė, priklausomai nuo atjungiamo dujotiekio diametro, pateikta lentelėje:

<b>Atjungiamo dujotiekio sąlyginis skersmuo</b>	<b>Maksimali atjungimo trukmė, val.</b>
≤DN50	<b>2</b>
DN60	<b>2</b>
DN80	<b>2</b>
DN100	<b>3</b>
DN125	<b>3</b>
DN150	<b>3</b>
DN200	<b>3</b>
DN250	<b>4</b>
≥DN300	<b>4</b>

**Rangovo vardu:**

**UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“**

Direktorius  
 Leonas Čepulis

\_\_\_\_\_  
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**Užsakovo vardu:**

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius

Įmonės kodas: 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Finansų ir administravimo tarnybos direktorius  
 Augustas Dragūnas

\_\_\_\_\_  
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
