

**PROJEKTO „VISIT VENTA“ MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ IR
INFORMACINIŲ (NUKREIPIANČIŲJŲ) ŽENKLŲ ĮRENGIMO PIRKIMO SUTARTIS
NR. MS - 247**

2018 m.*lipn*.....*24*...d.

Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios registruota buveinė yra Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atstovaujama administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir UAB „Vieksnių maldūnas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 253250070, kurios registruota buveinė yra Akmenės g. 24, Vieksniai, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vytauto Petkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

1. Sutarties dalykas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją (2 priedas) ir Šalių suderintą įkainotą veiklos sąrašą (grafiką) (3 priedas) įsipareigoja atlikti **mažosios architektūros elementų ir informacinių (nukreipiančiųjų) ženklų įrengimo darbus, įskaitant maketavimą, gamybą, transportavimą ir montavimą/įrengimą** (toliau – Darbai), ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darbų grupės, vertės, Darbų atlikimo terminai turi būti nurodyti įkainotame veiklos sąraše (grafike), kurį Rangovas privalo pateikti Užsakovui ir kurį Šalys privalo raštu suderinti Sutarties pasirašymo dieną.

2. Sutarties kaina

2.1. Šalių susitarimu Darbų kainą sudaro:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5
1.	Mažosios architektūros elementai ir jų įrengimas	10.124,00	2.126,04	12.250,04
2.	Informaciniai (nukreipiantieji) ženklai ir jų įrengimas	21.280,00	4.468,80	25.748,80
Iš viso:		31.404,00	6.594,84	37.998,84

Galutinė sutarties kaina yra 37.998,84 Eur su PVM (trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 84 ct).

Už šią Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

2.3. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

Rangovas

Kopija tikra

Recept

2.3.1. esant 9.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 9.2. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar papildomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

- a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą;
- b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos *Sistela* duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;
- c) jei papildomų ir/ar nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, papildomų/nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;

2.3.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina neperskaičiuojama.

2.3.3. Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusią vidutinę metinę infliaciją/defliaciją. Dar po metų likusios neišmokėtos Sutarties kainos dalies didinimas/mažinimas galimas jei, praėjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dėl bendro kainų lygio kitimo, vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusią vidutinę metinę infliaciją/defliaciją. Neišmokėta Sutarties kainos dalis didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštą apie kainų pokytį. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiems Šalims patvirtinus parašais.

2.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą.

2.5. Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę vienašališkai sumažinti Sutarties kainą tuo atveju, jeigu Rangovas pažeidžia bet kurį Sutarties 3.3 punkte nustatytą įsipareigojimą.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas privalo:

3.1.1. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

3.1.2. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

3.2. Užsakovas turi teisę:

3.2.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

3.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams (Rangovas nukrypsta nuo šalių patvirtinto darbų kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos

Lankys

dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų ir pan.), raštu reikalauti šalinti trūkumus, raštu pranešęs perkelti vėlesniam laikui mokėjimo terminus, nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

3.3. Rangovas privalo:

3.3.1. paskirti statybos darbų vadovą (-us), turintį (-čius) reikiamą kvalifikaciją.

3.3.2. atlikdamas Darbus, bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su šios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Darbų trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

3.3.3. užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavęs iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus reikiamų dokumentų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas sąlygas Užsakovui dokumentą, leidžiantį statyti, gauti (jei reikia);

3.3.4. savo lėšomis parengti topografinę nuotrauką ir atlikti kitus privalomus tyrimus (jei reikia);

3.3.5. nustatyti laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

3.3.6. Darbus atlikti pagal įkainotą veiklos sąrašą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus;

3.3.7. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

3.3.8. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Objekto darbų perdavimo – priėmimo aktus;

3.3.9. savo sąskaita ištaisyti Objekto darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų;

3.3.10. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliama pavojaus. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

3.3.11. visus Objekto darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą;

3.3.12. Objekto darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdinių), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

3.3.13. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

3.3.14. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus;

3.3.15. pareikalavus Užsakovui, pateikti Užsakovui raštišką ataskaitą apie pagal šią Sutartį atliktus Darbus;

3.3.16. saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu.

3.4. Rangovas turi teisę:

3.4.1. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

3.4.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą;

Lambas

3.4.3. naudotis kitomis teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

4. Darbų atlikimo terminai ir jų perdavimas

4.1. Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus ir perduoti jų rezultatus Užsakovui įkainotame veiklos sąraše (grafike) nustatytais terminais. Objekto darbai, kuriuos pagal Sutartį įsipareigoja atlikti Rangovas, turi būti visiškai užbaigiami (pasirašomas visų šioje Sutartyje numatytų darbų galutinis perdavimo – priėmimo aktas) ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2. Darbų atlikimo termino pratęsti nenumatoma.

4.3. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina galutinio Darbų termino. Užsakovas tinkamai paaiškino, kad Sutartyje nustatyti Darbų atlikimo terminai yra esminė šios Sutarties sąlyga.

4.4. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

4.5. Objekto darbų perdavimas:

4.5.1. Atliktų darbų priėmimas ir perdavimas atliekamas pasirašant Darbų priėmimo aktą: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės – Užsakovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo.

5. Atsiskaitymai ir mokėjimo tvarka

5.1. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose, nurodytas šioje Sutartyje, Lietuvos nacionaline valiuta.

5.2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti pagal pateiktą tinkamai surašytą PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų. PVM sąskaita faktūra išrašoma tik atlikus ir Užsakovui priėmus joje nurodytus Darbus, kurių detalizavimas turi būti pateikiamas prie PVM sąskaitos faktūros pridedamame atliktų Darbų (jų dalies) perdavimo – priėmimo akte.

5.3. PVM sąskaita-faktūra pateikiama elektroniniu būdu, naudojant informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemones.

6. Šalių patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.

6.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus. Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

7. Nenugalima jėga

7.1. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

7.2. Šalis, kuri dėl nenugalimo jėgos (Force Majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t.y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu pranešti kitai Šaliai. Force Majeure aplinkybės turi būti patvirtintos Pramonės, prekybos ir amatų rūmų ar kitos pagal tuo metu galiosiančius teisės aktus kompetentingos institucijos, pažyma.

7.3. Jei Šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo.

7.4. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą.

Kanuly

8. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai

8.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba

8.1.2. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

8.1.3. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.4. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

8.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

9. Pakeitimai

9.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

9.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

9.1.3. bet kurią papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

9.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 9.1 punkte forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 2.3.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 2.3.1. punktą koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t.y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 2.3.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.3.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. **papildomi darbai**, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, techninės priežiūros atstovo ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu;

9.3. jei Sutartyje numatyti Darbai įsigyti pagal Projektą, tai **papildomų darbų** pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija, pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamą kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ aktualia redakcija,



papildomi darbai įsigijami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

9.4. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

9.5. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti ir suderinti/įforminti pakeitimą su Užsakovu. Galimas išlaidas, susijusias su pakeitimo įgyvendinimu ir įforminimu savo sąskaita apmoka Rangovas.

9.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietyje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detalai nuroydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiamo punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.

9.7. Neatlikęs 9.6 punkte numatytos pareigos nustatytais terminais, Rangovas praranda teisę remtis minėtomis aplinkybėmis, norėdamas pagrįsto Sutarties termino pratęsimo ir (ar) nuostolių atlyginimo.

9.9. Užsakovas, raštu nuroydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

10. Garantijos

10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų galutinio perdavimo ir yra:

10.1.1. 5 (penkeri) metai – Objekto atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminėtiems 10.1.2–10.1.4 punktuose;

10.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);

10.1.3. 20 (dvidešimt metų) – esant tyčia paslėptų defektų;

10.1.4. Objekto įrangai – pagal įrangos gamintojo garantiją.

10.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

10.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas


11.1. Sutartis yra užtikrinta Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – **10 proc.** nuo Sutarties kainos su PVM. Rangovas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą Užsakovui privalo pateikti **per 10 darbo dienų** nuo Sutarties pasirašymo dienos.

11.2. Jeigu Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip 11.1 punkte nurodytai sumai.

11.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas: Sutarties galiojimo laikotarpiu;

11.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas;

11.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo apie Sutartyje Rangovui nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.



12. Šalių atsakomybė

12.1. Darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma Darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų perdavimo – priėmimo.

12.2. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl Darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui, išskyrus atvejus, kai Objektas Užsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtį ir pažeidžiant Objekto eksploatavimo taisykles, kurias Užsakovui iki galutinio Darbų rezultato priėmimo – perdavimo dienos parengė ir perdavė Rangovas.

12.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,04 (keturių šimtųjų) % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

12.4. Rangovas, neužbaigęs darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, taip pat nesilaikant pagal darbų vykdymo grafiką darbų atlikimo terminų, moka Užsakovui 0,04 (keturių šimtųjų) % dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

12.5. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Rangovui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol padaryti pažeidimai bus pašalinti.

12.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius.

13. Subrangovai ir jų keitimo tvarka

13.1. Vykdam Sutartį Rangovas numato pasitelkti subrangovus:

13.1.1. įmonės pavadinimas – _____;

įmonės kodas - _____;

įmonės adresas – _____.

13.2. Rangovas turi teisę samdyti tik tokius subrangovus, kuriuos nurodė pasiūlyme. Rangovas, norėdamas pakeisti vieną subrangovą kitu, nutraukti sudarytą subrangos sutartį, privalo apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) dienų informuoti Užsakovą. Rangovas turi teisę pakeisti, atsisakyti subrangovų tik tada, kai Užsakovas raštu išreiškia tam sutikimą.

13.3. Naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti konkurso sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus.

13.4. Subrangovų samdymas neatleidžia Rangovo nuo jokių įsipareigojimų ar atsakomybės pagal Sutartį. Rangovas atsako už subrangovų vykdomus Darbus, tarsi pats juos būtų atlikęs.

14. Informacijos konfidencialumas

14.1. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas.

15. Ginčų sprendimas

15.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

15.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinę vadovaujantis LR įstatymais.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Rangovas pateikė Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 5 mėn., jei ji nebus nutraukta anksčiau termino arba pratęsta šioje sutartyje numatytomis sąlygomis. Jei ši Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį netenka galios, išskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po jos nutraukimo, įskaitant nuostatas dėl atsiskaitymo, ginčų sprendimo. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

Rangovas

Užsakovas

16.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

16.2.1. jeigu Rangovas nepradeda Darbų sutartu laiku ilgiau, kaip dešimt darbo dienų, arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatyto laiku būtų tikrai neįmanoma;

16.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, prastai atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

16.2.3. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų ir nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį dėl aplinkybių, kurių atsiradimas nepriklauso nuo Užsakovo valios (pvz. neskirtas ar nutrauktas finansavimas ar pan.).

16.3. Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis paskelbta bankrutuojančia.

16.4. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

16.6. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šia Sutartimi.

17. Sutarties priedai:

17.1. Pasiūlymo forma.

17.2. Techninė užduotis.

17.3. Įkainotas veiklos sąrašas (grafikas).

17.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas.

Šalių rekvizitai ir parašai:


UŽSAKOVAS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Laisvės g. 8, Mažeikiai
Kodas 167371234
Tel. (8-443) 98 204
Faksas (8-443) 25 844
El. p.: savivaldybe@mazeikiai.lt


RANGOVAS

UAB „Viešnių malūnas“
Akmenės g. 24, Viešniai
Kodas 253250070
Tel. 8-685-49 489
El. p.: nauja.energija@gmail.com

Administracijos direktorius
Bronius Kryžius



Direktorius
Vytautas Petkevičius



Viešųjų pirkinių skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Inga Čiulienė
2018-07-17

Strateginio vystymo ir investicijų
skyriaus vyr. specialistė

Eglė Urbonaitė-Gilbiniene
2018-07-16

Strateginio vystymo ir
investicijų skyriaus vedėja

Sandra Ramanauskienė
2018-07-16

Teisės skyriaus vedėjas

8 Michailas Kobustas
2018-07-17

Kopija duota
bendrojo skyriaus vyr. specialistei

Domicilė Gvazdžiauskienė
2018-07-24

Pradėtojo skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Odeta Ramanauskaitė
2018-07-17

Apklauso sąlygų
Priedas Nr. 1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VIEKŠNIŲ MALŪNAS
Įmonės kodas 253250070. PVM kodas LT532500716. A. s. LT844010043300030244. AB Luminor
bankas Akmenės g. 24, Vieکشniai, LT-89490. Direktorius mob. 868549489

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL PROJEKTO „VISIT VENTA“ MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ IR
INFORMACINIŲ (NUKREIPIANČIŲ) ŽENKLŲ ĮRENGIMO PIRKIMO**

2018.06.13 Nr. VP-18/06/13

(Data)

Vieکشniai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Vieکشnių malūnas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Akmenės g. 24, Vieکشniai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Vytautas Petkevičius Direktorius
Telefono numeris	868549489
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	nauja.energija@gmail.com

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subtiekęją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(-ų) subrangovo(-ų), subtiekęjo(-ų), subtiekęjų(-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti:

Subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	-
Kokią veiklą vykdys pagal sutartį	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us) ar subtiekęją (-us)	-

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) apklausos sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Elemento pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
PALNOSAI						
1.	Suolas	V-SUO1	Vnt.	2	400,00	484,00
2.	Stalas	V-S1	Vnt.	1	320,00	387,20
3.	Šiukšlių dėžė		Vnt.	1	54,00	65,34
4.	Informacinis (nukreipiantysis ženklas)		Vnt.	1	1120,00	1355,20
VIEKŠNIŲ SENOSIOS KAPINĖS						
1.	Suolas	V-SUO1	Vnt.	2	400,00	484,00
2.	Stalas	V-S1	Vnt.	1	320,00	387,20
3.	Lauko tualetas	V-LT (vienvietis)	Vnt.	1	2000,00	2420,00
4.	Šiukšlių dėžė		Vnt.	1	54,00	65,34
5.	Laužavietė		Vnt.	1	700,00	847,00
6.	Informacinis (nukreipiantysis ženklas)		Vnt.	1	1120,00	1355,20
KRAKIAI						
1.	Suolas	V-SUO1	Vnt.	2	400,00	484,00
2.	Stalas	V-S1	Vnt.	1	320,00	387,20
3.	Šiukšlių dėžė		Vnt.	1	54,00	65,34
4.	Informacinis (nukreipiantysis ženklas)		Vnt.	1	1120,00	1355,20
SENASIS GELEŽINKELIO TILTAS						
1.	Suolas	V-SUO1	Vnt.	2	400,00	484,00
2.	Stalas	V-S1	Vnt.	1	320,00	387,20
3.	Lauko tualetas	V-LT (vienvietis)	Vnt.	1	2000,00	2420,00
4.	Šiukšlių dėžė		Vnt.	1	54,00	65,34
5.	Laužavietė		Vnt.	1	700,00	847,00
6.	Informacinis (nukreipiantysis ženklas)		Vnt.	1	1120,00	1355,20
LECKAVA, DAINŲ SLĖNIS						
1.	Suolas	V-SUO1	Vnt.	4	800,00	968,00
2.	Šiukšlių dėžė		Vnt.	1	54,00	65,34
3.	Informacinis (nukreipiantysis ženklas)		Vnt.	1	1120,00	1355,20
GRIEŽĖS PILIAKALNIS, VENTOS IR VADAKSTIES SANTAKA						
1.	Suolas	V-SUO1	Vnt.	2	400,00	484,00
2.	Stalas	V-S1	Vnt.	1	320,00	387,20
3.	Šiukšlių dėžė		Vnt.	1	54,00	65,34
4.	Informacinis (nukreipiantysis ženklas)		Vnt.	1	1120,00	1355,20
SANTEKLIŲ, DEŠIMTIES KAMIENŲ LIEPA, VIEKŠNIŲ MALŪNAS, VENTOS IR PIEVIO SANTAKA, VENTOS IR KUTUVIO SANTAKA, VENTOS IR SALDUPIO SANTAKA, MAŽEIKIŲ MIESTO, STULPINO MALŪNAS, JAUTAKIŲ PILIAKALNIS, VENTOS IR VIEŠETĖS SANTAKA, GOJAI (ŠVENTASIS MIŠKAS), VENTOS IR ŠERKŠNĖS SANTAKA, KUODŽIŲ HIDROELEKTRINĖ, GRIEŽĖS PILIAKALNIS, VENTOS IR VADAKSTIES SANTAKA, VENTOS IR VARDUVOS SANTAKA						

1	Informacinis (nukreipiantysis ženklas)	Vnt.	13	14560,00	17617,60
IŠ VISO:				31404,00	37998,84

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 37998,84 Eur trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 84 ct Eur

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 6594,84 Eur.

Pastabos:

- Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiektėjų bendra darbų ir paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM, atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus ir subtiektėjus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos suteikti paslaugos	Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje Eur su PVM
	-		
Viso:			

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
	-		

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas	1
2.	EBVPD	13
3.	Vytauto Petkevičiaus atestatas	1
4.	Jungtinė pažyma	2

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatytos datos.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)



Dokumentą elektroniniu būdu parašė pasirašantis

Vytautas Petkevičius

(Vardas, pavardė, vardas)

Data: 2018-06-26 22:31:50

Kopija tikra bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto

Domicilė: Gražuoliškių kaimas, 107 m. n. d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Projektas „Visit Venta“, įgyvendinamas pagal 2014 – 2020 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą

I. BENDRA INFORMACIJA

1. **Perkančioji organizacija (Užsakovas):** Mažeikių rajono savivaldybės administracija
2. **Perkančiosios organizacijos adresas** – Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai.
3. **BVŽP kodas** – 45262640-9 (aplinkos gerinimo darbai).
4. **Lėšų pobūdis:** ES lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos.
5. **Įrenginių techniniai rodikliai:**
 - Adresas – Mažeikių r. sav.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – mažosios architektūros elementų ir informacinių (nukreipiančiųjų) ženklų įrengimas Mažeikių r. sav.

Esamos situacijos aprašymas: projektas jungia dvi svarbias sritis - gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą bei tvarų jų naudojimą, turizmą. Kasmet Ventos upe praplaukia apie 2000 baidarininkų iš Latvijos ir Lietuvos. Nesant pakankamai sustojimo ir išlipimų vietų, turistai pasirenka išlipti ar įsirengti stovyklavietes tam neskirtose vietose. Dėl šios priežasties išvykdami palieka nemažai šiukšlių, įsirengę laužavietes tam neleistinose vietose padaro neatlygintą žalą gamtai, didėja upės kranto erozija. Taip pat, plaukimas šia upe ar lankymas šalia jos esančių objektų yra ne toks patrauklus, koks galėtų būti sutvarkius infrastruktūrą. Tiek Lietuvos, tiek Latvijos partneriai negali užtikrinti patrauklaus turizmo maršruto, tvaraus aplinkos tausojimo, tad šiuo pirkimu įsigyjama infrastruktūra yra labai svarbi ir reikalinga siekiant išnaudoti lankomų objektų potencialią turizmo efektyvumo skatinimui. Šio projekto tikslas – sukurti darnią Lietuvos ir Latvijos turizmo plėtojimo sistemą, siekiant pritraukti didesnę lankytojų skaičių programos teritorijoje bei kartu siekiant išsaugoti kultūros ir gamtos paveldą.

III. REIKALAVIMAI ĮRENGINIŲ STATYBAI

1. Infrastruktūros elementai bus įrengiami prie Ventos upės, valstybinėje žemėje.
2. Atliekant darbus laikytis LR statybos įstatymo, Statybos techninių reglamentų ir kitų galiojančių įstatymų bei poįstatyminių aktų reikalavimų, nepažeidžiant trečiųjų asmenų pagrįstų teisių.
3. Visi įrengiami objektai turi būti maksimaliai pritaikyti žmonių su negalia poreikiams.
4. Visų elementų konstrukcija turi būti įrengiama taip, kad ji būtų kiek įmanoma atsparesnė vandalizmui (niokojimui).
5. Gaminių medžiagiškumas nurodytas pridedamuose brėžiniuose (medis, betonas, akmuo, įdėtinės detalės ir pan.).
6. Gaminių pastatymui pamatai įrengiami gelžbetoniniai (pvz., g/b poliai ar stulpiniai) su įdėtinėmis detalėmis, kad susidėvėjus ar sugadinus gaminius, juos būtų galima lengvai pakeisti naujais, permontuojant ant įrengtų pamatų.
7. Gaminiais naudojama pušies mediena. Mediena turi būti be puvinų ir puvinio užuomazgų.
8. Šiukšliadėžės projektuojamos iš impregnuotos medienos lentų (apie 10x4 cm; aukštis: apie 60 – 70 cm, 45x45 cm). Tvirtinamos ankeriavimo būdu ant betoninio pagrindo.
9. Turi būti numatytas visų medinių konstrukcijų impregnavimas ir dažymas alyva.
10. Turi būti numatytas metalinių konstrukcijų gruntavimas ir dažymas (spalva artima medžio konstrukcijai).

11. Tikslios įsigyjamos infrastruktūros pastatymo vietos turi būti derinamos su Užsakovu. WC vietas reikalinga parinkti taip, kad būtų galima privažiuoti išsiurbti/ išvalyti.
12. Informacinių (nukreipiančių) ženklų turinys turi būti derinamas su Užsakovu. Preliminarūs reikalavimai turiniui:
 - Sustojimo vietose įrengiamuose ženkluose turėtų būti pateikiamas poilsio vietos/laužavietės/galimybės pavalgyti ženklavimas. Taip pat turėtų būti pateikiamas stilizuotas baidarių trasos žemėlapis su jame pažymėtomis galimomis sustojimo vietomis bei informacija apie vietas, pro kurias bus praplaukiama.
 - Baidarių trasoje (ne sustojimo vietose) įrengiamuose ženkluose turėtų būti nurodyta: ženklų vietos, pro kurias praplaukiama, pavadinimas; likęs kilometražas iki artimiausios vietos, pro kurias bus praplaukiama ir jos pavadinimas; likęs kilometražas iki artimiausios sustojimo vietos ir jos pavadinimas.
13. Įrengiama infrastruktūra turi turėti 2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos viešinimo ženklus.

IV. INFRASTRUKTŪROS ELEMENTŲ KIEKIAI

Elemento pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Suolas	Vnt.	14
Stalas	Vnt.	5
WC	Vnt.	2
Laužavietė	Vnt.	2
Šiukšlių dėžė	Vnt.	6
Informacinis (nukreipiantysis) ženklas	Vnt.	19

PRIDEDAMA:

1. Elementų kiekių žiniaraštis, 1 lapas.
2. Infrastruktūros įrengimo vietų sąrašas, 1 lapas.
3. Preliminarūs infrastruktūros elementų brėžiniai, 5 lapai.
4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus sutikimas „Dėl nesudėtingų laikinų statinių statymo valstybinėje žemėje“, 1 lapas.

Kopija tikra

Kopija tikra

ELEMENTŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS SUSTOJIMO VIETOSE BEI
INFORMACINIŲ (NUKREIPIAMŲJŲ) ŽENKLŲ PASTATYMO VIETOS

Eil. Nr.	Elemento pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis
PALNOSAI				
1.	Suolas	V-SUO1	Vnt.	2
2.	Stalas	V-S1	Vnt.	1
3.	Šiukšlių dėžė		Vnt.	1
4.	Informacinis (nukreipiantysis ženklas)		Vnt.	1
VIEKŠNIŲ SENOSIOS KAPINĖS				
1.	Suolas	V-SUO1	Vnt.	2
2.	Stalas	V-S1	Vnt.	1
3.	Lauko tualetas	V-LT (vienvietis)	Vnt.	1
4.	Šiukšlių dėžė		Vnt.	1
5.	Laužavietė		Vnt.	1
6.	Informacinis (nukreipiantysis ženklas)		Vnt.	1
KRAKIAI				
1.	Suolas	V-SUO1	Vnt.	2
2.	Stalas	V-S1	Vnt.	1
3.	Šiukšlių dėžė		Vnt.	1
4.	Informacinis (nukreipiantysis ženklas)		Vnt.	1
SENASIS GELEŽINKELIO TILTAS				
1.	Suolas	V-SUO1	Vnt.	2
2.	Stalas	V-S1	Vnt.	1
3.	Lauko tualetas	V-LT (vienvietis)	Vnt.	1
4.	Šiukšlių dėžė		Vnt.	1
5.	Laužavietė		Vnt.	1
6.	Informacinis (nukreipiantysis ženklas)		Vnt.	1
LECKAVA, DAINŲ SLĖNIS				
1.	Suolas	V-SUO1	Vnt.	4
2.	Šiukšlių dėžė		Vnt.	1
3.	Informacinis (nukreipiantysis ženklas)		Vnt.	1
GRIEŽĖS PILIAKALNIS, VENTOS IR VADAKSTIES SANTAKA				
1.	Suolas	V-SUO1	Vnt.	2
2.	Stalas	V-S1	Vnt.	1
3.	Šiukšlių dėžė		Vnt.	1
4.	Informacinis (nukreipiantysis ženklas)		Vnt.	1
SANTEKLIŲ, DEŠIMTIES KAMIENŲ LIEPA, VIEKŠNIŲ MALŪNAS, VENTOS IR PIEVIO SANTAKA, VENTOS IR KUTUVIO SANTAKA, VENTOS IR SALDUPIO SANTAKA, MAŽEIKIŲ Miesto, STULPINO MALŪNAS, JAUTAKIŲ PILIAKALNIS, VENTOS IR VIEŠETĖS SANTAKA, GOJAI (ŠVENTASIS MIŠKAS), VENTOS IR ŠERKŠNĖS SANTAKA, KUODŽIŲ HIDROELEKTRINĖ, GRIEŽĖS PILIAKALNIS, VENTOS IR VADAKSTIES SANTAKA, VENTOS IR VARDUVOS SANTAKA				
1	Informacinis (nukreipiantysis ženklas)		Vnt.	13

INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO VIETŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Preliminarūs informacinių (nukreipiančiųjų) ženklų įrengimo vietų pavadinimai	Pastabos	Preliminarios koordinatės
1.	Dešimties kamienų liepa		x: 6231268 y: 414716
2.	Palnosų poilsiavietė	<i>Sustojimo vieta</i>	x: 6233967 y: 411784
3.	Santeklių poilsiavietė		x: 6234129 y: 410155
4.	Viekšnių malūnas		x: 6234152 y: 408348
5.	Viekšnių senosios kapinės	<i>Sustojimo vieta</i>	x: 6234433 y: 407249
6.	Ventos ir Pievio santaka		x: 6235895 y: 404459
7.	Ventos ir Kutuvio santaka		x: 6236857 y: 403065
8.	Krakiai	<i>Sustojimo vieta</i>	x: 6237736 y: 401944
9.	Ventos ir Saldupio santaka		x: 6239139 y: 399010
10.	Mažeikių miesto poilsiavietė		x: 6241271 y: 396748
11.	Ventos ir Viešetės santaka, Gojai		x: 6241870 y: 393971
12.	Stulpino malūnas		x: 6243156 y: 392435
13.	Jautakių piliakalnis		x: 6243542 y: 392324
14.	Ventos ir Šerkšnės santaka		x: 6246077 y: 391130
15.	Senasis geležinkelio tiltas	<i>Sustojimo vieta</i>	x: 6246508 y: 391134
16.	Leckava, Dainų slėnis	<i>Sustojimo vieta</i>	x: 6251796 y: 390715
17.	Kuodžių hidroelektrinė		x: 6251943 y: 390715
18.	Griežės piliakalnis, Ventos ir Vadaksties santaka	<i>Sustojimo vieta</i>	x: 6254594 y: 389904
19.	Ventos ir Varduvos santaka		x: 6255977 y: 389436

Kopija

KOPIJA

Techninės specifikacijos
Priedas Nr. 3

PRELIMINARUS INFRASTRUKTŪROS ELEMENTŲ BRĖZINIAI


(Priedamas atskiras PDF formato failas)

Kopija

VAZDAS IS PROTESTO M1:20

Opisja

02:14 QMOS 27500000

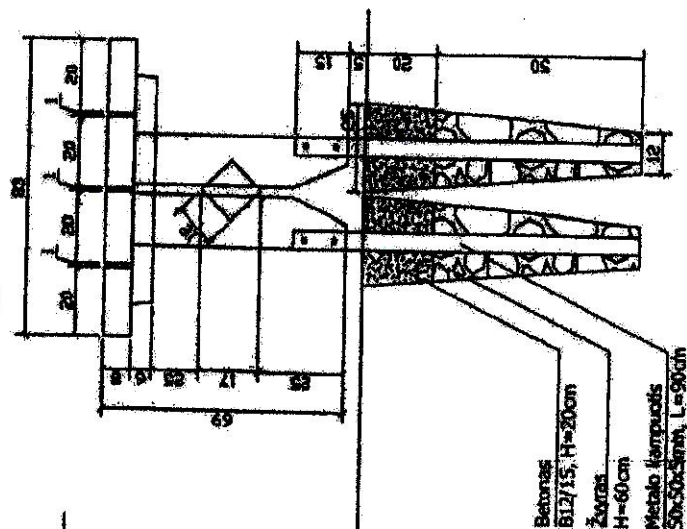

PASTABOS:


1. Salvisiis piniibamus is leniq (8x20 cm, L=210 cm, L=220 cm) ir skleris (40 cm, L=64 cm);
2. Stalo kijos gumišams is ušq (18x14 cm, L=62 cm), prie kusi q tvirtinamus kumpuolai (50x50x5 mm, H=90 cm) ir (betonujams i kmoq;
3. Tarp ab lojq tvirtinamus skleris (12x12 cm, L=150 cm);
4. Salvisiis prie stalo kijo tvirtinamus medvizišiais. Medviziš ai prieduolai po mediuo kusišq;
5. Vias medines sūsiqptinimas is dabura;
6. Imitacijai pabūti cistinėmis.

Technical drawing of a rectangular structure, likely a table or bench, showing dimensions and labels. The drawing is oriented vertically on the page.

Dimensions and Labels:

- Top horizontal dimension: 220
- Right vertical dimension: 150
- Bottom horizontal dimension: 65
- Left vertical dimension: 220
- Internal vertical dimension (from top): 10
- Internal vertical dimension (from bottom): 10
- Internal vertical dimension (from top): 35
- Internal vertical dimension (from bottom): 35
- Labels on the left side (from top to bottom):
 - Legs 6x20cm, L=210cm, L=220cm
 - Legs 6x20cm, L=64cm
 - Tables 10x34cm, L=61cm
 - Tables 12x20cm, L=150cm


VAIŽDAS IŠ VIRŠAUS M1:20

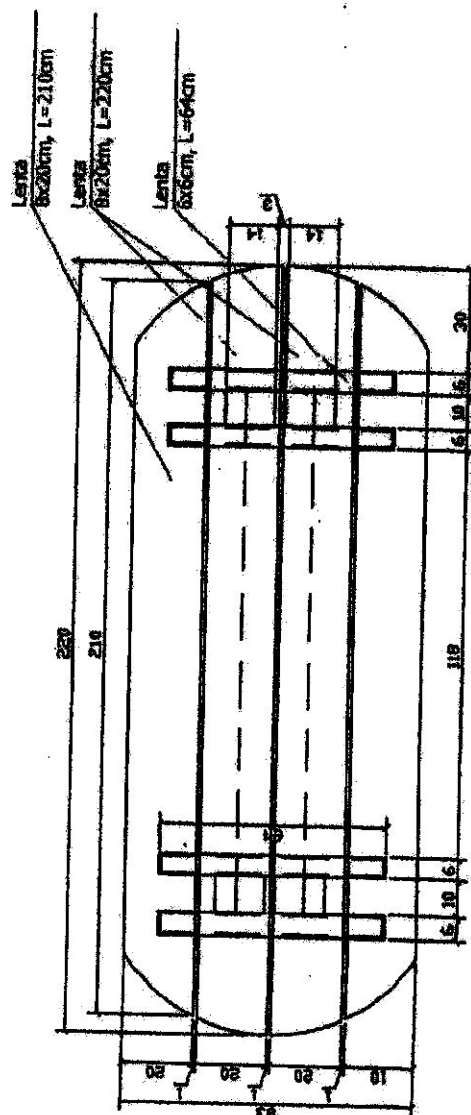




Opija

VAIZDA'S IS PRUEGO MI-20

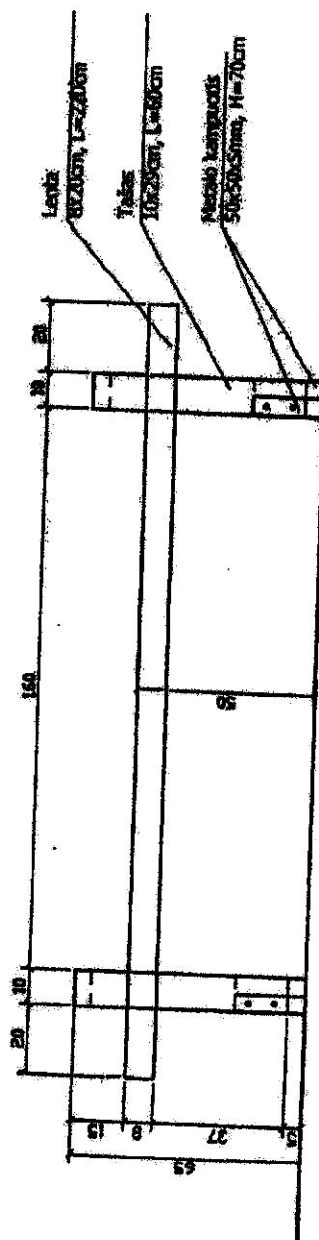


APR 15 5 50 PM '70

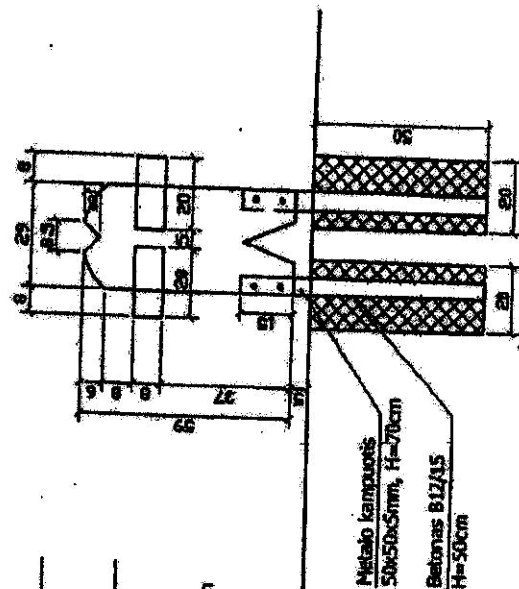

PASTABOS:

1. Suolo medijnoj dele gniljenski je lenti (R=20 cm, L=230cm);
2. Stato kojto gniljenski je lenti (10x29cm, L=68cm), prje kurju tvorničkim klapovčini (50x50x5mm, H=70cm) i petosmijet i žerog;
3. Vise medijne medijne i debljina;
4. Pristaviti petički centimetri.

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS M1:20

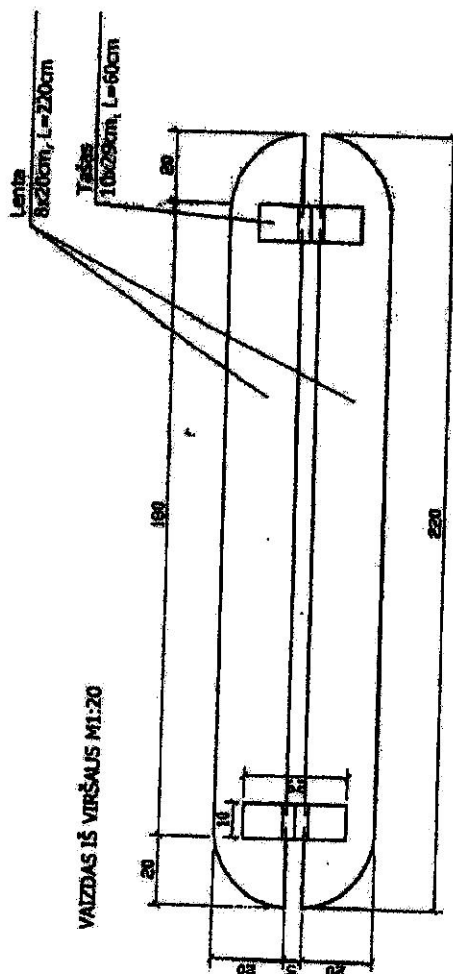


1015 V-9101
M11:20

Kopija tikra


Kopija tikr

Plāns. M1:50

Kopija

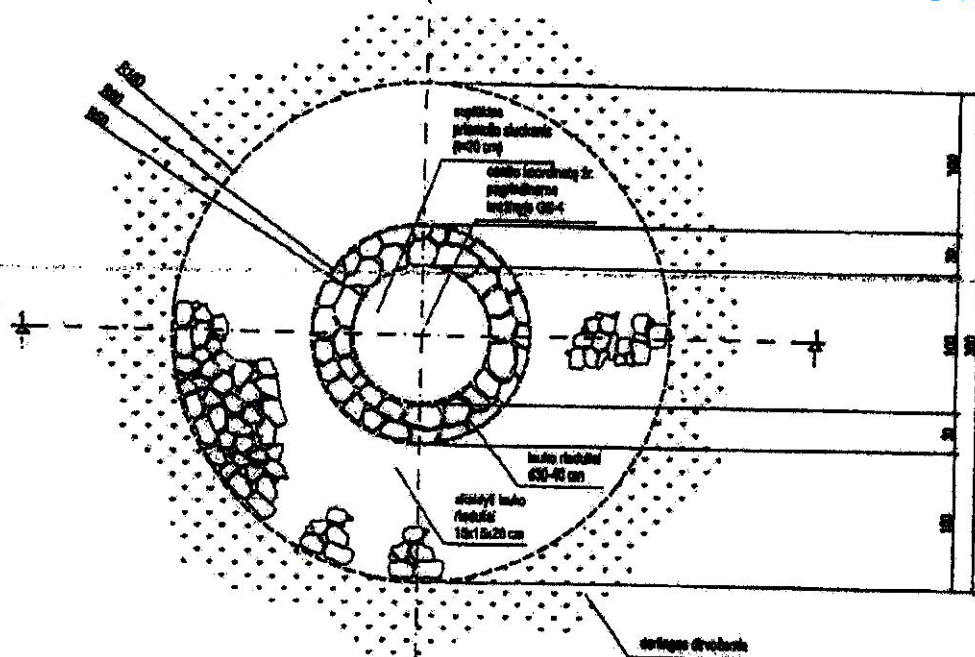

Skatnājs pļūvā. M1:50

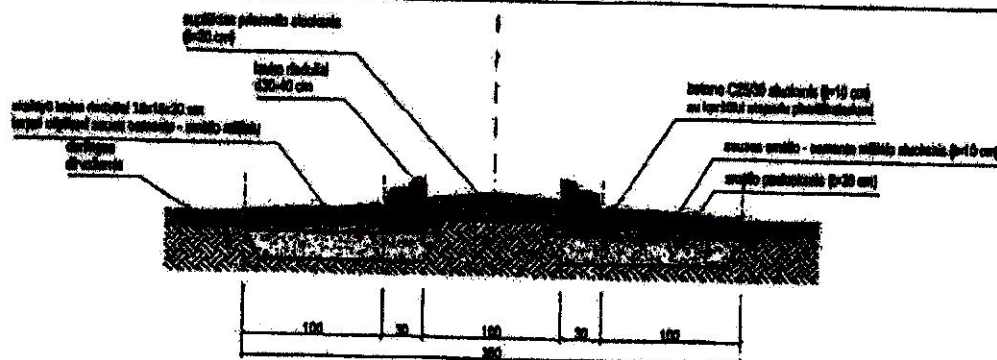

Mācību kārta laukavietā (pārskaņi):

Sl. Nr.	Pavadinājums	Slānis (cm)	Koks (m³)	Sl. Nr.	Pavadinājums	Slānis (cm)	Koks (m³)
1.	Suplūdoņa priemollo slūkanis	t=20 cm	0.65 m³	5.	Karšči atpakaļ plastifikatorus betonai	—	2.5 kg
2.	Betons C25/30	t=10 cm	0.9 m³	6.	Stādītā lauko rēdūlī 15x15x20 (S-32 m³)	t=30 cm	9.6
3.	Lauko rēdūlī 630-40	—	2.0 m³	7.	Sausā cemento - smiltis mīnā 1:1 past. (S-32 m³)	t=10 cm	3.2
4.	Smiltis pārskaņuma (S-32 m³)	t=20 cm	0.4 m³				

Pastabas

1. Mācības duci centimetros.
2. Mācības tīklā vietā, pirms uzsākt darbus.
3. Laukavietā centro koordinātas patēlās gan. planināto projekto datu beidzē GS-4.
4. Nūmāto velānā ar smilti t=20 cm ir betons C25/30 t=10 cm atpakaļsmāto apbetonājam 7 lauko rēdūlī d=30-40 cm ziedā.
5. Iesūdojama mīnāto betonā iedāma karšči atpakaļ plastifikatorus (norma 0.5 kg - 100 kg).
6. Iesūdojama ziedā pusēto (pārskaņā dāga stādītā lauko rēdūlī 15x15x20 dāga 1 m pārskaņā juostā, uz kurā atpakaļsmāto ir pārskaņāto apēto ziedāto darīgojo drošības slūkanis 10 cm.
7. Rēdūlī pārskaņā ar smilti t=10 cm ir sausā cemento - smiltis mīnā 1:1 slūkanis t=10 cm. Tarpā tarp rēdūlī uzpārskaņā sausā smiltis - cemento mīnā.
8. Vidnāto ziedā dāga suplūdoņa priemollo slūkanis.

Brānītis: Laukavietā (pārskaņi)

Kopija tikra


Kopija tikra

MECHANICAL KEYS

- [illegible]

1. Nedrīgsys patēdīj cietimēstis.
2. Mežlas grūnkuļējas, dažēnas spēva mēdā.
3. Plēvē informācijai mēdā, U.V.
4. Neudogāna kēstēdēlo mēdēna.
5. Vēa nēvādujēna nēdēna dēvāna.

MUKREPIANTYSIS ŽENKLAS
M1:20

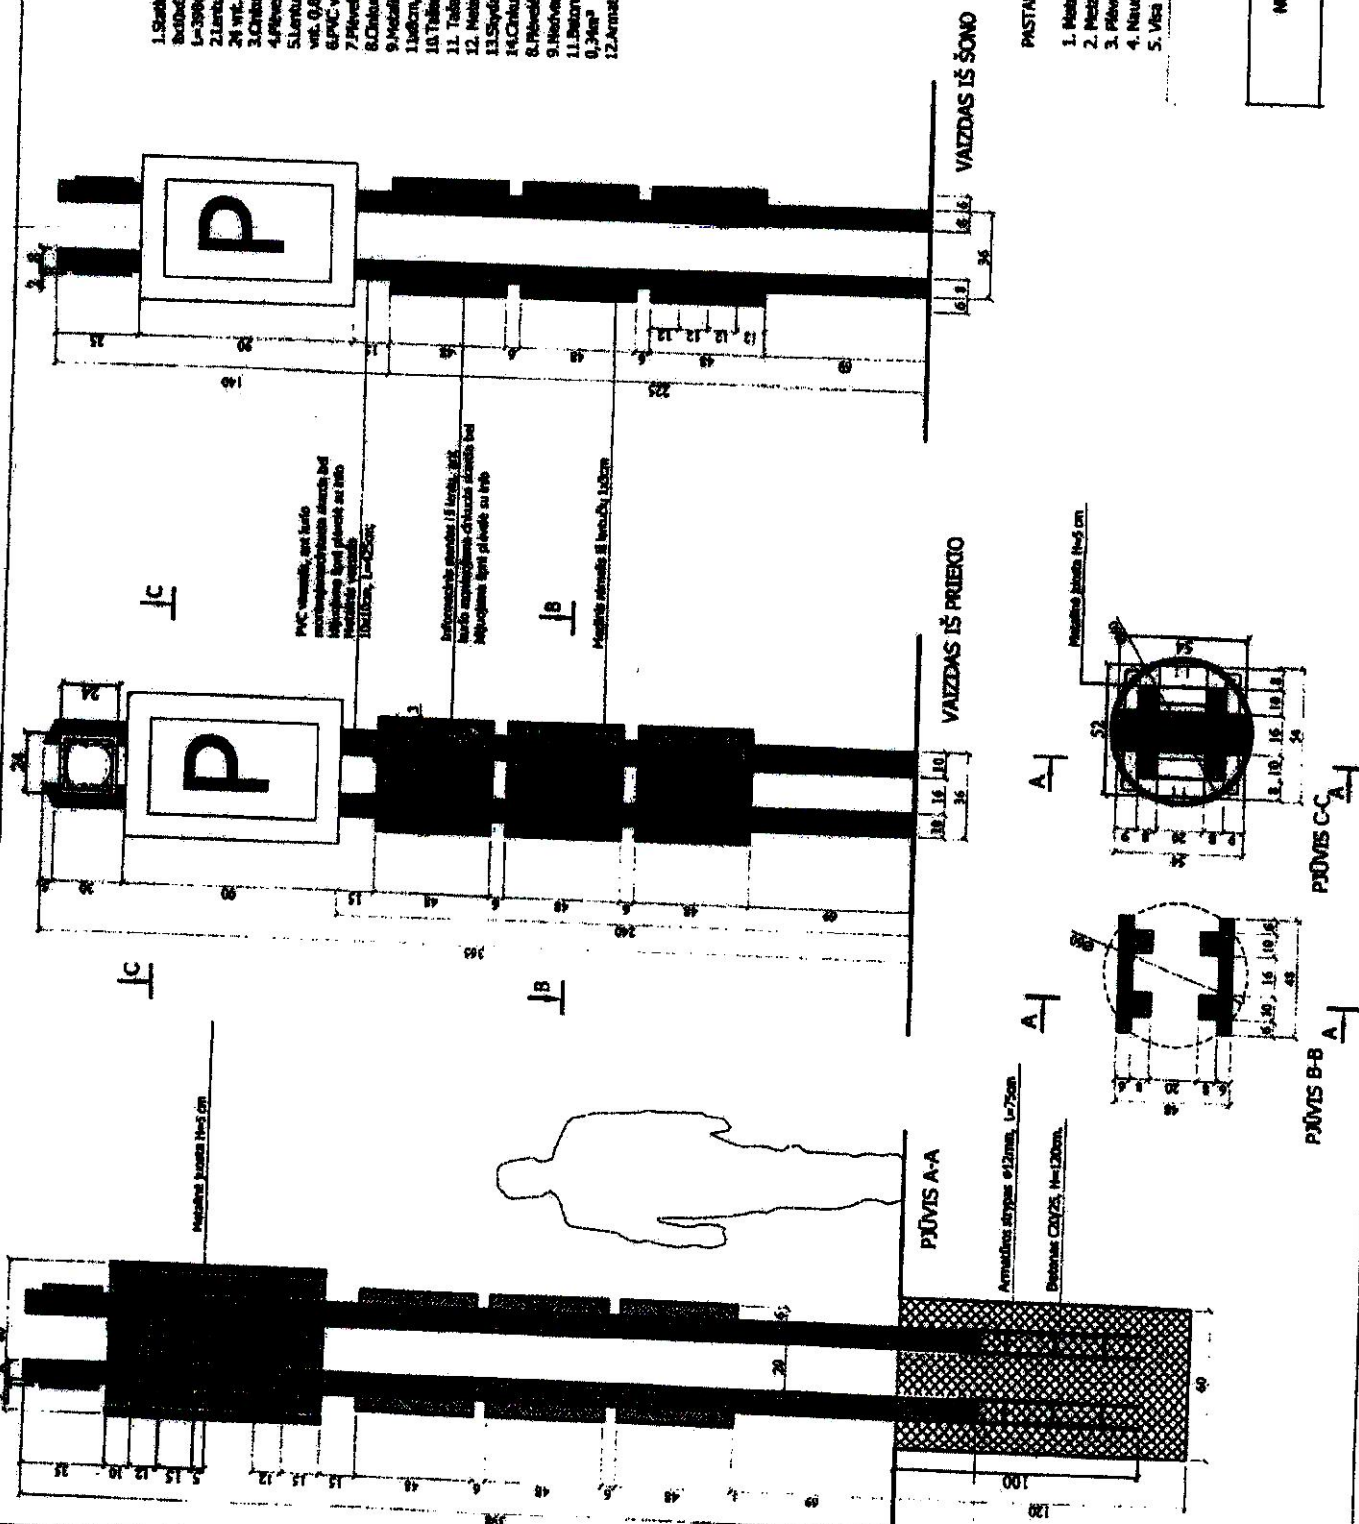

Kopira tikra

Kopija tikra



**NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS**

Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos Strateginio vystymo
ir investicijų skyriui
Laisvės g. 8
89223 Mažeikiai

2017-05-16 Nr. 35ST-70-(14.35.5.)

2017-05-08 Nr. SVI2-72

S. Mikonaitis
V. Balciūnas

DĖL PRITARIMO PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMUI

S. Šimkus
2017-05-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įgaliojimu Nr. 11-201-(1.9.) „Dėl sutikimų (atsisakymų išduoti sutikimus) išdavimo ir sprendimų suteikti teisę naudoti žvejybos plotus priėmimo“, išnagrinėjus Jūsų pateiktus dokumentus dėl pritarimo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Visit Venta“ pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius neprieštariauja, kad nagrinėjamose teritorijose įgyvendinant valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą būtų vykdomi ženklavimo darbai, išlipimo vietų, poilsiaviečių prie upės įrengimo darbai valstybinėje žemėje, nesuformuotuose žemės sklypuose, jeigu juose nebus sukuriama nekilnojamoji daiktai.

Taip pat pažymime, kad projekto įgyvendinimo metu negali būti pažeisti „Natura 2000“ teritorijos reikalavimai, gretimų žemės sklypų savininkų ir naudotojų teisės.

Skyriaus vedėjas



S. Šimkus

Zigmantas Šimkus

Vilma Vaitkienė, tel: 8 706 85 621, el. p. Vilma.Vaitkiene@nzt.lt

Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19,
01103 Vilnius
<http://www.nzt.lt>

Laisvės g. 39, 89222 Mažeikiai
Tel. 8 706 85 613
Faks. 8 706 86 971
El. paštas mazeikiai@nzt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Domicėlė Gyvažiūskienė
2017-05-15 men. 17 d.

**IKAINOTAS VEKLOS SĄRAŠAS
DĖL „VISIT VENTA“ MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ IR INFORMACINIŲ (NUKREIPIANČIŲ) ŽENKLŲ ĮRENGIMO**

Eil. Nr.	Nuolatinių darbų/paslaugų veiklos pavadinimas	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiai jo kiekiai eurais be PVM (Pildo rangovas, nurodydamas darbų atlikimą sutarčius įgyvendinimo mėnesiais nuo sutarties pradžios, o ne kalendoriniais mėnesiais)				Darbo kaina, eurais su PVM (Pildo rangovas)
		Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	
1.	Mažosios architektūros elementai ir jų įrengimas	-	-	8000,00	4250,04	12250,04
2.	Informaciniai (nukreipiantieji) ženklai ir jų įrengimas	-	-	5748,80	20000,00	25748,80

Direktorius Vytautas Petkevičius *Petkevičius*
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialisto
Domicėlė Kazlauskienė
2018 m. 10.7 mėn. d.
