

ALYTAUS RAJONO MIROSLAVO KAIMO MULTIFUNKCINĖS SPORTO AIKŠTĖS ĮRENGIMO IR GATVIŲ BEI ŠALIGATVIŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr. SUT- 582

2018 m. liepos 18 d.

Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 188718528, buveinės adresas: Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Kručkauskaitės veikiančios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir

UAB „Alkesta“ (toliau – **Rangovas**), įmonės kodas 249672710, buveinės adresas Naujoji g. 118, 62175 Alytus, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Eugenijaus Palavinsko, veikiančio pagal 2018-01-01 d. įgaliojimą Nr. 18-5-2, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

Toliau šioje sutartyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai- Šalimi.

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatytą terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir gatvių bei šaligatvių darbus (toliau – Darbai), ir ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbai atliekami pagal supaprastintą projektą „Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija“ (1 priedas) ir Techninę užduotį „Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcijos darbų, pirkimo pagal parengtus supaprastintus projektus“ (2 priedas).

1.3. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus.

1.4. Darbų atlikimo vieta – Miroslavo kaimas, Miroslavo sen., Alytaus rajono savivaldybė.

2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Bendra ir galutinė Sutartyje numatyta atliekamų Darbų kaina – **343 868,84** Eur (trys šimtai keturiadesimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 84 ct) su PVM. Tame skaičiuje PVM sudaro 59 679,72 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt devyni eurai 72 ct).

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. I kainą įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmai, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų atlikimui. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.



2.3. Sutarties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutartyje numatytais kainų koregavimus. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtu įstatymu ir įstatymu lydimujų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokesčius. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojama tik tą darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo numatyti arba yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiamā, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

2.5.1. pagal Sutarties 14 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomu / keičiamu / nevykdomu Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomu / keičiamu / nevykdomu Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukšciau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukšciau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

2.5.1.1. pritaikant Sutartyje numatytais Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytais panašiu darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

2.5.1.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvetės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklę nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3. ATSKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinus tokį defektų ištaisymą.

3.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras ir atlikus Sutarties 3.1 papunktyje nurodytus veiksmus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų pateikimo dienos Užsakovui.

3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.

3.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus


reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrąstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 4.1. Darbų atlikimo terminas: 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.
- 4.2. Darbų atlikimo termino pratišimas nenumatomas.
- 4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigtai visi Sutartyje numatytai Darbai ir priimti pagal šios Sutarties 8 skyrių.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- 5.1. Užsakovas įsipareigoja:
 - 5.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;
 - 5.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą;
 - 5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti;
 - 5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiskai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.
- 5.2. Rangovas įsipareigoja:
 - 5.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigtai ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas;
 - 5.2.2. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagą;
 - 5.2.3. pateikti Užsakovui kitus dokumentus;
 - 5.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
 - 5.2.5. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;
 - 5.2.6. pašalinti iš statybinių visas statybines atliekas ir šiuksles;
 - 5.2.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietai kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukslių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietai ir visos tokios patekimui į statybvietai naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženkais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;
 - 5.2.8. užtikrinti, kad Rangovo personalas būtų kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikacinių reikalavimų pirkimo dokumentuose;
 - 5.2.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;
 - 5.2.10. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai, subsubrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartinių įsipareigojimų dalis;
 - 5.2.11. būti atsakingu už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakyti už savo paties veiksmus ar neveikimą;



5.2.12. Iki Darbų pradžios paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

5.2.13. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

5.2.14. turėti visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutarį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvu tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

5.2.15. prisiimti atsakomybei ir rizikai Darbų faktinių kiekijų neatitikimą orientaciniams (projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekiečių (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešujų pirkimų tarnybos direktorius 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 14 skyriuje.

5.2.16. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;

5.2.17. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;

5.2.18. įforminti priežiūros darbų atlikimo dokumentus;

5.2.19. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminijų, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės;

5.2.20. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;

5.2.21. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;

5.2.22. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;

5.2.23. pateikti eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurios turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, sudeginti ir pataisyti įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutarį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

6. ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Užsakovo teisės:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

6.1.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti vienkartinio patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus;

6.1.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;

6.1.4. tikrinti Rangovo naudojamą techniką. Nustačius, kad naudojama ne visa technika, ir jeigu dėl to vėluojama atlikti bet kuriuos darbus, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas darbus vykdys su nurodyta arba lygiaverte technika. Jeigu Rangovas per protingą terminą neįvykdo šio reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.1.5. paskirtą baudą Rangovui išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, o jei tokiai sumų nepakanka, kreiptis dėl baudos sumos sumokejimo į Rangovą, o jam neatsiskaičius per 30 dienų kreiptis į garantiją suteikusią organizaciją dėl mokėtinų sumų išmokėjimo.



6.2. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatyti Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo atlikti Darbus iš naujo.

7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priežiūros darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.

7.3. Užsakovas, nustatės Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

7.4. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

8. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.

8.2. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatyti trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigtis, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu pagal rašytinį pareikalavimą be jokių papildomų teisinių procedūrų ir užtikrinimo sumų gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo laiduotojui ar garantui pateikimo dienos.

10.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtujų) delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

10.3. Rangovas iki šios Sutarties 4.1 punkte nurodyto termino neatlikęs Darbų moka 200,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

10.4. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus;

10.5. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatinės sąlygas) oro sąlygomis vykstant statybos darbams ir pan.

10.6. Jei dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei garantinio laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią žalą.

10.7. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiiuntus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiiuntų įsipareigojimų įvykdymą.

11. SUTARTIES ĮVYKDYSMO UŽTIKRINIMAS

11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą arba užstatą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma yra 5 % (penki) nuo bendros sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigt darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

11.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginama už Rangovo įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutartį ar vykdymą juos netinkamai. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taip pat galioja ir netesybų pagal šią Sutartį užtikrinimui.


11.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

12. NENUGALIMOS JÉGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jégos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalima jéga (*force majeure*) nelaikomas Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jéga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievoles vykdysti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

12.3. Jei nenugalimos jégos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jégos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.



13. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Rangovui pateikus reikalaujamą pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki Užsakovas ir Rangovas įvykdys šioje Sutartyje numatytais įsipareigojimais.

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyma Sutartis.

14. SUTARTIES PAKEITIMAS

14.1. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

14.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamas Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, jeigu jie viršija 15 procentų sutarties vertės.

14.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjės pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

14.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.2 punkte nustatytais sąlygų, papildomi darbai įsigyjami vykdant naują pirkimo procedūrą.

14.5. Sutarties Šalys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtį sumažinti vadovaujantis tokia tvarka:

14.5.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

14.5.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinės Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

14.6. Pakeitimą įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

15. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:



15.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip létai, kad juos baigtį iki termino pabaigos pasidaro aiškiai nejmanoma;

15.1.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti;

15.1.3. Rangovas per pagrįstai nustatyta laikotarpį nevykdė Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba nevykdytus sutartinius įsipareigojimus;

15.1.4. Rangovas netenka teisés atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

15.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybęs ar nevykdė kitų šios Sutarties salygų arba raštiškai perspētas dar kartą jas pažeidžia;

15.1.6. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu ar pasibaigus jo galiojimo terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

15.2. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atlikus Darbus, Šalims pasirašant priemimo – perdavimo akta. Užsakovas privalo apmokėti už atlikus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.

15.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukiti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.3.1. Užsakovas visiškai nevykdė savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

15.4. Rangovo pasirinkimas nutraukiti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

15.5. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukiti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

16. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

16.1. Dalies Sutartyje numatyta darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus (toliau - subrangovai):

16.1.1. UAB „Eurosportas LT“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302872598, kurios registruota buveinė yra Ragės g. 16, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, aikštelės dangos įrengimo darbų atlikimui (4,25 proc.);

16.1.2. UAB „VA Statyba“, Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300957555, kurios registruota buveinė yra Naujoji g. 142A, Alytus, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, bendrasatybinių darbų atlikimui (12,46 proc.).

16.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipėsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 16.1 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo salygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti subrangovą.

16.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

17. GINČU SPRENDIMAS

17.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šali, pereiti prie kito ginčų sprendimo etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta



išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

18. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

18.1. Vykdymamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

18.2. Šalys įspareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.

18.3. Asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:

18.3.1. Užsakovo Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas Mantas Ludavičius.

18.3.2. Rangovo Donatas Poteliūnas.

18.4. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriamas Sutarties dalimi.

18.5. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

18.6. Sutarties priedai:

18.6.1. Priedas Nr. 1 „Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcijos supaprastintas projektas“;

18.6.2. Priedas Nr. 2 „Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcijos darbų, pirkimo pagal parengtus supaprastintus projektus techninė užduotis“;

18.6.3. Priedas Nr. 3 „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“.

19. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Kodas 188718528
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus,
Tel. (8 315) 55 530
A. s. Nr. 657300010129461585
AB „Swedbank“, Alytaus filialas
Kodas 73000

Administracijos direktorė
Jolanta Kručkauskaitė



Rangovas

UAB „Alkesta“
Kodas 249672710
Naujoji g. 118, LT-62175, Alytus
Tel. (8 315) 77 755
A. s. Nr. LT467044060001932383
AB SEB bankas
Kodas 70440


Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Eugenijus Palavinskas



Buhalerinės apskaitos
skyriaus vedėja
DANUTĖ KAŽAKĘVIČIENĖ

Tekėjė ir vidavus
administravimo skyriaus
Vyrusiašala specialistas
Paulius Sarakojis

Komunalinio ūkio
skyriaus vedėja
Mantas Ludavičius



ĮGALIOJIMAS DĖL BENDROVĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO

2018-01-02 Nr. 18-5-2

Alytus

Aš, Rimantas Morkūnas (a. k. 36501260176), UAB „Alkestas“ generalinis direktorius, įmonės kodas 249672710, įmonės registravimo pažymėjimas Nr. 023552, veikiantis pagal bendrovės įstatus, įgalioju generalinio direktoriaus pavaduotoją EUGENIJU PALAVINSKĄ (a. k. 35110280621) pasirašyti uždarosios akcinės bendrovės „Alkestas“ vardu sudaromas ūkinės – komercinės veiklos sutartis.

Vykstant įgaliojimą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.756-6.765 straipsnių nuostatomis.

Įgalojimas galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Generalinis direktorius



Rimantas Morkūnas

Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcijos darbų, pirkimo pagal parengtus supaprastintus projektus

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Bendroji informacija

- 1.1. Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija.
- 1.2. Perkamųjų darbų pavadinimas – Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir gatvių bei šaligatvių rekonstravimo darbai, pagal parengtus supaprastintus projektus, numatyti šioje Techninėje užduotyje.
- 1.3. Perkamųjų darbų tikslas – pagal parengtus supaprastintus projektus atlikti Alytaus rajono Miroslavo kaimo K. Berilio gatvės (AL7347), Skaržinskų gatvės (AL7346), Vienuolyno gatvės (AL7344) ruožo nuo 0,68 iki 0865 km rekonstravimo darbus ir Vilties gatvės (AL7343) ruožo nuo 0,00 iki 0,31 km rekonstravimo darbus, įrengiant kairėje gatvės pusėje pėsčiųjų taką, ir Mokyklos gatvės (AL7341) ruožo nuo 0,00 iki 0,140 km rekonstravimo darbus, įrengiant dešinėje gatvės pusėje pėsčiųjų taką Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės Dainavos g. įrengimo darbus.
- 1.4. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:
 - mažiausia kaina;
- 1.5. Darbų atlikimo terminas: 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.
- 1.6. Sutartis pasirašoma gavus finansavimą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą“.
- 1.7. Iki nurodyto termino neatlikus darbų už kiekvieną uždelstą dieną bus taikoma 200,00 Eur dydžio bauda.

2. Perkamų darbų aprašymas

- 2.1. Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir gatvių bei šaligatvių rekonstravimo pagrindiniai darbai:
 - 2.1.1. K. Berilio gatvės (AL7347) vienos eismo juostos 405 m ilgio ruožo* su 3,50 m pločio važiuojamosios dalies su asfaltbetonio danga, po 0,50 m pločio kelkraščiais, grioviais lietaus vandens nuvedimui ir naujų kelio ženklių pastatymu rekonstravimo darbai; kontrolinė-geodezinė nuotrauka; kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas).
 - 2.1.2. Skardžinskų gatvės (AL7346) vienos eismo juostos 348 m ilgio ruožo* su 3,0÷4,0 m pločio važiuojamosios dalies su asfaltbetonio danga, po 0,50÷1,0 m pločio kelkraščiais, grioviais lietaus vandens nuvedimui ir naujų kelio ženklių pastatymu rekonstravimo darbai; kontrolinė-geodezinė nuotrauka; kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas).
 - 2.1.3. Vienuolyno gatvės (AL7344) vienos eismo juostos 185 m ilgio ruožo* su 4,0 m pločio važiuojamosios dalies su asfaltbetonio danga, po 1,0 m pločio kelkraščiais, grioviais lietaus vandens nuvedimui ir naujų kelio ženklių pastatymu rekonstravimo darbai; kontrolinė-geodezinė nuotrauka; kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas).
 - 2.1.4. Vilties gatvės (AL7343) 299 m ilgio* pėsčiųjų tako kairėje pusėje ir 126 m ilgio* pėsčiųjų tako Mokyklos gatvėje (AL7341) dešinėje pusėje, taip pat 25 m ilgio* pėsčiųjų tako valstybineje žemėje prie Mokyklos gatvės rekonstrukcija, demontuojant senas pėsčiųjų takų dangas ir įrengiant naujas iš betoninių trinkelius. Gatvių važiuojamosios dalies asfaltbetonio dangos prie kelio borto atstatymas. Transporto priemonių judėjimo krypties Vilties ir Mokyklos gatvių sankryžoje koregavimas. Vilties gatvės dangos defektų, atsiradusių paklojus gatvėje inžinerinius tinklus, remontas; kontrolinė-geodezinė nuotrauka; kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas); naujų kelio ženklių pastatymu.
 - 2.1.5. Naujos multifunkcinės sporto aikštės 16,0x29,0 m, plotas 464 m² su metalinio tinklo Ø5 sekcijine tvora 99 m įrengimas, aikštės paviršius padengiamas specialia liejama besiūle gumos granulių danga ant asfaltbetonio pagrindo. 2 vnt. krepšinio stovai su lenta, 1 kompl. du tinklinio-teniso stovai reguliuojami su tinklu su įbetonuojamomis gilzėmis, 1 vnt. mobilus teisėjavimo bokšteliis, 3 vnt. lauko treniruokliai, 1 daugiaufunkcinis karstynių komplektas, 5 suoliukai pagal „Karstynių, lauko treniruoklių, kitos įrangos specifikacija“. Informacinės lentos (stendo) pagal „Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės“ reikalavimus pastatymas, suderinus su Užsakovu.

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

3. Projekto apimtis

- 3.1. K. Berilio gatvės (AL7347) Miroslavo kaime Alytaus rajono savivaldybėje rekonstravimas – 1 kompl.
- 3.2. Skaržinskų gatvės (AL7346) Miroslavo kaime Alytaus rajono savivaldybėje rekonstravimas – 1 kompl.

-
- 3.3. Vienuolyno gatvės (AL7344) Miroslavo kaime Alytaus rajono savivaldybėje ruožo nuo 0,68 iki 0,865 km rekonstravimas – 1 kompl.
 - 3.4. Vilties gatvės (AL7343) ruožo nuo 0,00 iki 0,31 km rekonstravimas, įrengiant kairėje gatvės pusėje pėsčiųjų taką, ir Mokyklos gatvės (AL7341) ruožo nuo 0,00 iki 0,140 km rekonstravimas, įrengiant dešinėje gatvės pusėje pėsčiųjų taką, Miroslavo kaime Alytaus rajono savivaldybejė – 1 kompl.
 - 3.5. Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcijos Dainavos g. 7, Miroslavo k., Alytaus r. sav. – 1 kompl.

Tikslesni duomenys yra pridėtuose preliminariuose žiniaraščiuose ir techniniuose projektuose. Rangovas turi įvertinti savo nuožiūra ir pajegumais kitus nenumatytaus darbus.

Suderinta:

Vyresnjoji Inžinierė
Ineta Jakullenė



PRELIMINARUS DARBU KIEKIU ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė 20170620 K. BERULIO GATVĖ (AL 7347) MIROSLAVO K. ALYTUAS RAJ. SAV.

Statinys 1 K. Berulio gatvė Miroslavo k., Miroslavo sen., Alytaus r. sav.

Žiniaraštis 1 STATYBOS DARBAI

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma objektui EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošamieji darbai						
1	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje		km	0,505		
2	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu budu $k1=0.60, k3=0.000$		vnt.	2,0		
3	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas $k1=0.60, k3=0.000, k9=1.15$		vnt.	1,0		
4	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistiebių atramų rankiniu budu $k1=0.60, k3=0.000$		vnt.	1,0		
5	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas (atr.k.) $k1=0.60, k3=0.000, k9=1.15$		vnt.	1,0		
6	Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško nuvalymas nuo paviršiaus, kai gruntai naturalūs $k9=1.15$		ha	0,01		
7	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais		t	2		
8	Medžių 25-32 cm skersmens pjovimas. $k9=1.15$	100vnt		0,03		
9	Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. $k9=1.15$	100vnt		0,05		
10	Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo daugiau 26cm iki 34cm $k9=1.15$	100vnt		0,08		
11	I grupės grunto (augalinio dirvožemio) kasimas 0.4m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius $k9=1.15$	t. m ³		0,6		
12	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m ³		6,0		
13	Kelio griovių kasimas eksksvat. su 0.4 m ³ kaušu, t. m ³ pakrovimas į autosavivarčius, vežojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje $k9=1.15$			0,234		
14	Šliaity tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntu ir paséjant žoles mechanizuotu būdu $k9=1.15$	100 m ²		11,1		
15	Šliaity tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntu ir paséjant žoles rankiniu būdu $k9=1.15$	100 m ²		2,74		
16	Rezervinio vamzdžio HDPE63 paklojimas telekomunikacijoms $k9=1.15$	100m		0,57		
17	Geberit HDPE vamzdis, Ø63x3,0 mm, l=5 m.	vnt		11,5		
18	Danglis vamzdžiams HDPE Ø 63	vnt		24,0		

19	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte,kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,07
20	Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0,13
21	Sudedamasis apsauginis vamzdis 110/100	m	13,0
22	Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose rankiniu būdu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	4,6
23	Telekomunikacinis kabelis RPPM 1x1x1,2	m	460,0
24	Termosusitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 6-25 mm ²	vnt.	8,0
25	Telekomunikacijų kabelių sujungimo movos SNIM-10/3	vnt	3,0
26	Telekomunikacijų kabelių sujungimo movos SNIM-16/5	vnt	5,0
Skyriuje 1			
2 Vandens pralaidų įrengimas			
1	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšejoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m k9=1.15	km	0,016
2	Pagrindų iš burių medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio) k8=1.03,k9=1.15	m ³	2,4
3	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 500 mm k9=1.15	m	16,0
4	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m ³	6,4
5	0,5m skersmens vandens pralaidos istrižių antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15	vnt.	4,0
Skyriuje 2			
3 Važiuojamosios dalies įrengimas			
1	II grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 10m t. m ³ atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m ³	0,28
2	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmant II grupės gruntu 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-96 k9=1.15	t. m ³	0,28
3	Grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntu į transporto priemones , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m ³	0,233
4	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m ³	2,33
5	5 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas k4=0.500,k9=1.15	100m ²	23,36
6	25 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas k9=1.15	100m ²	23,36
7	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m ²	18,31
8	Kelkraščių sutvirtinimas 11 cm storio gruntu, kai 100 m ² dangos tūris 1100 m ³ k9=1.15	100 m ²	1,3
9	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=1.15,k2=1.25,k8=1.17,k9=1.15	100m ²	15,0
10	Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš sodrinto žvyro, kai 100 m ² dangos tūris 600 m ³ k9=1.15	100 m ²	5,35

11 Pagrindo paruošiamoji arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15
Skyriuje 3

4 Nuovažos

- | | | | |
|----|---|-------------------|-------|
| 1 | Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšejoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšejos gylis iki 1,5m k9=1.15 | km | 0,048 |
| 2 | Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaids įrengimas (smėlio) k8=1.03,k9=1.15 | m ³ | 7,2 |
| 3 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų PP vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15 | m | 48,0 |
| 4 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15 | m ³ | 19,2 |
| 5 | 0,4m skersmens vandens pralaidos įstrižuuj antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15 | vnt. | 12,0 |
| 6 | 5 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas k4=0.500,k9=1.15 | 100m ² | 3,6 |
| 7 | 20 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas k9=1.15 | 100m ² | 3,6 |
| 8 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m ² | 3,41 |
| 9 | 0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 l/h) k8=1.17,k9=1.15 | 100m ² | 2,67 |
| 10 | Pagrindo paruošiamoji arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio žvyro mišinio) k9=1.15 | 100m ³ | 0,447 |

Skyriuje 4

5 Kelio ženklių įrengimas

- | | | | |
|---|--|------|-----|
| 1 | Kelio ženklių vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų atstatymas k1=0.70,k9=1.15 | vnt. | 1,0 |
| 2 | Kelio ženklių skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu | vnt. | 2,0 |
| 3 | Kelio ženklių dvistiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų atstatymas (atr.k.) k1=0.70,k9=1.15 | vnt. | 1,0 |
| 4 | Kelio ženklių skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu budu | vnt. | 1,0 |
| 5 | Kelio ženklių metalinių atramų ant betoninių pamatų PB-3 (60x60x60cm) pastatymas k9=1.15 | | 4,0 |
| 6 | Kelio ženklių skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu | vnt. | 4,0 |
| 7 | Kelio ženklių dvistiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15 | vnt. | 1,0 |
| 8 | Kelio ženklių skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu budu | vnt. | 2,0 |

Skyriuje 5

Vyresnioji inžinierė
Ineta Jakuliienė

PRELIMINARUS DARBU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė 20180514 Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija Dalinavos g. 7, Miroslavo k., Alytaus raj.sav.

Statinys 1 Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija Dalinavos g. 7, Miroslavo k., Alytaus raj.sav.

Žiniaraštis 1 MULTIFUNKCINĖ AIKŠTELĖ

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Krepšinio-tinklinio alkštėlės						
1		Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimui	100 m2	4,64		
2		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntu 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m3	1,85		
3		Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, pereinant savaeigiu volu 4 kartus	100m3	1,392		
4		Pagrindų išlyginamujų ir paruošiamujų sluoksninių iš smėlio įrengimas 25 cm. storio	100m3	1,16		
5		Dolomito skalodos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis)	100m2	4,64		
6		0/8-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	4,64		
7		Sporto salių daugiasluoksnė danga, gruntuojant pagrindą, klijuojant dangą ir suvirinant siūles k1=0.40	m2	464,0		
8		Juostinių (iki 20 cm pločio) paviršių lauke dažymas vienu sluoksniu voletiui	100m2	0,2175		
9		II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesuvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100m3	0,028		
10		Betoniniai stulpiniai pamatai, krepšinio stovams įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtimis)	m3	2,8		
11		Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus t lizdus, užbetonuojant	t	0,048		
12		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0,02		
13		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,02		
14		II gr.grunto kasimas rank.būdu krepšinio stovų pamatams k1=1.20	100m3	0,014		
15		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0,0041		
		Skyriuje 1				
2 Tvorų						
1		Iki 0,7 m gylio duobių statramsčiams ir stulpams gręžimas rankiniu benziniu gręžtuvu , kai grunto grupė II, gražto skersmuo iki 0,2 m	vnt.	40,0		
2		Tvorų iš metalinio tinklo skydų tvėrimas tarp metalinių stulpų be cokolio	m	99,0		
3		Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus	vnt	1,0		
4		Tinklinių tvorų stulpų dažymas miltelinių būdu	100m2	0,4		
5		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio	100m2	7,25		
6		Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	7,25		


Skyriuje 2

3 Sporto įranga

1	Krepšinio stovas su lenta	vnt.	2,0
2	Du tinklinio-teniso stovai reguliuojamai su ižbetonuojamomis gilzėmis	kompl.	1,0
3	Suoliukai	vnt.	5,0
4	Mobilūs teisėjavimo bokšteliai	vnt.	1,0
5	Lauko treniruokliai	vnt.	3,0
6	Daugiafunkcinės karstynės	kompl.	1,0

Skyriuje 3

Vyresnėji inžinierė
Ineta Jakulienė



PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė 20170702 SKARŽINSKŲ GATVĖS MIROSLAVO MST. MIROSLAVO SEN. ALYTAUS RAJ. SAV

Statinys 1 SKARŽINSKŲ GATVĖ MIROSLAVO MST.

Žiniaraštis 1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma objektui EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1		Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje k1=1.60	km	0,348		
2		Kelio ženklių skydų demontavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu k1=0.60,k3=0.000	vnt.	3,0		
3		Kelio ženklių vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas k1=0.60,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	2,0		
4		Kelio ženklių skydų demontavimas prie dvistiebių atramų rankiniu budu k1=0.60,k3=0.000	vnt.	1,0		
5		Kelio ženklių dvistiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas k9=1.15	vnt.	1,0		
6		Vidutinio tankumo krūmų kirtimas rankiniu būdu. k9=1.15	ha	0,01		
7		Medžių 24-32 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,01		
8		Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,04		
9		Kietų veislių medžių iki 34cm skersmens kelmu rovimas 79kW rautuvu-rinkltuvu, duobių užlyg. ir kelmu išvež. iki 300m k9=1.15	100vnt	0,01		
10		Kietų veislių medžių iki 26cm skersmens kelmu rovimas 79kW rautuvu-rinkltuvu, duobių užlyg. ir kelmu išvež. iki 300 m k9=1.15	100vnt	0,04		
11		0,3–0,4 m skersm.vandens pralaidos iš 1,0m ilgio sustipr.g/b vamzdžių demontavimas k1=0.40,k3=0.000,k9=1.15	m	20,0		
12		Kelmu ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	5,0		
13		Transportuojant statybines laužą ir kelmus už kiekvienu papildomą kilometrą pridėti k2=30.00	t	5,0		
14		Savartyno kaina	t	5,0		
15		I grupės augalinio grunto kasimas ir pakrovimas į t. m3 transporto priemones vienakaušais ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,275		
16		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m3	2,75		
17		Griovių kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais , kai gruntas I grupės k9=1.15	t. m3	0,208		
18		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės	100m3	2,08		
19		Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntu ir paséjant žoles mechanizuotu būdu k9=1.15	100 m2	11,1		

20	Šliaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntu ir pasėjant žoles rankiniu būdu k9=1.15	100 m2	2.78
21	Rezervinių polietileninių 63 mm skersmens vamzdžių paklojimas (telekomunikacijoms) k9=1.15	100m	0,2
22	HDPE vamzdis, ilgis 5m, Ø63 mm	vnt	4,0
Skyriuje 1			
2 Vandens pralaidų įrengimas			
1	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšejoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšejos gylis iki 1,5m k9=1.15	km	0,035
2	Pralaidų iš plastikinių gofruolių vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	26,0
3	Gofruoti plastiniai vamzdžiai su apkabomis 400mm vid. skersmens	m	26,0
4	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo 500 mm k9=1.15	m	9,0
5	Gofruoti plastiniai vamzdžiai su apkabomis 500mm vid. skersmens	m	9,0
6	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio) k8=1.03,k9=1.15	m3	5,25
7	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinančiu k9=1.15	m3	14,0
8	Tranšeju, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	0,6
9	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,6
10	0,4m skersmens vandens pralaidos įstrižiųjų antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15	vnt.	6,0
11	0,6m skersmens vandens pralaidos įstrižiųjų antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15	vnt.	2,0
Skyriuje 2			
3 Važiuojamosios dalių įrengimas			
1	II grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,214
2	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmant II grupės gruntu 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-96 k9=1.15	t. m3	0,214
3	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,255
4	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas 25 cm storio iš smėlio k9=1.15	m3	554,0
5	15 cm storio dvisl. pagrindo viršutinio sluoksnio dolomit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15	100m2	14,86
6	Kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas 10 cm storio iš grunto, kai 100 m2 dangos tūris 1000 m3 k9=1.15	100 m2	6,2
7	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	12,57
8	Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio k9=1.15	100 m2	5,87
Skyriuje 3			
4 Nuovažos			

1	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšejoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšejos gylis iki 1,5m k9=1.15	km	0,053
2	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	53,0
3	Gofruoti plastikiniai vamzdžiai su apkabomis 400mm vid. skersmens	m	53,0
4	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio) k8=1.03,k9=1.15	m3	8,13
5	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	21,2
6	Tranšejų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m ³ k9=1.15	100m ³	0,908
7	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m ³	0,908
8	0,4m skersmens vandens pralaidos įstrižiųjų antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15	vnt.	12,0
9	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	58,5
10	15 cm storio dvisl. pagrindo viršutinio sluoksniš dolomit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15	100m ²	2,17
11	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio vienluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m ²	2,02
12	Viensluoksnės 15 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro k9=1.15	100 m ²	1,86

Skyriuje 4

5 Kelio ženklių įrengimas

1	Kelio ženklių vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų atstatymas k9=1.15	vnt.	1,0
2	Kelio ženklių skydų atstatymas prie vienstiebių atramų rankiniu budu	vnt.	1,0
3	Kelio ženklių dvistiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų atstatymas k9=1.15	vnt.	1,0
4	Kelio ženklių skydų atstatymas prie dvistiebių atramų rankiniu budu	vnt.	1,0
5	Kelio ženklių vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	1,0
6	Kelio ženklių skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu	vnt.	2,0
7	Kelio ženklių dvistiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (atr.k.) k9=1.15	vnt.	1,0
8	Kelio ženklių skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu budu	vnt.	2,0

Skyriuje 5

Vyresnėoji inžinierė
Ineta Jakullenė

PRELIMINARUS DARBU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė 20170619 VIENUOLYNO G. MIROSLAVO SEN.

1 Vienuolyno gatvė Miroslavo kaime Miroslavo seniūnijoje Alytaus raj. sav.

Žiniaraštis 1 Vienuolyno gatvė

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1		Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km		0,185	
2		Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu būdu $k1=0.60, k3=0.000$	vnt.		1,0	
3		Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas $k1=0.60, k3=0.000, k9=1.15$	vnt.		1,0	
4		Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistiebių atramų rankiniu būdu $k1=0.60, k3=0.000$	vnt.		2,0	
5		Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas (atr.k.) $k1=0.60, k3=0.000, k9=1.15$	vnt.		2,0	
6		Tankių krūmų kirtimas rank.būdu, kelmų pašalinimas 79kW rautuvu-rinktuvu, krūmų ir kelmų surinkimas į krūvas ir sudeg. $k9=1.15$	ha		0,01	
7		Statybinių šiuokšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t		2,0	
8		Didesnio kaip 32 cm skersmens medžių pjovimas. $k9=1.15$	100vnt		0,03	
9		Medžių 25-32 cm skersmens pjovimas. $k9=1.15$	100vnt		0,01	
10		Kietų veislų medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo daugiau 34cm $k9=1.15$	100vnt		0,03	
11		Kietų veislų medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo daugiau 26cm iki 34cm $k9=1.15$	100vnt		0,01	
12		I grupės grunto (augalino dirvožemio) kasimas t. m ³ 0.4m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius $k9=1.15$	t. m ³		0,19	
13 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m ³		1,9	
14 H07P-1		Kelio griovių kasimas eksksvat. su 0.4 m ³ kaušu, t. m ³ pakrovimas į autosavivarčius, vežojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje $k9=1.15$	t. m ³		0,121	
15		Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntu ir paséjant žoles mechanizuotu būdu $k9=1.15$	100 m ²		7,6	
16		Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntu ir paséjant žoles rankiniu būdu $k9=1.15$	100 m ²		1,9	

Skyriuje 1

2 Vandens pralaidu įrengimas

1	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšejoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšejos gylis iki 1,5m k9=1.15	km	0,009
2	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio) k8=1.03,k9=1.15	m3	1,35
3	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	9,0
4	Vamzdynų pirmenis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	3,6
5	0,4m skersmens vandens pralaidos įstrižiųjų antgaliai įrengimas (1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15	vnt.	2,0

Skyriuje 2

3 Važiuojamosios dalių įrengimas

1	II grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,2
2	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant II grupės gruntu 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-96 k9=1.15	t. m3	0,2
3	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,158
4	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	1,58
5	5 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas k4=0.500,k9=1.15	100m2	13,2
6	20 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas k9=1.15	100m2	13,2
7	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	8,7
8	Kelkraščių sutvirtinimas 11 cm storio gruntu, kai 100 m2 100 m2 dangos tūris 1100 m3 k9=1.15	100 m2	3,92
9	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=1.15,k2=1.25,k8=1.17,k9=1.15	100m2	7,45
10	Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš sodrinto žvyro, kai 100 m2 dangos tūris 600 m3 k9=1.15	100 m2	3,92
11	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	0,24

Skyriuje 3

4 Nuovažos

1	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšejoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšejos gylis iki 1,5m k9=1.15	km	0,048
2	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio) k8=1.03,k9=1.15	m3	7,2
3	Pralaidų iš plastikinių gofruotų PP vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	48,0
4	Vamzdynų pirmenis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	19,2
5	0,4m skersmens vandens pralaidos įstrižiųjų antgaliai įrengimas (1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15	vnt.	12,0

6	5 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas k4=0.500,k9=1.15	100m2	1,8
7	20 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas k9=1.15	100m2	1,8
8	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1,62
9	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storis , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,23
10	Pagrindo paruošiamomo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio žvyro mišinio) k9=1.15	100m3	0,2325

Skyriuje 4

5 Kelio ženklų įrengimas

1	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	1,0
2	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu	vnt.	1,0
3	Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu budu	vnt.	2,0
4	Kelio ženklų metalinių atramų AM-5 (d=76mm, h=300cm) ant betoninių pamatų PB-3 (60x60x60cm) pastatymas k9=1.15		3,0
5	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu	vnt.	3,0
6	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=89mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (atr.k.) k9=1.15	vnt.	2,0
7	Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu budu	vnt.	2,0

Skyriuje 5

Vyresnioji inžinierė
Ineta Jakullenė

PRELIMINARUS DARBU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal kainas

**Statinių grupė 20170704 VILTIES IR MOKYKLOS GATVĖS MIROSLAVO SEN. ALYTAUS RAJ. SAV. KAPITALINIS
REMONTAS**

Statinys 1 VILTIES GATVĖ MIROSLAVO MST.

Žiniaraštis 1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mažo vnt	Kaina	Suma objektui EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1		Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas km trasoje		0,305		
2		Asfaltbetonio dangos iki 100 mm storio sluoksnio 100m ² frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas iki 5 m ² k4=2.000,k9=1.15		0,05		
3		Asfaltbetonio dangos duobių kraštų iška[pojimas, m ² kai remontuojamas plotas iki 5m ² , dangos storis daugiau 50mm k8=1.09,k9=1.15		62,0		
4		Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	100m ²	4,606		
5		Statybinių šiukslių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	77,0		
6		Transportuojant statybines šiuksles už kiekvieną t papildomą kilometrą pridėti k2=50.00	t	77,0		
7		Savartyno išlaidos	t	77,0		
Skyriuje 1						
2 Statinių ir jų dalių statyba ir įrengimas						
1		Mechanizuotas II rg. grunto kasimas, pakraunant 100 m ³ ir vežant gruntu 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15		2,6		
2		Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm vnt skersmens montavimas k9=1.15		1,0		
3		Platikininis dugnas Ø425	vnt	1,0		
4		Stovas 1,2m	vnt	1,0		
5		Incito jungtis Ø425	vnt	2,0		
6		Dangtis Ø425	vnt	1,0		
7		200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0,05		
8		PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt	5,0		
9		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m ³	0,6		
10		Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15	100 m ³	0,1		
11		Mechanizuotas tranšeju ir duobių užpylimas gruntu k9=1.15	100 m ³	0,06		
12		Grunto tankinimas, užpilant tranšejas ir duobes k9=1.15	m ³	6,0		
13		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas į grupės	100m ³	0,06		
14		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio26 cm. storio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m ³	121,0		

15	Betoninių gatvės bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	2,04
16	Bortai GB3-30 (kelio)	vnt.	204,0
17	Betoninių (iavažiavimo) bortų BR 100.22.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	0,98
18	Gatvės bortai (iavažiavimo) GB 100.15.22 (- m3)	vnt	56,0
19	Gatvės bortai (kair., deš.) GB 100.15(22-30) (- m3)	vnt	42,0
20	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono 100 m pagrindo 10 cm. storio k9=1.15		3,32
21	Bortai JB1-20 (vejos)	vnt.	332,0
22	15 cm storio dvisl. pagrindo viršutinio sluoksniš dolomit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15	100m2	4,65
23	6 cm storio pagrindo sluoksnis iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,36
24	Parko takų dangos įrengimas (3 cm storio akmens atsijų sluoksnis) k9=1.15	100m2	4,55
25	Grindinio įrengimas iš betono trinkelii mechanizuotu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k8=1.04,k9=1.15	100m2	3,53
26	Grindinio trinkelės GT 2-6 (natūralios spalvos)	m2	353,0
27	Grindinio įrengimas iš spalvotų betono trinkelii mechanizuotu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k8=1.04,k9=1.15	100m2	0,26
28	Grindinio trinkelės GT 2-6 (raudonas)	m2	26,0
29	Grindinio įrengimas iš betono trinkelii mechanizuotu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k8=1.04,k9=1.15	100m2	0,67
30	Grindinio trinkelės GT 2-8 (natūralios spalvos)	m2	67,0
31	Kelio ženklių vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatių pastatymas k9=1.15	vnt.	2,0
32	Kelio ženklių skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu	vnt.	2,0

Skyriuje 2

Vyresnioji inžinierė
Ineta Jakuliene



PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal kainas

**Statinių grupė 20170704 VILTIES IR MOKYKLOS GATVĖS MIROSLAVO SEN. ALYTAUS RAJ. SAV. KAPITALINIS
REMONTAS**

Statinys 2 MOKYKLOS GATVĖ MIROSLAVO MST.

Žiniaraštis 1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Suma objektui EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošamieji darbai						
1		Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,176		
2		Didesnio kaip 32 cm skersmens medžių pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,01		
3		Kietų veislų medžių iki 34cm skersmens kelmu rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmu išvež. iki 300m k9=1.15	100vnt	0,01		
4		Asfaltbetonio dangos iki 100 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas iki 5 m ² k4=2.000,k9=1.15	100m ²	0,25		
5		Asfaltbetonio dangos duobių kraštų iška[pojimas, m ² kai remontuojamas plotas iki 5m ² , dangos storis daugiau 50mm k8=1.09,k9=1.15		30,0		
6		Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	100m ²	2,571		
7		Statybinių šiukslių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	45,0		
8		Transportuojant statybines šiuksles už kiekvieną t papildomą kilometrą pridėti k2=50.00	t	45,0		
9		Sąvartyno išlaidos Skyriuje 1	t	45,0		
2 Statinių ir jų dalių statyba ir įrengimas						
1		Mechanizuotas II rg. grunto kasimas, pakraunant 100 m ³ ir vežant gruntu 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15		1,3		
2		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 26 cm. storio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m ³	70,0		
3		Betoninių gatvės bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	1,33		
4		Gatvės bortai GB 100.15.30 (- m ³)	vnt	133		
5		Betoninių (javažiavimo) bortų BR 100.22.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	0,21		
6		Gatvės bortai (kair., deš.) GB 100.15(22-30) (- m ³)	vnt	15,0		
7		Gatvės bortai (javažiavimo) GB 100.15.22 (- m ³)	vnt	6,0		
8		Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono 100 m pagrindo 10 cm. storio k9=1.15		1,8		
9		Bortai JB1-20 (vejos)	vnt.	180,0		
10		15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15	100m ²	2,69		

11	6 cm storio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio A, 100m ² B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k ₈ =1.17,k ₉ =1.15		0,31
12	Parko takų dangos įrengimas (3 cm storio akmens atsiųj sluoksnis) k ₉ =1.15	100m ²	2,38
13	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų mechanizuotu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k ₈ =1.04,k ₉ =1.15	100m ²	2,03
14	Grindinio trinkelės GT 2-6 (natūralios spalvos)	m ²	203,0
15	Grindinio įrengimas iš spalvotų betono trinkelų mechanizuotu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k ₈ =1.04,k ₉ =1.15	100m ²	0,14
16	Grindinio trinkelės GT 2-6 (raudonos)	m ²	14,0
17	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų mechanizuotu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k ₈ =1.04,k ₉ =1.15	100m ²	0,2
18	Grindinio trinkelės GT 2-8 (natūralios spalvos)	m ²	20,0
19	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų su juostelių įspėjamaisiais paviršiais (H=6 cm) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k ₉ =1.15	100m ²	0,02
20	Betoninės trinkelės su juostelių įspėjamaisiais paviršiais (H=6cm)	m ²	2,0
21	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų su iškilimu įspėjamaisiais paviršiais rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k ₉ =1.15	100m ²	0,05
22	Betoninės trikelės su iškilimų įspėjančiais paviršiais (H=6 cm)	m ²	0,5

Skyriuje 2

Vyresnioji inžinierė
Ineta Jakulienė

PRELIMINARUS DARBU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė 20180514 Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija Dalinavos g. 7, Miroslavo k., Alytaus raj.sav.

Statinys 1 Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija Dainavos q. 7, Miroslavo k., Alytaus raj.sav.

Žiniaraštis 1 MULTIFUNKCINĖ AIKŠTELĖ

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Krepšinio-tinklinio alkštėlės						
1		Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	4,64		
2		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntu 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m3	1,85		
3		Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, pereinant savaeigiu volu 4 kartus	100m3	1,392		
4		Pagrindų išlyginamujų ir paruošiamujų sluoksnų iš smėlio įrengimas 25 cm. storio	100m3	1,16		
5		Dolomito skalodos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis)	100m2	4,64		
6		0/8-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio st. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	4,64		
7		Sporto salių daugiasluoksnė danga, gruntuojant pagrindą, klijuojant dangą ir suvirinant siūles k1=0.40	m2	464,0		
8		Juostinių (iki 20 cm pločio) paviršių lauke dažymas vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,2175		
9		II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100m3	0,028		
10		Betoniniai stulpiniai pamatai, krepšinio stovams įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtimis)	m3	2,8		
11		Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus t lizdus, užbetonuojant	t	0,048		
12		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0,02		
13		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,02		
14		II gr.grunto kasimas rank.būdu krepšinio stovų pamatams k1=1.20	100m3	0,014		
15		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0,0041		
Skyriuje 1						
2 Tvorā						
1		Iki 0,7 m gylio duobių statramsčiams ir stulpams gręžimas rankiniu benziniu gręžtuviu , kai grunto grupė II, grąžto skersmuo iki 0,2 m	vnt.	40,0		
2		Tvorų iš metalinio tinklo skydų tvėrimas tarp metalinių stulpų be cokolio	m	99,0		
3		Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus	vnt	1,0		
4		Tinklinių tvorų stulpų dažymas miltelinių būdu	100m2	0,4		
5		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio	100m2	7,25		
6		Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	7,25		

Skyriuje 2

3 Sporto įranga




1	Krepšinio stovas su lenta	vnt.	2,0
2	Du tinklinio-teniso stovai reguliuojamai su betonuojamomis gilžėmis	kompl.	1,0
3	Suoliukai	vnt.	5,0
4	Mobilūs teisėjavimo bokšteliai	vnt.	1,0
5	Lauko treniruokliai	vnt.	3,0
6	Daugiafunkcinės karstynės	kompl.	1,0

Skyriuje 3

Vyresnloji inžinierė
Ineta Jakullenė



Karstynių, lauko treniruoklių, kitos įrangos specifikacija

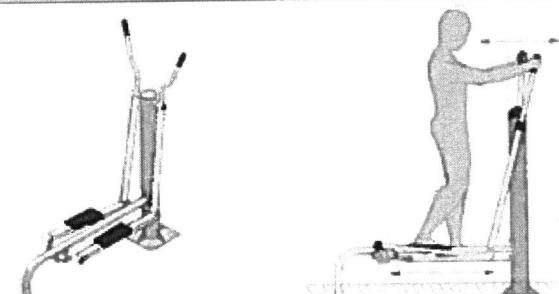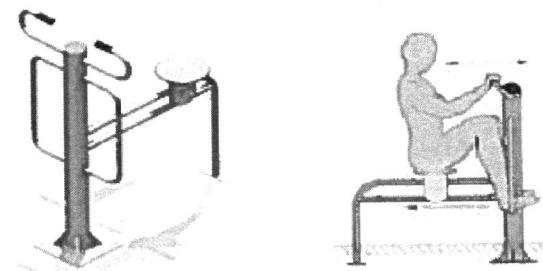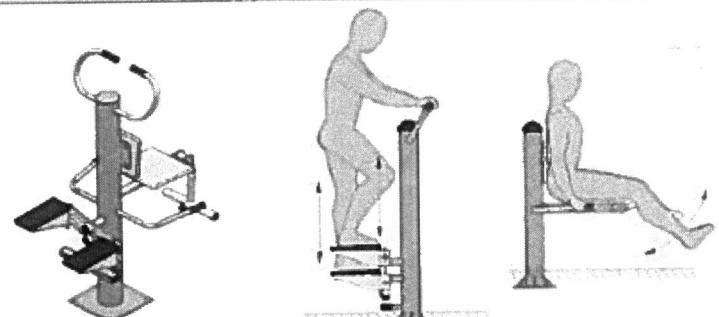Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas	Vizualizacija
1.	Daugiafunkcinis karstynių kompleksas Išmatavimai: L5,96 x B 3,35 x H3,20	
2.	Ėjimo treniruoklis Išmatavimai: L0,76 x B 1,62 x H1,89	
3.	Jojimo treniruoklis Išmatavimai: L1,014 x B 0,854 x H1,235	
4.	Lauko treniruoklis, skirtas kojų raumenų stiprinimui (vienu metu gali treniruotis du žmonės) Išmatavimai: L1,23 x B0,83 x H1,23	
5.	Suoliukai žiūrovams (5 sėdimų vietų) 5 vnt., galima naudoti analogą sudeginus su Užsakovu.	

Karstynės, lauko treniruokliai tvirtinami įbetonuojant.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų prekių, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, kilmė, konkretus procesas, techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška (lygiaverte) tą pačią arba kitą gamintojų produkcija prieš tai suderinus su Užsakovu.

Suderinta:

Vyresnėji inžinierė
Ineta Jakullenė



DRAUDIMO LIUDIJIMAS Nr. 710-451-81454

Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimas

Draudimo grupė: laidavimo draudimas

Draudimo rūšis: laidavimo draudimas

Agentūra: A-V-001

Draudėjas: UAB „ALKESTA“

Įmonės kodas 249672710
NAUJOJI 118, ALYTUS, ALYTAUS R., LIETUVA
Tel.: 8-315 65023; 8-698 07530; 37069880334
El. paštas: info@alkesta.lt
PVM mokėtojo kodas LT496727113

Draudikas: ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius
Tel. 1887, (8 5) 268 3222, faks. (8 5) 268 3005
El. paštas: info@ergo.lt
Įmonės kodas 302912288
PVM mokėtojo kodas 100007345010

Naudos gavėjas: ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Įmonės kodas 188718528
PULKO G. 21, 62135 , ALYTUS, LIETUVA
Tel.: 8-315-55543
El. paštas: sekretore@arsa.lt

Draudimo objektas: Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo prievoju pagal 2018 m. liepos mėn.
12 d. Sutartį Nr. SUT-582 dėl objekto „Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės
sporto aikštės įrengimo ir gatvių bei šaligatvių darbai“ neįvykdymu

Atsakomybės dokumentas: Nr. AT 81454

Draudimo objektas	Draudimo suma, Eur	Draudimo trukmė	Draudimo įmoka, Eur
Atlikimo laidavimas (AT)	17.193,44	2018-07-19 00:00 - 2018-11-18 24:00	72,00
Iš viso:			72,00 Eur

Mokėjimo būdas ir terminai: Vienkartinė iki 2018-07-19

Draudimo taisyklys: Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklys (galioja nuo 2014-08-01) Nr. 029.

Draudimo liudijimas yra išrašytas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

Šis dokumentas patvirtina draudimo sutarties sudarymą:
Pasirašydamas draudimo sutartį ir/ar sumokėdamas (-a) draudimo įmoką (ar pirmają jos dalį), patvirtinu, kad:
- susipažinau su individualiai aptartomis draudimo sutarties sąlygomis, sutinku, kad šios sąlygos būtų draudimo sutarties dalimi, ir
sudarau šią draudimo sutartį;
- esu supažindintas su ERGO Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklys Nr. 029 (patvirtintos ERGO valdybos sprendimui, įsigaliojus nuo 2014-08-01) ir man yra įteikta jų kopija; šiu taisyklių sąlygos man yra
suprantamai išaiškintos ir/ar esu informuotas apie galimybę dėl draudimo sutarties sąlygų papildomai konsultuoti telefonu 1887;
- visi duomenys, nurodyti šiaime dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;
- sutinku gauti su draudimo sutartimi ir jos vykdymu susijusią informaciją ir elektroniniu paštu mano nurodytu elektroninio pašto
adresu.

Alytus, 2018-07-18




ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, Šiaulių Lėmėjų bankas, sąskaita LT204010042400052204 ir sąskaita LT542140030001577156; AB SEB bankas, sąskaita LT957044060001118835;
„Swedbank“ AB, sąskaita LT187300010000176937.
Prasidėjimo pavidyme nurodyti draudimo sutarties numeris 710-451-81454.
Filialo steigėjas ERGO Insurance SE. Įmonės kodas 10017013. PVM kodas EE100295906. Adresas A. H. Tammsaare 47, Talinas 11316, Estijos Respublika.

Priedas prie draudimo liudijimo

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

1. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris yra Draudėjas, naudos gavėjas, apdraustasis, šeimos narys ar kitas Draudėjui prilyginamas asmuo.
2. Draudikas tvarko asmens duomenis, gautus iš Duomenų subjekto:
 - 2.1. draudimo sutarties sudarymo, jos administruavimo, rizikos įvertinimo, draudžiamųjų įvykių tyrimo, draudimo išmokų dydžių nustatymo tikslais, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokų duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies a, b punktais, 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo;
 - 2.2. tiesioginės rinkodaros tikslais, esant Duomenų subjekto sutikimui;
 - 2.3. telefoninio pokalbio garso įrašymo tikslu, siekiant gauti draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo įrodymus 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo.
3. Duomenų subjekto asmens duomenys gali būti teikiami ir gaunami iš valstybės registry, bankų, teisėsaugos institucijų, priešgaisrinės tarnybų, avarinių tarnybų, daugiabučių namų administratorių, daugiabučių namų bendrijų, nepriklausomų ekspertų, sveikatos priežiūros institucijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų, siekiant įvertinti įvykusią draudžiamąjį įvykių aplinkybes ir nustatant draudimo išmokos dydį.
4. Draudikas gali teikti Duomenų subjekto asmens duomenis:
 - 4.1. teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms įstatymu nustatytais atvejais;
 - 4.2. perdraudikams persidraudimo tikslais tiek Lietuvos Respublikoje, tiek kitose valstybėse;
 - 4.3. Duomenų tvarkytojams – įmonėms, teikiančioms Draudikui klientų aptarnavimo ir kitas pridėtinės vertės (administruavimo), asistavimo paslaugās, organizuojant medicinę, finansinę, teisinę ir kitą pagalbą, administruojant Draudiko žalas, dokumentų skenavimą, archyvinį dokumentų (archyvo) tvarkymo ir saugojimo, draudikio informacinių sistemų palaikymo, aptarnavimo paslaugas;
 - 4.4. kitiems duomenų gavėjams Duomenų subjekto sutikimu ar jo prašymu.
5. Duomenų subjektas informuoja, kad jis turi teisę prašyti, kad Draudikas leistų susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Šios teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 nustatytais terminais ir tvarka, išskyrus Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas išimtis.
6. Kai asmens duomenys tvarkomi Reglamento (ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies a punktu, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atsaukti duotą sutikimą.
7. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Draudiko duomenų apsaugos pareigūnų (el. paštu asmensduomenys@ergo.lt arba tel. 1887) visais klausimais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679.
8. Draudikas gali taikyti Duomenų subjekto asmens duomenų atžvilgiu profilavimą šiame skirsnje „Informacija apie asmens duomenų tvarkymą“ nurodytais tikslais. Detalių informacija apie profilavimą yra nurodyta ERGO Privatumo politikoje.
9. Duomenų subjektas, manydamas, kad Reglamentu (ES) 2016/679 nustatytos jo teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirmą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, vadovaujanti Reglamento (ES) 2016/679 77 straipsnio 1 dalimi, bei pasinaudoti teisės gynimo priemonė pagal Reglamento (ES) 2016/679 79 straipsnį.



SUTARTIS Nr. AT 81454

Alytus, 2018-07-18

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą (toliau - Draudikas), kurį atstovauja vadybininkė Ramunė Maskeliūnienė ir UAB "ALKESTA" (toliau - Draudėjas), kurį atstovauja generalinis direktorius Rimantas Morkūnas, susitaria:

1 Sutarties objektas

- 1.1 Draudikas suteikia laidavimo draudimą Naudos gavėjui "ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA", įmonės kodas 188718528, PULKO G. 21, 62135 , ALYTUS, LIETUVA (toliau - Naudos gavėjas), kad Draudėjas išpildys visus reikalavimus, nurodytus atlikimo laidavimo draudimo rašte Nr. AT 81454 dėl 2018 m. liepos mėn. 12 d. Sutarties Nr. SUT-582 (toliau - „Rangos sutartis“) objekto „Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir gatvių bei šaligatvių darbai“ darbų atlikimo.

2 Draudiko pareigos ir teisės

- 2.1 Draudikas įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui jo reikalaujamas sumas iki 17.193,44 EUR (septyniolika tūkstančių šimtas devyniasdešimt trys eurai 44 ct) pagal atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 81454, jeigu Draudėjas neįvykdė arba delsia išvadinti šios sutarties 1.1 punkte minimus reikalavimus.

3 Draudėjo pareigos ir teisės

- 3.1 Už išduotą atlikimo laidavimo draudimą Draudėjas sumoka Draudikui 72,00 EUR įmoką.

- 3.2 Draudėjas įsipareigoja Naudos gavėjui:

- 3.2.1 pagal Rangos sutartį vykdyti numatytais darbų atlikimo sutartinius įsipareigojimus, atitinkančius Rangos sutarties reikalavimus;
- 3.2.2 atlikti Rangos sutartyje numatytais darbų atlikimo įsipareigojimus sutartais terminais;
- 3.2.3 neatiskytai toliau vykdyti pradėtų darbų atlikimo įsipareigojimų pagal Rangos sutartį.

- 3.3 Draudėjas po pirmo raštiško Draudiko reikalavimo įsipareigoja pilnai ir besąlygiškai atlyginti Draudikui jo sumokėtas sumas Naudos gavėjui pagal atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 81454. Draudikas neprivalo pagrasti ar pateikti Draudėjui priežasties, dėl kurios sumokėjo Naudos gavėjui nurodytas sumas.

- 3.4 Draudėjas atlygina Draudikui jo išmokėtās sumas per 5 darbo dienas nuo Draudiko raštiško reikalavimo pateikimo. Pažeidus šį mokėjimo terminą, skaičiuojamai 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną.

- 3.5 Draudėjui nevykdant savo įsipareigojimų pagal šios sutarties 3.1, 3.2 punktus, Draudikui suteikiama teisė išieškoti nesumokėtas sumas iš Draudėjo turimo turto.

- 3.6 Draudėjas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo einamųjų metų ketvirčio pabaigos pateikti Draudikui savo tarpines finansinės atskaitomybės ataskaitas už paskutinį einamųjų metų ketvirtį.

- 3.7 Draudėjas įsipareigoja per 2 darbo dienas nuo raštiško Draudiko prašymo gavimo dienos pateikti Draudikui tinkamai abiejų Rangos sutarties šalių pasirašytus tarpinius atlikų darbų priėmimo-perdavimo aktus už laikotarpi iki Draudiko raštiško pareikalavimo, kuriuose būtų nurodyta faktiškai atlikų darbų vertė nuo Rangos sutarties pradžios.

4 Baigiamosios nuostatos

- 4.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol pasibaigs Draudiko prievolės pagal atlikimo laidavimo draudimo raštą, nurodytą šios sutarties 1.1 punkte, ir šalys visiškai atsiskaitys viena su kita.

- 4.2 Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik raštišku šalių susitarimu.

- 4.3 Sutarties sąlygos yra konfidentialios ir viešai neskelbtinos be kitos šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejus.

- 4.4 Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5 Šalių rekvizitai:

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius
Įmonės kodas 302912288
LT957044060001118835
AB SEB bankas

Vadybininkė Ramunė Maskeliūnienė



UAB "ALKESTA"
NAUJOJI 118, ALYTUS, ALYTAUS R., LIETUVA
Įmonės kodas 249672710
LIETUVOS RESPUBLIKAI
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
* * * ALKESTA * * *
Generalinis direktorius Rimantas Morkūnas
ALYTUS Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Eugenijus Palavinskas

Kopija tikrai
Būro vadove
* "ALKESTA" *
Eglė Marcinkevičiūtė
ALYTUS
2018-07-18

Kam: ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Įmonės kodas 188718528
PULKO G. 21, 62135 , ALYTUS, LIETUVA

Alytus, 2018-07-18

ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS Nr. AT 81454

(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-81454)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-81454.

Draudėjas UAB "ALKESTA", įmonės kodas 249672710, NAUJOJI 118, ALYTUS, ALYTAUS R., LIETUVA (toliau - Draudėjas) pagal 2018 m. liepos mén. 12 d. Sutartį Nr. SUT-582 (toliau - Sutartis) su Naudos gavėju ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (toliau - Naudos gavėjas) įsipareigojo atlikti objekto "Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir gatvių bei šaligatvių darbai" darbus.

Pagal šią Sutartį Jūs reikalaujate, kad Draudėjas kaip užtikrinimą dėl Sutartyje numatyti Draudėjo įsipareigojimų įvykdymo pateiktų Sutartyje nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės išduotą atlikimo laidavimo draudimo raštą.

Atsižvelgiant į ši reikalavimą, mes, ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, įmonės kodas 302912288, Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius (toliau - Draudikas), pareiškiame, kad suteikiame Draudėjui atlikimo laidavimo draudimo raštą ir patvirtiname, kad atsakome Jūsų atžvilgiu už Draudėją, jeigu jis neatliks darbų Sutartyje numatytomis sąlygomis 17.193,44 EUR (septyniolika tūkstančių šimtas devyniasdešimt trys eurai 44 ct) sumai.

Jums tinkamai vykdant Sutartyje numatytius įsipareigojimus, įsipareigojame, gavę Jūsų raštišką pagrįstą reikalavimą, kai Draudėjas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, sumokėti Jūsų nurodytą sumą, atitinkančią patirtų tiesioginių nuostolių dydį dėl Draudėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, tačiau ne didesnę nei Draudėjo pagal Sutartį nevykdytų prievolius vertė, neviršijant bendros 17.193,44 EUR (septyniolika tūkstančių šimtas devyniasdešimt trys eurai 44 ct) draudimo sumos. Laiduojama suma mažėja proporcingai Draudėjo pagal Sutartį įvykdytų statybos darbų sumai. Draudikas neatsako už delspinigius ir baudas, priskaičiuotas pagal Sutartį bei jos nevykdymą dėl neįveikiamos jėgos (Force Majeure) aplinkybių.

Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievoles, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusiu Draudėjo prievolius įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimo raštą galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ir tai jų apimčiai, ką nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštą yra neperleistinas ir nejikeistinas.

Draudikas atlikimo laidavimo draudimo raštu neprisiima tos atsakomybės, kuri būtų prisiimama avansinio apmokėjimo laidavimo draudimo raštu.

Šis laidavimo draudimo raštą įsigalioja 2018 m. liepos mén. 19 d. ir galioja ne ilgiau kaip iki 2018 m. lapkričio mén. 18 d. imtinai. Bet kokie Naudos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Draudiko adresu po laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos. Pasibaigus laidavimo draudimo rašto galiojimo terminui, šis laidavimo draudimo raštą netenka galios, nepriklausomai nuo to, ar laidavimo draudimo raštą grąžinamas Draudikui, ar ne.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas

A. V.

Vadybininkė



Ramunė Maskeliūnienė
