

NEKILNOJAMOJO TURTO REMONTO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2018 m. spalio 25 d. Nr. 2018-P00063
Vilnius

UAB „Vilungės Statyba“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Tomo Andriulio veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinės direktorės Astos Sungailienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas bendrai vadinami šalimis, o atskirai – šalimi, sudaro šią pirkimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi.

1. SUTARTIES PAGRINDAS IR OBJEKTAS

1.1. Sutartis sudaryta, remiantis Rangovo pasiūlymu, kuris 2018 m. spalio 8 d. Užsakovo nekilnojamojo turto remonto darbų pirkimo komisijos posėdžio protokolu Nr. 19 pripažintas laimėjusiu atlikti darbus.

1.2. Sutarties objektas – nekilnojamojo turto objektų statybos darbai (toliau – darbai) **Rytų regione, Pietų regione, Vakarų regione, Šiaurės regione. Pagrindiniai darbai** – bendrieji statybos darbai, kuriuos Rangovas privalės vykdyti pats.

1.3. Preliminarūs darbų aprašymai nurodyti techninės specifikacijos 2 lentelėje. Rangovas privalo vykdyti darbus laikydamasis statybos techniniuose reglamentuose, teisės aktuose bei kituose normatyviniuose dokumentuose tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų. Rangovas savo lėšomis (be papildomo apmokėjimo) turės išsiimti visus leidimus, susijusius su darbų atlikimu.

1.4. Preliminari darbų apimtis yra nurodyta Sutarties 2 priede ir ji gali kisti priklausomai nuo Užsakovo poreikio, neviršijant 2.1 punkte numatytos maksimalios Sutarties vertės. Darbų atlikimo vietos nurodytos Sutarties 1 priedo 1 lentelėje.

1.5. Darbų atlikimo terminas – kiekvieno atskiro užsakymo atveju nurodomas Užsakovo techninės specifikacijos Priede Nr. 1.

1.6. Rangovas darbus privalės atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir pajėgumais (be papildomo apmokėjimo). Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai, turi būti nenaudoti, kokybiški ir sertifikuoti Lietuvoje ir /arba Europos Sąjungoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Rangovas privalo užtikrinti, kad sertifikatai ir kiti dokumentai galioių ir objekto eksploatacijos metu.

1.7. Sutarties 1, 2 prieduose apibūdinant pirkimo objektą, pateiktos nuorodos į konkrečius modelius, šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą yra rekomendacinės, ir savo savybėmis **lygiaverčiai** objektai, medžiagos ir (ar) procesai yra priimtini.

1.8. Rangovas savo lėšomis (be papildomo apmokėjimo) turi išsiimti visus leidimus, susijusius su darbų atlikimu.

1.9. Už Sutarties vykdymą iš Pirkėjo pusės atsakingas –
iš Tiekėjo pusės

1.10. Už pirkimo sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą įstatymu nustatyta tvarka yra atsakinga Pirkėjo atstovė –

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Maksimali Sutarties vertė: be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) 818 700,00:

2.1.1 **Rytų regione** be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) yra 302 000,00 Eur (trys šimtai du tūkstančiai eurų, 00 ct), PVM sudaro 45 420,00 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt eurų, 00 ct), bendra Sutarties kaina su 21 proc. PVM yra 365 420,00 Eur (trys šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt eurų, 00 ct).

2.1.2 **Pietų regione** be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) yra 159 700,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai eurų, 00 ct), PVM sudaro 33 537, 00 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai trisdešimt septyni eurų, 00 ct), bendra Sutarties kaina su 21

proc. PVM yra 193 237,00 00 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai trisdešimt septyni eurų, 00 ct).

2.1.3 **Vakarų regione** be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) yra 154 000,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai eurų, 00 ct), PVM sudaro 32 340,00 Eur (trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt eurų, 00 ct), bendra Sutarties kaina su 21 proc. PVM yra 186 340,00 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt eurų, 00 ct).

2.1.4 **Šiaurės regione** be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) yra 203 000,00 Eur (du šimtai trys tūkstančiai eurų, 00 ct), PVM sudaro 42 630,00 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų, 00 ct), bendra Sutarties kaina su 21 proc. PVM yra 245 630,00 Eur (du šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų, 00 ct).

2.2. Sutarties 1 priede nurodyti darbų įkainiai yra fiksuoti su peržiūra ir vykdant Sutartį negali būti keičiami kitais pagrindais, nei nurodyta Sutarties 2.8 ir 2.9 punktuose.

2.3. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam pridėtinės vertės mokesčio (PVM), kurio apmokestinimo objektu yra laikomi numatomi pirkti darbai, tarifui, PVM yra apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka taikant PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu.

2.4. Užsakovas moka Rangovui už kokybiškai ir laiku atliktus darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, statybos darbų vykdymo dokumentacijos pateikimo ir teisingos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Pagrindas išrašyti PVM sąskaitą – **faktūrą** – abiejų Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytas darbų perdavimo–priėmimo aktas.

2.5. Rangovui už darbus mokama eurai, mokėjimo pavedimu, pervedant pinigus į Rangovo sąskaitą, nurodytą Sutartyje, remiantis gauta teisinga PVM sąskaita faktūra, pagal Sutartyje nurodytą darbų įkainį.

2.6. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis valstybinės įmonės Registro centro informacine sistema „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

2.7. Rangovas prisiima visą riziką, jei padidėja su Sutartimi susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas tampa sudėtingesnis ir (ar) brangesnis (Rangovui padidėja įsipareigojimų vykdymo kaina). Rangovo įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo, pratęsti darbų atlikimo terminų ir atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

2.8. Darbų įkainiai dėl kainų lygio pasikeitimo ar pasikeitus kitiems mokesčiams nebus perskaičiuojami, išskyrus, išskyrus Sutarties 2.3 punkte nurodytą atvejį.

2.9. Įkainiai gali būti perskaičiuoti kas 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių Sutarties galiojimo metu tokia tvarka:

2.9.1. Pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo Sutarties darbų įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo neperskaičiuojami;

2.9.2. Praėjus 12 (dvylika) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną. Darbų įkainiai gali būti perskaičiuojami, kai paskutinis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas statybos sąnaudų elementų kainų pokytis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, viršija 5 (penkis) procentus;

2.9.3. Darbų įkainiai perskaičiuojami (didinami arba mažinami) tiek procentų, koks nurodomas užfiksuotame paskutiniame paskelbtame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statybos sąnaudų elementų kainų pokytis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, tačiau visais atvejais, pokytis negali būti mažesnis nei 5 (penki) procentai;

2.9.4. Įkainiai perskaičiuojami, kai suinteresuota Sutarties šalis raštiškai kreipiasi į kitą Sutarties šalį dėl darbų įkainių perskaičiavimo ir pateikia Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštą apie kainų pokytį. Susitarimas padidinti/sumažinti darbų įkainius (toliau – Susitarimas) įsigalioja surašius jį raštu ir abiem šalims patvirtinus parašais;

2.9.5. Perskaičiuoti įkainiai bus taikomi darbams, kurie bus užsakomi po Susitarimo padidinti/ sumažinti darbų įkainius sudarymo datos.

2.10. Į darbų įkainius turi būti įtraukti visi mokesčiai, mokami Lietuvos Respublikoje, bei įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su darbų atlikimu, įskaitant ir išlaidas, susijusias su kelionėmis, transportavimu, darbo laiku, ir kitos išlaidos, susijusios su tinkamu darbų atlikimu bei Sutarties vykdymu, tame tarpe ir mokėjimo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ kaštai.

2.11. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą arba atlikti atitinkamus išskaičiavimus, jei nustatomi darbų, atliktų pagal Sutartį, trūkumai, Rangovas vėluoja vykdyti arba neatlieka savo įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, arba Rangovui yra priskaičiuotos netesybos ir/ arba atlygintini Užsakovui nuostoliai dėl netinkamo Sutarties vykdymo, arba Rangovui pateiktas reikalavimas atlyginti Užsakovui arba tretiesiems asmenims padarytus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

2.12. Avansiniai mokėjimai Sutartyje nenumatyti.

3. DARBŲ KOKYBĖ, REIKALAVIMAI DARBAMS, DARBŲ GARANTIJA

3.1. Rangovas privalės vykdyti darbus laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

3.2. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus ir Sutarties sąlygas. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai, turi būti nenaudoti, kokybiški ir sertifikuoti Lietuvoje ir /arba Europos Sąjungoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus

3.3. Rangovas privalo nepanaudotas medžiagas, statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Baigęs darbus Rangovas privalo sutvarkyti darbo vietą.

3.4. Rangovui neatlikus Sutarties 3.3 punkte nurodomų veiksmų, Užsakovas turi teisę minimus veiksmus atlikti pats. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti Užsakovui pastarojo patirtas išlaidas bei nuostolius.

3.5. Rangovas privalo vykdyti darbus, laikydamasis statybos techninių reglamentų, statybos normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą.

3.6. Rangovas patvirtina, kad turi teisės aktais nustatytas licencijas, leidimus bei visus kitus būtinus dokumentus, patvirtinančius kvalifikaciją, reikalingus Sutarties 1 priede nurodytiems darbams atlikti.

3.7. Rangovas visiškai atsako už darbų, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir atlygina visus Užsakovo ar trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius.

3.8. Rangovas atliktiems darbams suteikia žemiau šiame punkte nurodyto termino garantijas, kurių terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų pagal Sutartį atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Tuo atveju, jei įstatymai nustato ilgesnius garantijos terminus, taikomi įstatymo nustatyti garantijos terminai. Rangovas suteikia šias garantijas:

3.8.1. garantija atliktiems darbams – 5 (penkeri) metai;

3.8.2. garantija paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų;


3.8.3. garantija medžiagoms, kurios nėra paslėptose statinio konstrukcijose – nustatyta gamintojo garantija (pagal išduotus gamintojo dokumentus), bet ne trumpesnė nei 12 (dvylika) mėnesių.

3.9. Garantija netaikoma, jeigu darbų trūkumai (defektai) atsirado dėl Užsakovo kaltės ir (ar) su Užsakovu susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, ir (ar) nenugalimos jėgos aplinkybių.

3.10. Nustačius defektus (neatitikimus ir pan.) surašomas defektinis aktas, nurodant protingą defekto pašalinimo terminą, kuris negali būti ilgesnis negu 4 (keturios) savaitės.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

4.1. Sutarties įgyvendinimo laikotarpis– 35 mėnesiai arba kol bus išnaudota Sutarties 2.1. punkte nurodyta maksimali Sutarties kaina neviršijant šiame punkte nurodyto Sutarties galiojimo termino.



4.2. Kokybiškai atlikti darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami, pasirašant darbų perdavimo–priėmimo aktą, jeigu galiojančiuose teisės aktuose nenumatyta kitaip.

4.3. Perduodamas darbus Užsakovui, Rangovas įsipareigoja kartu perduoti: sunaudotų medžiagų sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas, sumontuotų įrenginių pasus – anglų arba lietuvių kalba, bandymo protokolus, aktus, išpildomąją dokumentaciją ir/ ar kitus dokumentus privalomus perduoti pagal teisės aktų, Sutarties ar įprastai keliamus reikalavimus – lietuvių kalba. Jei dokumentai yra išduoti kita kalba nei nurodyta, pateikiamas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba Rangovo vadovo parašu ir Rangovo antspaudu.

4.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus, jei nustatomi defektai ir trūkumai, darbai atlikti nesilaikant Sutarties 1 ir 2 prieduose, statybos techniniuose reglamentuose, statybos normatyviniuose dokumentuose ir taisyklėse bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nepateikta 4.1 punkte nurodyta dokumentacija Tokiu atveju nustatyti defektai, trūkumai ar neatitikimai surašyti darbų perdavimo–priėmimo akte, turi būti Rangovo pašalinti per Užsakovo nustatytą protingą terminą Rangovo sąskaita.

4.5. Rangovas privalo įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir perduoti juos Užsakovui (jei šiuos dokumentus Rangovas praranda, jis turi savo lėšomis juos atkurti).

4.6. Darbų terminų nesilaikymas galimas tik dėl trečiųjų šalių, jokiais ryšiais nesusijusių su Rangovu, kaltės, tačiau ir šiuo atveju Rangovas privalo veikti aktyviai ir imtis visų įmanomų priemonių, kad terminų nukėlimas būtų kuo trumpesnis. Darbų atlikimo terminas (atskirai kiekvienos užduoties) pratęsiamas tik tam laikotarpiui, kuriam buvo stabdomas remonto darbų vykdymas dėl trečiųjų šalių, jokiais ryšiais nesusijusių su Rangovu, kaltės.

4.7. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

4.7.1 išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

4.7.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovo teisės ir pareigos:

5.1.1. tinkamai įvykdyti savo prievolę atlikti darbus pagal Sutarties sąlygas ir teisės aktų reikalavimus;

5.1.2. Sutartyje nustatyta tvarka pradėti, atlikti, pabaigti bei perduoti Užsakovui visus užsakyme nurodytus darbus;

5.1.3. informuoti Užsakovą apie darbų vykdymo eigą, pildyti būtiną statybos darbų vykdymo dokumentaciją pagal statybos techninių reglamentų ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Rangovas atlikęs darbus pateikia darbų atlikimo išpildomąją dokumentaciją;

5.1.4. naudoti patalpas tik Sutarties vykdymo tikslu;

5.1.5. netrukdyti įprastinės Užsakovo ar trečiųjų asmenų, veikiančių pastate, veiklos;

5.1.6. atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo, įskaitant, bet neapsiribojant nuostoliais, atsiradusiais dėl netinkamos kokybės darbų atlikimo, defektų šalinimo ir (ar) termino praleidimo, taip pat kitų Rangovo veiksmų (neveikimo), kurie lėmė Užsakovo nuostolių atsiradimą;

5.1.7. Rangovas per Užsakovo nurodytą protingą terminą nepašalinęs defektų (trūkumų), nustatytų darbų priėmimo metu ar per garantinį terminą, atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų (trūkumų) šalinimu, ir dėl darbų defektų (trūkumų) Užsakovo patirtus nuostolius.

5.2. Užsakovo teisės ir pareigos:

5.2.1. Užsakovas, Rangovo ir Užsakovo suderintu laiku, Rangovui tinkamai Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikus ir perdavus darbus Užsakovui, privalo sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą darbų kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

5.2.2. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį laikotarpį darbų defektus (trūkumus) nedelsdamas praneša Rangovui raštu;

5.2.3. Užsakovas perduoda Rangovui patalpas, kur atliekami darbai perdavimo–priėmimo aktu.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Jei viena iš šalių nevykdys arba netinkamai įvykdys Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turės atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius, jei kituose Sutarties punktuose nebus numatyta kitaip.

6.2. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas atlygina Užsakovui visus nuostolius, kurie atsiranda dėl Rangovo veiksmų ir (ar) neveikimo, kai Užsakovas gauna nuomininkų /panaudos gavėjų /bendraturčių/ kompetentingų valstybės institucijų pretenzijas/ kitų trečiųjų asmenų pretenzijas. Rangovas taip pat atlygina Užsakovo ir (ar) trečiųjų asmenų visus nuostolius, jeigu padaroma žala Užsakovo ir (ar) trečiųjų asmenų turtui, Užsakovo darbuotojų ir (ar) trečiųjų asmenų sveikatai ar gyvybei.

6.3. Rangovui vėluojant atlikti kokybiškus, visus reikalavimus atitinkančius darbus pagal Užsakovo užsakyme pateiktą darbų vykdymo grafiką, nuo 1 (vienos) iki 5 (penkių) kalendorinių dienų, Užsakovui pareikalavus raštu, Rangovas moka Užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo grafike numatytų ir neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, kurią buvo pavėluota atlikti darbus pagal grafiką.

6.4. Rangovui, nuo užsakymo pateikimo dienos, vėluojant pateikti sąmatą, grafiką ar pradėti vykdyti darbus daugiau kaip penkias darbo dienas, Užsakovas moka 20 (dvidešimt) Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, kurią buvo pavėluota pateikti sąmatą, grafiką ar pradėti darbus.

6.5. Rangovui vėluojant daugiau nei penkias dienas atlikti ir perduoti kokybiškus, visus reikalavimus atitinkančius darbus per užsakyme pateiktą darbų vykdymo grafiką, Užsakovui pareikalavus raštu, Rangovas nuo vėluojamo užsakymo vertės mokės Užsakovui 10 dešimties procentų dydžio baudą ir 6.3. punkte numatyti delspinigiai.

6.6. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nurodytų Sutarties 2.10 punkte, Sutartyje nustatytu terminu neapmokėjęs Rangovo pateiktos teisingos PVM sąskaitos faktūros, Rangovui pareikalavus raštu, moka Rangovui 0,03 (trijų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

6.7. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

6.8. Šalys susitaria, kad Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, prekių ženklų, licencijų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius Sutartį ir tik Rangovui pateikus Sutarties 7.2 punkte reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius, įskaitant ir apmokėjimo terminą arba kol bus išnaudota Sutarties 2.1. punkte nurodyta maksimali Sutarties kaina, neviršijant šiame punkte nurodyto Sutarties galiojimo termino. Užsakovas, teikdamas užsakymus, įskaitant paskutinį užsakymą, ir nurodydamas užsakymų įvykdymo terminą, įvertina, kad pateikti užsakymai, įskaitant paskutinį užsakymą, turi būti įvykdyti ir už atliktus darbus atsiskaityta iki Sutarties galiojimo (darbų atlikimo ir perdavimo Užsakovui termino nurodyto užsakyme (susitarime)) paskutinės dienos. Sutarties nutraukimas nepanaikins šalių teisės

reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, bei netesybės.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą 21 000 (dvidešimt vieno tūkstančio eurų) Eur sumai Rytų regionui; 11 000 (vienuolikos tūkstančių eurų) Eur sumai Pietų regionui; 10 000 (dešimt tūkstančių eurų) Eur sumai Vakarų regionui; 14 000 (keturiolikos tūkstančių eurų) Eur sumai Šiaurės regionui. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turės galioti visą Sutarties galiojimo terminą. Jei Rangovas neturi galimybės iš karto pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento visam šiame punkte nurodytam laikotarpiui, jis gali pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą dalimis, užtikrinant nepertraukiamą 36 (trisdešimt šešių) mėnesių galiojimą. Rangovas likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki Užsakovui pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos turės pratęsti arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą šiame punkte nurodytai sumai. Pratęsiamas arba pateikiamas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti tiek kartų, kad Sutartis būtų užtikrinta visą jos galiojimo laikotarpį. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateiks pirmojo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, bus laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį (Užsakovui siūlys sudaryti Sutartį antrojoje vietoje sudarytoje pasiūlymų eilėje esančiam Rangovui, kuris atitinka šiose pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus dėl Rangovo pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos), ir Užsakovas įgis teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu. Jeigu Rangovas šiame punkte nustatyta tvarka nepratęs arba nepateiks naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turės teisę skaičiuoti 0,05 proc. nuo Sutarties vertės dydžio delspinigius (kiekvienam regionui) už kiekvieną dieną iki Rangovas pratęs arba pateiks naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą arba Sutartis pasibaigs.. Tokiu atveju Rangovas neturi teisės į jokių reikalavimus ar pretenzijas Užsakovui, netesybų ir kt. skaičiavimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas yra esminė Sutarties sąlyga.

7.3. Jeigu Sutarties 7.2 punkte numatytais atvejais Užsakovas pasinaudoja pasiūlymo galiojimo užtikrinimu ir/ arba Užsakovas, Rangovui pažeidus esmines Sutarties sąlygas, sudaro nutrauktą Sutartį pakeičiančią sutartį, Užsakovas turės teisę reikalauti iš Sutartį pažeidusio pirkimą laimėjusio Užsakovo kainų skirtumo bei kitų vėliau atsiradusių nuostolių atlyginimo, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.258 straipsnio 5 dalyje.

7.4. Jei Rangovas pažeidžia nustatytas prievolės pagal Sutartį ir jos priedus, dalinai ar visiškai prievolių nevykdo (ar netinkamai jas vykdo), Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją/ laidavimą ne mažesnei kaip 7.2 punkte nurodytai sumai. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto/ laiduotojo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją/ laidavimą vykdymui ar apimčiai ir neatleis garanto/ laiduotojo nuo pilnutinio įsipareigojimų vykdymo.

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo rašte negali būti nurodyta, kad išmokamos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos dydis priklauso nuo Užsakovo nuostolių dydžio, tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, Rangovo kaltės formų, kitų objektyvių ar subjektyvių aplinkybių, taip pat negali būti nurodyta, kad užtikrinimo suma mažėja proporcingai Rangovo atliktų darbų sumai. Įvykus bent vienai iš šių sąlygų – Rangovas neįvykdė, dalinai įvykdė ar netinkamai vykdo (įvykdė) sutartinius įsipareigojimus, išmokama Užsakovo reikalaujama suma, neviršijanti 21 000 (dvidešimt vieno tūkstančio eurų) Eur Rytų regionui; 11 000 (vienuolikos tūkstančių eurų) Eur Pietų regionui; 10 000 (dešimt tūkstančių eurų) Eur Vakarų regionui; 14 000 (keturiolikos tūkstančių eurų) Eur Šiaurės regionui.

7.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina šalių teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, bei netesybės.

7.7. Sutartis galės būti nutraukta:

7.7.1. rašytiniu šalių susitarimu;

7.7.2. vienos iš šalių iniciatyva, kitai šaliai nevykdant arba netinkamai vykdamas įsipareigojimus pagal Sutartį, raštu įspėjus kaltąją šalį ir nurodžius Sutarties nutraukimo motyvus ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;

7.7.3. Užsakovo vienašališku pareiškimu apie Sutarties nutraukimą, įspėjus Rangovą ir nurodžius Sutarties nutraukimo motyvus ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų šiais atvejais:

7.7.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Pirkimų įstatymo 97 straipsnį;

7.7.3.2. paaiškėjus, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros *mutatis mutandis* taikant Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, kuri taikoma kartu su Pirkimų įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;

7.7.3.3. paaiškėjus, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES;

7.7.4. Užsakovo vienašališku pareiškimu apie Sutarties nutraukimą, nesant Rangovo kaltės, Užsakovui įspėjus apie tai Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nepaisant to, kad Rangovas jau pradėjo vykdyti Sutartį. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Rangovui tik už iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas paslaugas, jokios kompensacijos ar nuostoliai Rangovui nėra atlyginami.

7.8. Jei Užsakovas ketins nutraukti su Rangovu Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, apie šį sprendimą Užsakovas informuos Rangovą (nurodydamas, dėl kokių esminių sąlygų nevykdymo, netinkamo vykdymo ketina nutraukti Sutartį ir kad tai padaręs ketina įtraukti Rangovą į „Nepatikimų tiekėjų sąrašą“).

8. KITOS SĄLYGOS

8.1. Visi ginčai, kylantys Sutarties pagrindu, bus sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taikiai išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teismuose Vilniuje. Ginčo sprendimui bus taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

8.2. Rangovas negali perduoti savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško Užsakovo sutikimo.

8.3. Sutarties šalys įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš kitos šalies gautos informacijos, ją saugoti tinkamai ir protingai laikantis taikytinų profesinių standartų, naudoti šią informaciją tiksliai vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį, dauginti šią informaciją tiksliai tiek, kiek to reikia vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. Konfidencialumo reikalavimai netaikomi informacijai, kuri yra ar Sutarties galiojimo laikotarpiu tapo viešai žinoma arba teisėtu pagrindu jau yra žinoma Rangovui, arba turi būti atskleista pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. 8.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymui subtiekęjų nepasitelkia.

8.6. Vykdydamas Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų, kurių pajėgumais dalyvaujantis pirkime Rangovas rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) subtiekęjų vykdydysiančių Sutartį, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

8.6.1. Rangovas vykdydamas Sutartį negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi (toliau – ūkio subjektas), kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir (ar) savo pasiūlyme nurodyto specialisto (jais taikoma) be Užsakovo sutikimo. Keičiamas ūkio subjektas ir (ar) specialistas (jei taikoma) turi turėti ne žemesnę, nei nurodyta Rangovo pasiūlyme, kvalifikaciją. Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas (jei taikoma) gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

8.6.1.1. Rangovo ūkio subjektui pradėjus bankroto ar restruktūrizavimo procedūras;

8.6.1.2. Rangovo ūkio subjektui ir (ar) specialistui (jei taikoma) atsisakius vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

8.6.1.3. Rangovo specialistui (jei taikoma) negalint vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl ligos, ar dėl darbo sutarties nutraukimo ar pasibaigimo;

8.6.1.4. Sutarties vykdymo metu Užsakovui pareikalavus pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdys pareigas, nesugebės laikytis Sutarties sąlygų;

8.6.2. Rangovas, siekdamas pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą (jei taikoma), turi raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Rangovas Užsakovui privalo pateikti pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos reikalavimų atitikimą patvirtinančius ūkio subjekto ir (ar) specialisto (jei taikoma) dokumentus. Ūkio subjektui ir (ar) specialistui (jei taikoma) neatitinkant pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja per Užsakovo nustatytą terminą pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą (jei taikoma) reikalavimus atitinkančiais. Užsakovui sutikus su ūkio subjekto ir (ar) specialisto (jei taikoma) pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu sudaro susitarimą dėl ūkio subjekto ir (ar) specialisto (jei taikoma) pakeitimo, kurį pasirašo šalys. Šis susitarimas bus neatskiriama Sutarties dalis;

8.6.3. Rangovas, norėdamas pasitelkti subtiekęjus, kurie nėra ūkio subjektai, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Užsakovui turi pranešti tuo metu žinomų subtiekęjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie šios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekęjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Subtiekęjai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iš anksto nepranešę Užsakovui. Subtiekęjai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Rangovas numatė pasitelkti subtiekęjus, išskyrus atvejus, kai Rangovas pagrindžia, jog nenumatyta Sutarties daliai pasitelkti subtiekęją būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą;

8.6.4. Jeigu Rangovas pasitelks kitą (-us) subtiekęją (-us), ūkio subjektą ir (ar) specialistą (jei taikoma) nei nurodyta jo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje be Užsakovo raštiško sutikimo, tai bus laikoma Sutarties pažeidimu ir Rangovas privalės sumokėti Užsakovui 1 000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio baudą bei atlyginti kitus Užsakovo patirtus nuostolius, įskaitant pirkimo sąlygų 7.3 punkte nurodomus nuostolius, kurių nepadengs bauda. Tokiu atveju Užsakovas taip pat turės teisę nutraukti Sutartį pirkimo sąlygų 7.7.3 punkte nustatyta tvarka.

8.6. Rangovas Sutarties vykdymo metu įsipareigoja nekeisti pasiūlyme nurodytų specialistų be Užsakovo raštiško sutikimo. Sutarties vykdymo metu specialistai galės būti keičiami tik tuo atveju, jei pasiūlyme nurodyti specialistai negalės vykdyti Sutarties dėl nedarbingumo, dėl darbo ar kitos sutarties nutraukimo ar pasibaigimo. Rangovas turės pateikti naujo asmens, siūlomo vietoje Užsakovo patvirtinto specialisto ir atitinkančio keičiamam specialistui keltus kvalifikacinius reikalavimus, kandidatūrą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, kartu pateikiant šio asmens gyvenimo aprašymą (CV) bei kitus atitiktį keltam kvalifikacijos reikalavimui įrodančius dokumentus. Gavus Užsakovo raštišką pritarimą to asmens paskyrimui specialistu, jis privalės būti paskirtas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Rangovas turės atlyginti visas papildomas išlaidas, Užsakovo patirtas dėl specialistų keitimo.

8.7. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio ir Sutarties nustatytais atvejais. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

8.8. Sutartis paviešinama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi.

8.9. Sutartis turi 2 (du) priedus, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:

8.9.1. 1 priedas – „Darbų įkainiai“;

8.9.2. 2 priedas – „Techninė specifikacija“.

10. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

Rangovas

UAB „Vilungės Statyba“
Kapsų g. 96B, LT-44144, Kaunas

Užsakovas

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius



Įmonės kodas 304584210
PVM mokėtojo kodas LT345229113
Tel. 8 37 732362
Faks. -8 37 332492
A. s. LT64 7044 0600 0309 8872
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Direktorius
Tomas Andrius

(parašas)



Įmonės kodas 121215587
PVM mokėtojo kodas LT212155811
Tel. 8 700 55 400
Faks. (8 5) 216 3204
A. s. LT71 7044 0600 0018 7388
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Generalinė direktorė
Asta Sungailienė

(parašas) Data



ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Statinių grupė K001 AB Lietuvos paštas

Statinyss O1 Vakarų regionas

Žiniaraštis S1 Bendrastatybiniai darbai

Suma žiniaraščiui

160547,96

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Tvoros								
1	N7P-0806-2	Metalinio tinklo, segmentinių tvorų įrengimas 1,5 m aukščio K8=1.03	m	6,67	46,02	97,97	2,59	146,58
2	HP8-3-5	Metalinės tvoros perdažymas	10m2	1,00	106,43	8,96	0,00	115,39
3	HP8-3-4	Tvorų stulpų keitimas metaliniais	vnt.	10,00	117,03	116,08	6,76	239,87
Skyriuje					269,48	223,01	9,35	501,84
Turėklai								
4	N7-229	Naujų, dažytų/cinkuotų, metalinių	100m	0,10	144,22	953,61	0,90	1098,73
5	N7-229	Naujų nerūdijančio plieno konstrukcijų turėklų įrengimas K8=1.04	100m	0,10	144,22	953,61	0,90	1098,73
6	A5-343-1	Turėklų metalinių konstrukcijų pakeitimas naujomis K9=1.15	m	10,00	96,92	894,18	22,13	1013,23
7	HP11-4-9	Metaliųjų turėklų perdažymas antikoroziniais dažais, dažant teptuku, nuvalius paviršių rankiniu būdu K9=1.15	10m2	1,00	116,10	24,95	0,00	141,05
8	N10P-0902	Medinių porankių įrengimas	m	10,00	43,26	219,01	0,00	262,27
9	N15-150-1	Porankių iki 100mm pločio geras dažymas	100m	0,10	21,63	6,19	0,00	27,82
Skyriuje					566,35	3051,55	23,93	3641,83
Lauko laiptai, laiptų aikštelės, pandusai								
10	R9-6	Gelžbetonio pakopų keitimas ant laiptasių	m	15,00	188,39	730,24	0,00	918,63
11	R61P-2111-1	Betoninių ir teraco betono plytelių laiptų remontas keičiant plyteles	m2	10,00	517,89	157,01	0,71	675,61
12	R9-10	Gelžbetonio pakopų remontas, užtaisant dideles išmušas	vnt	20,00	160,77	61,78	0,00	222,55
13	F27-15-1	Laiptų remontas nuardant akmens masės plyteles, paruošiant pagrindą ir įrengiant betoninių trinkelų dangą K8=1.03, K9=1.15	100m2	0,50	755,26	802,56	194,67	1752,49
14	N23P-0708-1	Batų valymo grotelių montavimas kai grotelės su vonele ir jungtimi prie vamzdyno K9=1.15	vnt.	2,00	72,11	328,45	0,00	400,56

15	R11-1	Atraminių sienelių tinko apdailos atstatymas K8=1.15, K9=1.15	m2	10,00	182,47	20,61	0,00	203,08
16	R16-113	Laiptų maršus, pakopas bei laiptų aikštelės laikančių mūrinių, metalinių, gelžbetoninių konstrukcijų remontas (atstatymas) K9=1.15	m3	2,50	427,44	275,64	0,00	703,08
17	N51-12	Atraminių sienelių papildomas sutvirtinimas metaliniais profiliais	vnt	4,00	144,22	214,63	7,46	366,31
18	F7-1-2	Metalinių konstrukcijų pandusų, aikštelių įrengimas, kai paviršiaus danga - cinkuotos grotelės	m3	10,00	528,71	4007,01	301,49	4837,21
19	N10-194	Laiptų iš metalinių konstrukcijų įrengimas, kai paviršiaus danga - cinkuotos grotelės	m2	10,00	151,67	756,03	0,00	907,70
Skyriuje					3128,93	7353,96	504,33	10987,22

Durys

20	F10-4-15	Durų keitimas plastiko durimis, išlaužiant mūro užkaičius	m2	18,00	657,69	3863,73	0,00	4521,42
21	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spygnos)	m2	20,00	371,86	2776,27	6,38	3154,51
22	N9P-0705-2	II saugumo klasės "Šarvo" durų montavimas	m2	2,00	50,48	829,54	3,40	883,42
23	F15-10-1	Anksčiau dažytų aklinių durų mūro sienose gerasis dažymas, nuvalant senus dažus, šlifuojant ir glaistant (100m2 durų blokų)	100m2	0,10	273,62	60,94	3,03	337,59
24	R7-68-1	Spygnų keitimas elektroninėmis spygnomis	vnt	10,00	264,90	1008,15	0,00	1273,05
25	R61P-3401-1	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės plieninės durys) (m2 bloko)	m2	20,00	444,72	5412,16	3,25	5860,13
26	R62P-3201-1	Medinių durų blokų keitimas plieniniais "ZK" tipo durų blokais vidinės durys, blokai iki 2 m2	m2	10,00	220,30	1241,61	2,06	1463,97
27	N9-107	Berėmio stiklo durų montavimas su elektromagnetine sklende ir pritaukėju	100m2	0,02	129,79	572,31	8,78	710,88
28	N15-81	Angokraščių aptaisymas sauso tinko lakštais, paruošiant dažymui	100m2	0,10	169,03	38,48	0,00	207,51
29	N2P-0308-6	Durų uždarymo prietaisų montavimas durų pritaukimo įtaisais	vnt.	2,00	25,95	180,41	0,22	206,58
Skyriuje					2608,34	15983,60	27,12	18619,06

Langai

30	F10-4-13	Langų keitimas varstomais plastiko langais, išlaužiant mūro užkaičius ir nekeičiant palangių	m2	10,00	144,22	1032,25	0,00	1176,47
----	----------	--	----	-------	--------	---------	------	---------

31	R7-87	Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, nudaužant tinką, kai angos plotas iki 1 m2	m2	10,00	144,22	1015,15	0,00	1159,37
32	R3-25	Vidaus palangių keitimas naujomis PVC/lmdp palangėmis	m	10,00	117,08	212,47	0,00	329,55
33	R8-51	0,70m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos pakeitimas K1=2	m	10,00	144,22	113,13	2,70	260,05
34	N10-226	Žaliuzių automatinį atidarymo/uždarymo mechanizmų įrengimas	vnt	1,00	22,03	106,82	0,27	129,12
35	N2P-0114-2	Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas kai žaliuzių plotas daugiau 2 m2	vnt.	10,00	246,73	1919,51	2,71	2168,95
36	N20-511	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 5,0m2 šviesoje, montavimas K8=1.02	vnt	10,00	313,85	765,16	0,00	1079,01
37	N15-81	Angokraščių aptaisymas sauso tinko lakštais, paruošiant dažymui	100m2	0,10	216,33	38,48	0,00	254,81
38	A10-101	Medinių langų rėmų ar traukių paviršiaus aukštos kokybės aliejinis dažymas, nuvalant iki 30% senų dažų K1=1.25	10m2	1,00	195,13	5,16	0,00	200,29
39	N13-140	Langų stiklų apklijavimas šilumą absorbuojančia/apsauginė plėvele	m2	10,00	147,96	353,29	0,00	501,25
Skyriuje					1691,77	5561,42	5,68	7258,87

Fasadas

40	R61P-0107-2	Priegrindų remontas, atstatant dangą kai danga betoninių trinkelų K9=1.15	m2	10,00	146,53	124,35	2,36	273,24
41	R11-145	Cokolio tinko apdailos atstatymas K1=1.2, K8=1.09, K9=1.15	100m2	0,10	160,37	378,27	2,74	541,38
42	F60-4-2	Pažeistų fasado dailienčių keitimas ir dažymas parenkant spalvą	100m2	0,10	217,28	319,76	3,44	540,48
43	A8-57	Tinko nudaužymas nuo sienų arba lubų (pavienių vietų iki 5m2) K1=1.2	m2	10,00	34,33	0,00	0,00	34,33
44	F60-5-19	Stambiaplokščių sienų šiltinimas polistir.putplasčiu, tinkuojant plonasl. armuotu dekoratyv.tinku (apšilt.pav.)(be past.) K8=1.03, K9=1.15	m2	100,00	1749,42	1806,35	165,76	3721,53
45	R11-1	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m2 K1=1.2, K8=1.15, K9=1.15	m2	50,00	912,33	103,03	0,00	1015,36
46	R11-9	Fasadų lygaus dekoratyv. (marmuro trupinių) tinko remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas daugiau kaip 5 m2 K8=1.15, K9=1.15	m2	50,00	1479,63	167,78	0,00	1647,41

47	R14-109	Anksčiau dažytų tinkuotų lygių fasadų dažymas 2 kartus silikatiniais dažais, paruošiant paviršių, dirbant ant žemės K9=1.15	100m2	2,00	1315,29	447,71	0,00	1763,00
48	R11-76-18	Fasadų rust. ir grubl. pav. nuvalymas vandeniu su abrazyvais, naudojant aukšto slėgio plovimo įreng. dirbant ant žemės K1=1.5, K2=1.5, K3=1.5, K8=1.15, K9=1.15	100m2	0,10	56,09	9,17	64,30	129,56
49	R3-34	Išorinių atitvarų, kolonų mūro atstatymas K8=1.07, K9=1.15	m2	40,00	2143,57	1498,98	0,00	3642,55
50	HP11-3-12	Gelžbetoninių atitvarų paviršiaus remontas K9=1.15	m2	10,00	122,50	212,16	23,98	358,64
51	N7-254-1	Išorės sienų plokščių horizont. ir vertikalų sandūrų hermetizavimas neketėjančia mastika, dirbant iš montažinių lopšių K9=1.15	100m	0,10	34,63	16,33	4,53	55,49
52	R62P-2102	Mūrinių sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkumus skiediniu K9=1.15	m	10,00	90,85	9,88	0,00	100,73
53	N47-55	Laikinių aptvėrimų montavimas 1 savatės laikotarpiui K3=0.3	100m	0,50	510,69	345,37	0,00	856,06
Skyriuje					8973,51	5439,14	267,11	14679,76
Vidaus patalpos								
54	R62P-2102	Mūrinių sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkumus skiediniu K9=1.15	m	50,00	121,15	49,40	0,00	170,55
55	F15-10-12	Anksčiau dažytų vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100m2	2,00	3764,15	448,74	0,00	4212,89
56	F11-10-1	Akmens masės plytelių dangos klėjimas, išlyginant pagrindą	m2	50,00	951,85	2275,45	0,00	3227,30
57	F11-10-1	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m2	50,00	1189,82	1973,00	0,00	3162,82
58	R61P-2109-1	Keraminių plytelių dangos atskirų vietų remontas, keičiant plyteles kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2, plytelių plotas iki 0,05 m2	m2	1,00	50,97	10,35	0,06	61,38
59	F11-10-3	Linoleumo dangos pakeitimas, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas	m2	200,00	2769,03	5571,52	105,99	8446,54
60	F11-10-2	Linoleumo dangos pakeitimas laminuotomis grindlentėmis, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas	m2	100,00	2076,77	2469,18	49,75	4595,70
61	R14-17	Anksčiau dažytų grindų paprastas aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų	m2	10,00	57,11	9,06	0,00	66,17

62	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas K1=1.2	100m2	0,10	28,84	0,00	0,00	28,84
63	R5-46	Teracinių grindų poliravimas mechanizuotu būdu	100m2	0,10	80,76	0,09	21,99	102,84
64	F9-12-7	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	1,00	2004,66	1624,39	35,56	3664,61
65	N15-85-1	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius K1=1.15	100m2	0,50	576,88	229,45	0,00	806,33
66	F15-1-5	Paviršių aptaisymas gipso kartono pl., užtaisant ir glaistant siūles bei įrengiant 25x50mm tašelių kark., kai sienos nel.	100m2	0,50	995,27	177,62	4,33	1177,22
67	R14-199	Anksčiau dažytų durų, vartų, palangių nuolajų, sijų metalinių paviršių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	10,00	72,11	11,61	0,00	83,72
68	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	10,00	72,11	11,06	0,00	83,17
69	HP5-9-3	Medinių sulūžusių arba supuvusių elementų (medinės dangos, laiptų pakopos) pakeitimas	m2	50,00	1412,81	1083,55	0,00	2496,36
70	N11P-0405-4	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes orientuotų skiedrų plokštes (OSB)	100m2	0,50	144,22	267,42	0,00	411,64
71	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,10	164,68	42,30	0,48	207,46
72	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	200,00	1730,65	2865,27	30,30	4626,22
Skyriuje					18263,84	19119,46	248,46	37631,76
Garažai, Ūkinės paskirties patalos								
73	N9-318	Metallinių vartų demontavimas	m2	3,00	37,28	3,08	25,98	66,34
74	R14-199	Anksčiau dažytų durų, vartų, palangių nuolajų, sijų metalinių paviršių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	3,00	21,63	2,20	0,00	23,83
75	F9-15-2	Segmentinių pakeliamų vartų el. pavara vnt. ir automatika įrengimas	vnt.	1,00	360,55	1543,28	1,95	1905,78
76	N2P-0403-2	Sekcijinių pakeliamų vartų iki 3 m aukščio su susukamų spyruoklių mechanizmu (sąraminis aukštis iki 0,8 m) montavimas kai vartų plotas daugiau 6 m2 iki 9 m2	vnt.	1,00	360,55	2122,42	3,90	2486,87
Skyriuje					780,01	3670,97	31,84	4482,82
Ardymo darbai								
77	N46-153	Sudėtingų skardos stogų išardymas	100m2	0,10	30,29	0,00	0,00	30,29

78	N46-142	Viensluoksnių plastikinių dailienčių išardymas	100m2	0,50	190,37	0,00	0,00	190,37
79	N46-142	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš lentų išardymas	100m2	0,10	44,00	0,00	0,00	44,00
80	R6-2	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu K8=1.17	m3	1,40	119,00	0,00	0,00	119,00
81	N46-133	Mūrinių sienų išardymas K1=1.3, K8=1.17	m3	2,50	222,00	0,00	47,51	269,51
82	N46-140	Monolitinių gelžbetoninių pertvarų išardymas K8=1.17	m3	2,00	240,00	3,09	95,81	338,90
83	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,20	85,12	0,00	61,32	146,44
84	N15-333-2	Fasadinių pastolių, kurių plotis 0.73m ir aukštis iki 30m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	0,50	126,00	50,00	0,00	176,00
85	R62P-5107-3	22 m kėlimo aukščio autobokštelių nuoma	h	15,00	0,00	0,00	477,54	477,54
Skryriuje					1056,78	53,09	682,18	1792,05
Šlaitinių stogų remontas								
86	A5-142-1	Mūrio arba pogeinių netinkamų elementų pakeitimas K1=1.15	m	10,00	139,31	212,79	4,35	356,45
87	A5-141-1	Gegnių konstrukcijos (iš lentų) netinkamų elementų pakeitimas K1=1.15	m	10,00	99,94	40,84	3,11	143,89
88	R61P-2203	Įskilusių gegnių, sijų sutvirtinimas, paremiant spyriais ir sutvirtinant lentomis	vnt.	5,00	108,17	104,98	1,52	214,67
89	R8-3	Gegnėgalių iš tašų pakeitimas	m	10,00	145,37	38,92	0,00	184,29
90	A5-58-1	Vėjalėnčių pakeitimas (sunkiavimo vietose) K1=1.15	m	10,00	36,17	7,40	0,00	43,57
91	A5-154-1	Grebėstavimo su tarpais iš tašelių ir lentų pakeitimas K1=1.15	m2	10,00	66,63	35,08	0,00	101,71
92	A5-113-1	Lubų švaraus lentų pakalimo pakeitimas K1=1.15	m2	10,00	126,19	191,71	0,00	317,90
93	R16-316	Medinių laikančių konstrukcijų iš tašų 100x100mm pakeitimas	m	10,00	124,84	49,37	0,00	174,21
94	R61P-2234-1	Šlaitinių stogų sieninių latakų atskirų vietų keitimas sieniniai latakai su karnizų nuosvyromis	m	10,00	116,53	208,05	0,00	324,58
95	R8-44	Skardinių stogų tarplatakų iki 1,4m pločio iš cinkuotos skardos pakeitimas	m	10,00	112,05	164,85	0,00	276,90
96	R61P-2216	Ugniasienių ir parapetų dangos iš stoginės skardos atskirų vietų keitimas	m2	10,00	72,11	124,45	0,00	196,56
97	N12-141	Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos vnt virš ventiliacijos šachtų su dviem kanalais	vnt	10,00	221,70	533,84	0,00	755,54

98	R61P-2217-1	Šlaitinių stogų kraigų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais skardos lenktais profiliais	m	10,00	115,38	119,87	0,60	235,85
99	R61P-2242-3	Lietaus nuvedimo sistemos latakų laikiklių keitimas dirbant iš autobokštelių	vnt.	10,00	15,60	32,21	37,69	85,50
100	R8-41	Viengubų pakabinamų skardos latakų pakeitimas K1=2	m	10,00	94,33	153,30	0,00	247,63
101	A6-231-1	Lietvamzdžių laikiklių pakeitimas mūrinėse sienose, dirbant iš lopšių K1=1.85	vnt	10,00	139,91	31,84	0,00	171,75
102	R61P-2237-3	Šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų keitimas pagamintais elementais dirbant iš autobokštelių	m	10,00	49,32	121,80	82,63	253,75
103	R61P-2240-3	Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (ilajų) keitimas, gaminant detales dirbant iš autobokštelių	vnt.	10,00	176,24	164,78	69,13	410,15
104	R61P-2250-4	Stogo dangos valymas nuo kerpių, samanų, sąnašų, augalų	100 m2	1,00	432,66	0,00	0,00	432,66
105	R61P-2210-3	Šlaitinių stogų atskirų beasbesčio šiferio lakštų keitimas, dirbant iš autobokštelio lakštai 1250x920 mm	m2	100,00	761,48	1153,54	0,00	1915,02
106	R8-27	Sudėtingų stogų su sieniniais latakais iš cinkuotos skardos pakeitimas, kai stogo plotas iki 10 m2 K1=1.2, K3=1.25	m2	100,00	1180,79	1712,89	0,00	2893,68
107	R62P-5405-1	Šlaitinių stogų dengimas keraminėmis čerpėmis	100m2	0,50	360,56	1372,04	22,01	1754,61
108	R8-59	Prikljuotos 1 stuoksnio ruloninės dangos pakeitimas K1=1.7, K3=2, K8=1.12, K9=1.15	m2	10,00	56,64	131,75	0,00	188,39
109	R8-59-2	Stogelių remontas K1=1.7, K3=2, K8=1.12, K9=1.15	m2	10,00	147,10	4,25	0,00	151,35
110	N12P-0719-2	Plastikinių lauko stogelių įrengimas virš durų kai stogelio ilgis daugiau 1,6 m	m2	10,00	180,28	905,20	1,79	1087,27
111	N10-170	Stoginių įrengimas (m2 horizont. projekcijos)	m2	10,00	836,48	521,04	0,00	1357,52
112	F8-1-28	Dūmtraukių mūrijimas K8=1.12, K9=1.15	m3	3,00	346,13	481,73	57,59	885,45
113	N15-60	Kolonų, aptrauktų vielos tinklu, be karkaso įrengimo, labai geras tinkas K1=1.25, K8=1.09	100m2	0,10	390,00	81,98	3,04	475,02
114	N16-179	Vamzd., kurių D iki 400mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	10,00	316,76	842,19	0,00	1158,95
Skysriuje					6968,67	9542,69	283,46	16794,82

Sutapdintų (plokščių) stogų remontas

115	R8-82	Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.) K1=1.5, K2=1.5, K9=1.15	m2	200,00	432,66	0,00	11,33	443,99
116	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo stogų K9=1.15	100m2	2,00	144,00	0,00	0,00	144,00
117	R8-84	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop. ploto) K8=1.12, K9=1.15	m2	200,00	1297,98	900,12	44,27	2242,37
118	N12P-0715-3	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė K8=1.07, K9=1.15	vnt.	6,00	129,80	199,91	0,00	329,71
119	R61P-2231-1	Plokščių stogų lietaus rinktuvų (įlajų) sandarinimas aptaisant poliesteriniu audiniu K8=1.03, K9=1.15	vnt.	6,00	198,00	157,65	2,22	357,87
120	R61P-2231-2	Lietaus rinktuvo (įlajos) grotelių montavimas K8=1.03, K9=1.15	vnt.	10,00	129,80	156,07	2,43	288,30
121	R61P-2231-1	Plokščių stogų išsikišančių konstrukcijų sandarinimas aptaisant poliesteriniu audiniu K8=1.03, K9=1.15	vnt.	10,00	193,86	201,58	2,43	397,87
122	R62P-5110-3	Plokščių stogų išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių iš birių medžiagų ardymas sluoksniai keramzito	m3	20,00	507,66	0,00	0,00	507,66
123	R8-89	Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje latakų nuolydžio formavimas, kai nuolydis normalus K8=1.12, K9=1.15	m2	10,00	227,86	210,40	2,97	441,23
124	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas K9=1.15	vnt.	10,00	162,14	271,40	0,00	433,54
125	R61P-2233-2	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių atskirų vietų sandarinimas kai stogo danga ritininė sintetinė K8=1.09, K9=1.15	m	50,00	393,72	259,95	17,83	671,50
126	R8-96	1sl. prilydom. ritin. stogo dangos "Mida" klijav. ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.) K1=1.8, K8=1.12, K9=1.15	m2	200,00	1153,76	1444,03	19,44	2617,23
127	R62P-5316-1	Plokščių stogų apšiltinamų polistireniniu putplasčiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas kai plokštės storis 20 mm	100m2	2,00	865,32	534,84	4,54	1404,70
128	R8-96	1sl. prilydom. ritin. stogo dangos "Mida" klijav. ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.) K1=1.8, K8=1.12, K9=1.15	m2	30,00	173,06	226,16	2,92	402,14
129	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0,10	128,00	124,75	0,00	252,75

130	F12-2-4	Parapetų (38 cm pločio) dengimas cinkuota skarda, pritvirtinant medines ir plienines detales	100m	1,00	1191,98	1176,86	11,36	2380,20
131	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0,10	128,00	124,75	0,00	252,75
132	R61P-2242-3	Lietaus nuvedimo sistemos latakų laikiklių keitimas dirbant iš autobokštelių	vnt.	10,00	28,84	26,91	25,86	81,61
133	R8-41	Viengubų pakabinamų skardos latakų pakeitimas K1=2	m	10,00	94,33	189,55	0,00	283,88
134	A6-231-1	Lietvamzdžių laikiklių pakeitimas mūrinėse sienose, dirbant iš lopšių K1=1.85	vnt	10,00	139,91	35,00	0,00	174,91
135	R61P-2237-3	Šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų keitimas pagamintais elementais dirbant iš autobokštelių	m	10,00	49,32	121,79	56,63	227,74
136	R61P-2240-3	Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (lajų) keitimas, gaminant detales dirbant iš autobokštelių	vnt.	10,00	176,24	69,26	69,14	314,64
137	R10-31	Kamino su dviem dūmtakiais antgalių viršaus permūrijimas, pridant iki 50% naujų plytų K8=1.07	vnt	5,00	100,00	196,11	0,00	296,11
138	N15-60	Kolonų, aptrauktų vielos tinklu, be karkaso įrengimo, labai geras tinkas K1=1.25, K8=1.09	100m2	0,10	390,02	71,85	3,04	464,91
139	N34-205	Liuko įrengimas ant stogo	vnt	2,00	246,40	506,46	0,00	752,86
140	A21-11	Pakabinamų kopėčių įrengimas	m	2,00	52,39	77,38	0,00	129,77
Skyriuje					8735,05	7282,78	276,41	16294,24
Viso žiniaraštyje S1					53042,72	77281,67	2359,87	132684,27
PVM 21,00%					11138,97	16229,15	495,57	27863,69
Iš viso					64181,69	93510,82	2855,44	160547,96

Žiniaraštis

S2 Elektrotechnika

Suma žiniaraščiui

21147,69

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skydai								
1	N21-120	Trifazio įvado skydelių montavimas	vnt	5,00	360,55	1961,03	0,00	2321,58
Skyriuje					360,55	1961,03	0,00	2321,58
Šviestuvai								
2	N21-212	Išorės LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,07	100,95	319,81	0,00	420,76
3	N21-243	Iki 4 lempų LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,50	721,10	1902,59	0,00	2623,69
4	N21-242	2 lempų LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,30	432,66	2075,91	0,00	2508,57
5	N21-241	1 lempos LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,10	144,22	836,72	0,00	980,94
6	N21-227	LED pakabinamų šviestuvų	100vnt	0,20	288,44	1685,66	0,00	1974,10
7	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "Įėjimas".	100vnt	0,05	72,11	149,59	0,00	221,70

Skyriuje					1759,48	6970,28	0,00	8729,76
Kabeliai								
8	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai	100m	26,10	1832,77	0,00	127,13	1959,90
9	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki	100m	5,00	1406,15	964,37	0,00	2370,52
10	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100m	5,00	576,88	421,08	0,00	997,96
Skyriuje					3815,80	1385,45	127,13	5328,38
Instaliaciniai gaminiai								
11	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms,	100vnt	0,20	14,42	0,00	0,00	14,42
12	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija	100vnt	1,00	432,66	375,53	0,00	808,19
13	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija	100vnt	0,20	86,53	75,11	0,00	161,64
Skyriuje					533,61	450,64	0,00	984,25
Vamzdžiai ir kitos medžiagos								
14	N21-150	Iki 25mm skersmens polietileninių	100m	0,10	11,54	6,40	0,00	17,94
15	N21-548	Iki 100 A galios automatinio jungiklio	vnt	1,00	19,99	75,46	0,08	95,52
Skyriuje					31,53	81,86	0,08	113,46
Viso žiniaraštyje S2					6500,97	10849,26	127,21	17477,43
PVM 21,00%					1365,20	2278,34	26,71	3670,26
Iš viso					7866,17	13127,60	153,92	21147,69

Žiniaraštis

S3 Elektroniniai ryšiai

Suma žiniaraščiui

6209,18

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Ryšiai								
1	N50-398	Komutacinių spintų surinkimas iš	vnt.	1,00	100,95	520,46	0,14	621,55
2	N50-399	24 lizdų komutatorių montavimas	vnt.	1,00	36,06	294,06	0,00	330,12
3	N50-333	Nepertraukiamo elektros maitinimo	vnt.	1,00	72,11	520,23	0,06	592,40
4	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms	100vnt	0,50	43,00	0,00	0,00	43,00
5	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo	vnt.	76,00	323,55	380,68	4,94	709,17
6	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai	100m	1,00	144,22	0,00	4,87	149,09
7	N21-150	Iki 25mm skersmens polietileninių	100m	1,00	144,22	90,52	0,00	234,74
8	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos	100m	1,00	144,22	54,65	0,00	198,87
9	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100m	10,00	1297,98	737,64	0,00	2035,62
10	R61P-2704-1	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas)	100 m	1,00	185,06	31,61	0,32	216,99
Skyriuje					2491,37	2629,85	10,33	5131,55
Viso žiniaraštyje S3					2491,37	2629,85	10,33	5131,55
PVM 21,00%					523,19	552,27	2,17	1077,63
Iš viso					3014,56	3182,12	12,50	6209,18

Žiniaraštis

S4 ŠVOK

Suma žiniaraščiui

26869,59

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Šildymas								
1	N20-949	Oro užuolaidų iki 6 kW montavimas,	vnt.	3,00	194,70	1081,03	0,40	1276,13
2	R63B-9111-2	Mažo galingumo dujinių katilų	vnt.	3,00	1081,65	4143,69	1,40	5226,74

3	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė	vnt	5,00	36,41	0,00	0,00	36,41
4	N16P-0901-1	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600	vnt.	5,00	108,17	408,74	0,87	517,78
5	N16P-0907-1	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt.	1,00	14,42	97,96	0,09	112,47
6	R19-12	Movinės armatūros nuėmimas, kai	vnt	7,00	16,34	0,00	0,00	16,34
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių	vnt	7,00	35,54	0,40	0,00	35,94
8	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių	vnt	5,00	19,51	63,96	0,00	83,47
9	N16-114-4	Kolektorių demontavimas	vnt.	1,00	28,84	0,00	0,00	28,84
10	N16P-1404	Spintų kolektoriniams mazgams	vnt.	1,00	21,63	63,61	0,11	85,35
11	N16P-0807	Šilumos skaitiklių su movinėmis	vnt.	1,00	29,00	320,63	0,09	349,72
12	F18-10-6	Iki 50 mm skersmens balansinių	vnt.	5,00	22,00	75,29	0,00	97,29
13	N16P-0501-4	Movinės uždarnosios armatūros	vnt.	5,00	23,35	36,49	0,35	60,19
14	N16P-0101-1	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio	m	100,00	456,00	357,00	2,16	815,16
15	N26P-0101-1	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija	100m	1,00	123,31	272,83	0,00	396,14
16	N16P-0201-1	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro	m	100,00	480,00	316,20	3,25	799,45
17	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm,	100m	1,00	97,00	164,99	0,00	261,99
Skyriuje					2787,87	7402,82	8,72	10199,41

Vėdinimas

18	N20P-0604-4	Vėdinimo ir oro kondicionavimo	vnt.	10,00	2432,76	55,81	270,29	2758,86
19	N20P-0314-2	900 mm ilgio apvalių triukšmo	vnt.	1,00	21,63	141,32	0,16	163,11
20	N20P-0205	Buitinės oro pašalinimo instaliacinės	vnt.	2,00	14,43	212,45	0,18	227,06
21	N20P-0201-1	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių	vnt.	1,00	8,60	18,60	0,08	27,28
22	N20P-0207-1	Difuzorių montavimas kai jungties	vnt.	5,00	50,48	33,43	0,00	83,91
23	N20P-0207-2	Difuzorių montavimas kai jungties	vnt.	2,00	20,19	15,49	0,00	35,68
24	N20-507	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi	vnt	1,00	10,22	24,90	0,00	35,12
25	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi	vnt	5,00	38,97	28,88	0,00	67,85
26	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir	vnt	1,00	21,64	19,93	0,00	41,57
27	N20P-0204-1	Buitinių ventiliacijos grotelių	vnt.	2,00	14,42	29,72	0,00	44,14
28	N20-164	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos,	m2	20,00	307,13	491,25	0,00	798,38
29	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos,	m2	20,00	304,59	474,31	0,00	778,90
30	N20P-0113-1	Lankstų gofruotų ortakų (prisijungimų)	vnt.	2,00	12,10	26,58	0,83	39,51
31	F26-1-1	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais	m2	20,00	124,00	88,76	0,00	212,76
Skyriuje					3381,16	1661,43	271,54	5314,13

Oro kondicionavimas

32	N20-973	Kondicionieriaus išorinio agregato	vnt.	5,00	1081,66	2755,95	0,00	3837,61
33	N20P-0803-1	Kondicionierių vidinių kasetinių	vnt.	5,00	198,30	1252,33	0,68	1451,31
34	N16-113	Vidaus vandentiekio vamzdynų	m	50,00	422,97	328,47	0,00	751,44
35	N21-190	Dviejų-trijų gyslių laidų tiesimas	100m	1,50	173,06	119,57	0,00	292,63
36	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm,	100m	0,50	55,78	103,93	0,00	159,71
37	N16P-0201-1	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro	m	20,00	93,05	106,33	0,65	200,03
Skyriuje					2024,82	4666,58	1,33	6692,73

Viso žiniaraštyje S4

8193,85 13730,83 281,59 22206,27

PVM 21,00%

Iš viso

1720,71	2883,47	59,13	4663,32
9914,56	16614,30	340,72	26869,59

Žiniaraštis

S5 Vandentiekis

Suma žiniaraščiui

1633,68

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1	N16P-0201-1	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro m	5,00
2	N26P-0101-1	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija 100m	0,05
3	N16P-0501-1	Movinės uždarnosios armatūros vnt.	2,00
4	N18-76	Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų kompl.	1,00
5	N16P-0805-1	Vandens skaitiklių su movinėmis vnt.	2,00
6	N18-101	Vandens valymo filtro, kurio skersmuo vnt	2,00
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių vnt	2,00
8	N18-165	Iki 20 l talpos tūrinio šildytuvo vnt.	4,00
9	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. K8=1.03 vnt	1,00

Viso žiniaraštyje S5

PVM 21,00%

Iš viso

21,15	38,51	0,16	59,82
6,16	12,60	0,00	18,76
6,80	12,90	0,09	19,79
5,77	5,34	0,00	11,11
37,10	77,72	0,14	114,96
55,47	138,86	0,00	194,33
7,81	9,66	0,00	17,47
324,30	514,61	0,00	838,91
62,27	12,73	0,00	75,00
526,83	822,93	0,39	1350,15

110,63	172,82	0,08	283,53
637,46	995,75	0,47	1633,68

Žiniaraštis

S6 Nuotekos

Suma žiniaraščiui

480,94

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-	m	5,00	22,05	28,31	0,00	50,36
2	N16P-1103-3	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų	vnt.	2,00	4,58	10,48	0,00	15,06
3	N17-8-1	Sifono praustuvui pajungimas	kompl.	1,00	18,75	15,60	0,08	34,43
4	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas	vnt	1,00	54,12	38,45	0,00	92,57
5	N17-33-1	Praustuvės su maišytuvu montavimas,	kompl.	1,00	50,48	154,46	0,11	205,05
Viso žiniaraštyje S6					149,98	247,30	0,19	397,47

PVM 21,00%

Iš viso

31,50	51,93	0,04	83,47
181,48	299,23	0,23	480,94

8 priedas- Įkainotas darbų (veiklų) sąrašas – žiniaraštis.

ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Statinių grupė K001 AB Lietuvos paštas

Statinyss O1 Šiaurės regionas

Žiniaraštis S1 Bendrastatybiniai darbai

Suma žiniaraščiui

160547,96

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Tvoros								
1	N7P-0806-2	Metalinio tinklo, segmentinių tvorų įrengimas 1,5 m aukščio K8=1.03	m	6,67	46,02	97,97	2,59	146,58
2	HP8-3-5	Metalinės tvoros perdažymas	10m2	1,00	106,43	8,96	0,00	115,39
3	HP8-3-4	Tvorų stulpų keitimas metaliniais	vnt.	10,00	117,03	116,08	6,76	239,87
Skyriuje					269,48	223,01	9,35	501,84
Turėklai								
4	N7-229	Naujų, dažytų/cinkuotų, metalinių konstrukcijų turėklų įrengimas K8=1.04	100m	0,10	144,22	953,61	0,90	1098,73
5	N7-229	Naujų nerūdijančio plieno konstrukcijų turėklų įrengimas K8=1.04	100m	0,10	144,22	953,61	0,90	1098,73
6	A5-343-1	Turėklų metalinių konstrukcijų pakeitimas naujomis K9=1.15	m	10,00	96,92	894,18	22,13	1013,23
7	HP11-4-9	Metalinių turėklų perdažymas antikoroziniais dažais, dažant teptuku, nuvalius paviršių rankiniu būdu K9=1.15	10m2	1,00	116,10	24,95	0,00	141,05
8	N10P-0902	Medinių porankių įrengimas	m	10,00	43,26	219,01	0,00	262,27
9	N15-150-1	Porankių iki 100mm pločio geras dažymas	100m	0,10	21,63	6,19	0,00	27,82
Skyriuje					566,35	3051,55	23,93	3641,83
Lauko laiptai, laiptų aikštelės, pandusai								
10	R9-6	Gelžbetonio pakopų keitimas ant laiptasijų	m	15,00	188,39	730,24	0,00	918,63
11	R61P-2111-1	Betoninių ir teraco betono plytelių laiptų remontas keičiant plyteles	m2	10,00	517,89	157,01	0,71	675,61
12	R9-10	Gelžbetonio pakopų remontas, užtaisant dideles išmušas	vnt	20,00	160,77	61,78	0,00	222,55
13	F27-15-1	Laiptų remontas nuardant akmens masės plyteles, paruošiant pagrindą ir įrengiant betoninių trinkelų dangą K8=1.03, K9=1.15	100m2	0,50	755,26	802,56	194,67	1752,49
14	N23P-0708-1	Batų valymo grotelių montavimas kai grotelės su vonele ir jungtimi prie vamzdyno K9=1.15	vnt.	2,00	72,11	328,45	0,00	400,56

15	R11-1	Atraminių sienelių tinko apdailos atstatymas K8=1.15, K9=1.15	m2	10,00	182,47	20,61	0,00	203,08
16	R16-113	Laiptų maršus, pakopas bei laiptų aikštelės laikančių mūrinių, metalinių, gelžbetoninių konstrukcijų remontas (atstatymas) K9=1.15	m3	2,50	427,44	275,64	0,00	703,08
17	N51-12	Atraminių sienelių papildomas sutvirtinimas metaliniais profiliais	vnt	4,00	144,22	214,63	7,46	366,31
18	F7-1-2	Metalinių konstrukcijų pandusų, aikštelių įrengimas, kai paviršiaus danga - cinkuotos grotelės	m3	10,00	528,71	4007,01	301,49	4837,21
19	N10-194	Laiptų iš metalinių konstrukcijų įrengimas, kai paviršiaus danga - cinkuotos grotelės	m2	10,00	151,67	756,03	0,00	907,70
Skyriuje					3128,93	7353,96	504,33	10987,22

Dury								
20	F10-4-15	Durų keitimas plastiko durimis, išlaužiant mūro užkaičius	m2	18,00	657,69	3863,73	0,00	4521,42
21	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spygnos)	m2	20,00	371,86	2776,27	6,38	3154,51
22	N9P-0705-2	II saugumo klasės "Šarvo" durų montavimas	m2	2,00	50,48	829,54	3,40	883,42
23	F15-10-1	Anksčiau dažytų aklinių durų mūro sienose gerasis dažymas, nuvalant senus dažus, šlifuojant ir glaistant (100m2 durų blokų)	100m2	0,10	273,62	60,94	3,03	337,59
24	R7-68-1	Spynų keitimas elektroninėmis spynomis	vnt	10,00	264,90	1008,15	0,00	1273,05
25	R61P-3401-1	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės plieninės durys) (m2 bloko)	m2	20,00	444,72	5412,16	3,25	5860,13
26	R62P-3201-1	Medinių durų blokų keitimas plieniniais "ZK" tipo durų blokais vidinės durys, blokai iki 2 m2	m2	10,00	220,30	1241,61	2,06	1463,97
27	N9-107	Berėmio stiklo durų montavimas su elektromagnetine sklende ir pritraukėju	100m2	0,02	129,79	572,31	8,78	710,88
28	N15-81	Angokraščių aptaisymas sauso tinko lakštais, paruošiant dažymui	100m2	0,10	169,03	38,48	0,00	207,51
29	N2P-0308-6	Durų uždarymo prietaisų montavimas durų pritraukimo įtaisais	vnt.	2,00	25,95	180,41	0,22	206,58
Skyriuje					2608,34	15983,60	27,12	18619,06

Langai								
30	F10-4-13	Langų keitimas varstomais plastiko langais, išlaužiant mūro užkaičius ir nekeičiant palangių	m2	10,00	144,22	1032,25	0,00	1176,47

31	R7-87	Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, nudažant tinką, kai angos plotas iki 1 m2	m2	10,00	144,22	1015,15	0,00	1159,37
32	R3-25	Vidaus palangių keitimas naujomis PVC/Imdp palangėmis	m	10,00	117,08	212,47	0,00	329,55
33	R8-51	0,70m pločio sandrių, palangių nuolajų m ir atskirų kamizų dangos pakeitimas K1=2	m	10,00	144,22	113,13	2,70	260,05
34	N10-226	Žaliuzių automatinių atidarymo/uždarymo mechanizmų įrengimas	vnt	1,00	22,03	106,82	0,27	129,12
35	N2P-0114-2	Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas kai žaliuzių plotas daugiau 2 m2	vnt	10,00	246,73	1919,51	2,71	2168,95
36	N20-511	Įvairių tipų plieninių šampūotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 5,0m2 šviesoje, montavimas K8=1.02	vnt	10,00	313,85	765,16	0,00	1079,01
37	N15-81	Angokraščių aptaisymas sauso tinko lakštais, paruošiant dažymui	100m2	0,10	216,33	38,48	0,00	254,81
38	A10-101	Medinių langų rėmų ar traukių paviršiaus aukštos kokybės aliejinis dažymas, nuvalant iki 30% senų dažų K1=1.25	10m2	1,00	195,13	5,16	0,00	200,29
39	N13-140	Langų stiklų apklėjimas šilumą absorbuojančia/apsaugine plėvele	m2	10,00	147,96	353,29	0,00	501,25
Skyriuje					1691,77	5561,42	5,68	7258,87

Fasadas

40	R61P-0107-2	Priegrindų remontas, atstatant dangą kai danga betoninių trinkelų K9=1.15	m2	10,00	146,53	124,35	2,36	273,24
41	R11-145	Cokolio tinko apdailos atstatymas K1=1.2, K8=1.09, K9=1.15	100m2	0,10	160,37	378,27	2,74	541,38
42	F60-4-2	Pažeistų fasado dailienčių keitimas ir dažymas parenkant spalvą	100m2	0,10	217,28	319,76	3,44	540,48
43	A8-57	Tinko nudažymas nuo sienų arba lubų (pavienių vietų iki 5m2) K1=1.2	m2	10,00	34,33	0,00	0,00	34,33
44	F60-5-19	Stambiaplokščių sienų šiltinimas polistir.putplasčiu, tinkuojant plonasi. armuotu dekoratyv.tinku (apšilt.pav.)(be past.) K8=1.03, K9=1.15	m2	100,00	1749,42	1806,35	165,76	3721,53
45	R11-1	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m2 K1=1.2, K8=1.15, K9=1.15	m2	50,00	912,33	103,03	0,00	1015,36
46	R11-9	Fasadų lygaus dekoratyv. (marmuro trupinių) tinko remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas daugiau kaip 5 m2 K8=1.15, K9=1.15	m2	50,00	1479,63	167,78	0,00	1647,41

47	R14-109	Anksčiau dažytų tinkuotų lygių fasadų dažymas 2 kartus silikatiniais dažais, paruošiant paviršių, dirbant ant žemės K9=1.15	100m2	2,00	1315,29	447,71	0,00	1763,00
48	R11-76-18	Fasadų rust. ir grubl. pav. nuvalymas vandeniu su abrazyvais, naudojant aukšto slėgio plovimo įreng., dirbant ant žemės K1=1.5, K2=1.5, K3=1.5, K8=1.15, K9=1.15	100m2	0,10	56,09	9,17	64,30	129,56
49	R3-34	Išorinių atitvarų, kolonų mūro atstatymas K8=1.07, K9=1.15	m2	40,00	2143,57	1498,98	0,00	3642,55
50	HP11-3-12	Gelžbetoninių atitvarų paviršiaus remontas K9=1.15	m2	10,00	122,50	212,16	23,98	358,64
51	N7-254-1	Išorės sienų plokščių horizont. ir vertikalių sandūrų hermetizavimas neketėjančia mastika, dirbant iš montažinių lopšių K9=1.15	100m	0,10	34,63	16,33	4,53	55,49
52	R62P-2102	Mūrinių sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkimus skiediniu K9=1.15	m	10,00	90,85	9,88	0,00	100,73
53	N47-55	Laikinių aptvėrimų montavimas 1 savaitės laikotarpiui K3=0.3	100m	0,50	510,69	345,37	0,00	856,06
Skyriuja					8973,51	5439,14	267,11	14679,76

Vidaus patalpos

54	R62P-2102	Mūrinių sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkimus skiediniu K9=1.15	m	50,00	121,15	49,40	0,00	170,55
55	F15-10-12	Anksčiau dažytų vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100m2	2,00	3764,15	448,74	0,00	4212,89
56	F11-10-1	Akmens masės plytelių dangos klijavimas, išlyginant pagrindą	m2	50,00	951,85	2275,45	0,00	3227,30
57	F11-10-1	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroiziaciją	m2	50,00	1189,82	1973,00	0,00	3162,82
58	R61P-2109-1	Keraminių plytelių dangos atskirų vietų remontas, keičiant plyteles kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2, plytelių plotas iki 0,05 m2	m2	1,00	50,97	10,35	0,06	61,38
59	F11-10-3	Linoleumo dangos pakeitimas, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas	m2	200,00	2769,03	5571,52	105,99	8446,54
60	F11-10-2	Linoleumo dangos pakeitimas laminuotomis grindlentėmis, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas	m2	100,00	2076,77	2469,18	49,75	4595,70
61	R14-17	Anksčiau dažytų grindų paprastas aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų	m2	10,00	57,11	9,06	0,00	66,17

62	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas K1=1.2	100m2	0,10	28,84	0,00	0,00	28,84
63	R5-46	Teracinių grindų poliravimas mechanizuotu būdu	100m2	0,10	80,76	0,09	21,99	102,84
64	F9-12-7	Dvisluksnių gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	1,00	2004,66	1624,39	35,56	3664,61
65	N15-85-1	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius K1=1.15	100m2	0,50	576,88	229,45	0,00	806,33
66	F15-1-5	Paviršių aptaisymas gipso kartono pl., užtaisant ir glaistant siūles bei įrengiant 25x50mm tašelių kark., kai sienos nel.	100m2	0,50	995,27	177,62	4,33	1177,22
67	R14-199	Anksčiau dažytų durų, vartų, palangių nuolajų, sijų metalinių paviršių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	10,00	72,11	11,61	0,00	83,72
68	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	10,00	72,11	11,06	0,00	83,17
69	HP5-9-3	Medinių sulūžusių arba supuvusių elementų (medinės dangos, laiptų pakopos) pakeitimas	m2	50,00	1412,81	1083,55	0,00	2496,36
70	N11P-0405-4	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes orientuotų skiedrų plokštes (OSB)	100m2	0,50	144,22	267,42	0,00	411,64
71	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,10	164,68	42,30	0,48	207,46
72	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	200,00	1730,65	2865,27	30,30	4626,22
Skyriuje					18263,84	19119,46	248,46	37631,76

Garažai, Ūkinės paskirties patalos								
73	N9-318	Metalinių vartų demontavimas	m2	3,00	37,28	3,08	25,98	66,34
74	R14-199	Anksčiau dažytų durų, vartų, palangių nuolajų, sijų metalinių paviršių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	3,00	21,63	2,20	0,00	23,83
75	F9-15-2	Segmentinių pakeliamų vartų el. pavara vnt. ir automatika įrengimas	vnt.	1,00	360,55	1543,28	1,95	1905,78
76	N2P-0403-2	Sekcijinių pakeliamų vartų iki 3 m aukščio su susukamų spyruoklių mechanizmu (sąraminis aukštis iki 0,8 m) montavimas kai vartų plotas daugiau 6 m2 iki 9 m2	vnt.	1,00	360,55	2122,42	3,90	2486,87
Skyriuje					780,01	3670,97	31,84	4482,82

Ardymo darbai								
77	N46-155	Sudėtingų skardos stogų išardymas	100m2	0,10	30,29	0,00	0,00	30,29

78	N46-142	Viensluoksnių plastikinių dailylenčių išardymas	100m2	0,50	190,37	0,00	0,00	190,37
79	N46-142	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš lentų išardymas	100m2	0,10	44,00	0,00	0,00	44,00
80	R6-2	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu K8=1.17	m3	1,40	119,00	0,00	0,00	119,00
81	N46-133	Mūrinių sienų išardymas K1=1.3, K8=1.17	m3	2,50	222,00	0,00	47,51	269,51
82	N46-140	Monolitinių gelžbetoninių pertvarų išardymas K8=1.17	m3	2,00	240,00	3,09	95,81	338,90
83	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,20	85,12	0,00	61,32	146,44
84	N15-333-2	Fasadinių pastolių, kurių plotis 0,73m ir aukštis iki 30m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	0,50	126,00	50,00	0,00	176,00
85	R62P-5107-3	22 m kėlimo aukščio autobokštelių nuoma	h	15,00	0,00	0,00	477,54	477,54
Skyriuje					1056,78	53,09	682,18	1792,05
Šlaitinių stogų remontas								
86	A5-142-1	Mūroločio arba pogeinių netinkamų elementų pakeitimas K1=1.15	m	10,00	139,31	212,79	4,35	356,45
87	A5-141-1	Gegnių konstrukcijos (iš lentų) netinkamų elementų pakeitimas K1=1.15	m	10,00	99,94	40,84	3,11	143,89
88	R61P-2203	Iškilusių gegnių, sijų sutvirtinimas, paremiant spyriais ir sutvirtinant lentomis	vnt.	5,00	108,17	104,98	1,52	214,67
89	R8-3	Gegnėgalių iš tašų pakeitimas	m	10,00	145,37	38,92	0,00	184,29
90	A5-58-1	Vėjalėnčių pakeitimas (sunkymo vietose) K1=1.15	m	10,00	36,17	7,40	0,00	43,57
91	A5-154-1	Grebėstavimo su tarpais iš tašelių ir lentų pakeitimas K1=1.15	m2	10,00	66,63	35,08	0,00	101,71
92	A5-113-1	Lubų švaraus lentų pakalimo pakeitimas K1=1.15	m2	10,00	126,19	191,71	0,00	317,90
93	R16-316	Medinių laikančių konstrukcijų iš tašų 100x100mm pakeitimas	m	10,00	124,84	49,37	0,00	174,21
94	R61P-2234-1	Šlaitinių stogų sieninių latakų atskirų vietų keitimas sieniniai latakai su karnizų nuosvyromis	m	10,00	116,53	208,05	0,00	324,58
95	R8-44	Skardinių stogų tarplatakų iki 1,4m pločio iš cinkuotos skardos pakeitimas	m	10,00	112,05	164,85	0,00	276,90
96	R61P-2216	Ugniasienių ir parapetų dangos iš stoginės skardos atskirų vietų keitimas	m2	10,00	72,11	124,45	0,00	196,56
97	N12-141	Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos vnt virš ventiliacijos šachtų su dviem kanalais	vnt	10,00	221,70	533,84	0,00	755,54

98	R61P-2217-1	Šlaitinių stogų kraigų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais skardos lenktais profiliais	m	10,00	115,38	119,87	0,60	235,85
99	R61P-2242-3	Lietaus nuvedimo sistemos lataų laikiklių keitimas dirbant iš autobokštelių	vnt.	10,00	15,60	32,21	37,69	85,50
100	R8-41	Viengubų pakabinamų skardos lataų pakeitimas K1=2	m	10,00	94,33	153,30	0,00	247,63
101	A6-231-1	Lietvamzdžių laikiklių pakeitimas mūrinėse sienose, dirbant iš lopšių K1=1.85	vnt	10,00	139,91	31,84	0,00	171,75
102	R61P-2237-3	Šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų keitimas pagamintais elementais dirbant iš autobokštelių	m	10,00	49,32	121,80	82,63	253,75
103	R61P-2240-3	Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (lajų) keitimas, gaminant detales dirbant iš autobokštelių	vnt.	10,00	176,24	164,78	69,13	410,15
104	R61P-2250-4	Stogo dangos valymas nuo kerpių, samanų, sąnašų, augalų	100 m2	1,00	432,66	0,00	0,00	432,66
105	R61P-2210-3	Šlaitinių stogų atskirų beasbesčio šiferio lakštų keitimas, dirbant iš autobokštelio lakštai 1250x920 mm	m2	100,00	761,48	1153,54	0,00	1915,02
106	R8-27	Sudėtingų stogų su sieniniais latakais iš cinkuotos skardos pakeitimas, kai stogo plotas iki 10 m2 K1=1.2, K3=1.25	m2	100,00	1180,79	1712,89	0,00	2893,68
107	R62P-5405-1	Šlaitinių stogų dengimas keraminėmis čerpėmis	100m2	0,50	360,56	1372,04	22,01	1754,61
108	R8-59	Prikljuotos 1 sluoksnio ruloninės dangos pakeitimas K1=1.7, K3=2, K8=1.12, K9=1.15	m2	10,00	56,64	131,75	0,00	188,39
109	R8-59-2	Stogelių remontas K1=1.7, K3=2, K8=1.12, K9=1.15	m2	10,00	147,10	4,25	0,00	151,35
110	N12P-0719-2	Plastikinių lauko stogelių įrengimas virš durų kai stogelio ilgis daugiau 1,6 m	m2	10,00	180,28	905,20	1,79	1087,27
111	N10-170	Stoginių įrengimas (m2 horizont. projekcijos)	m2	10,00	836,48	521,04	0,00	1357,52
112	F8-1-28	Dūmtraukių mūrijimas K8=1.12, K9=1.15	m3	3,00	346,13	481,73	57,59	885,45
113	N15-60	Kolonų, aptrauktų vielos tinklu, be karkaso įrengimo, labai geras tinkas K1=1.25, K8=1.09	100m2	0,10	390,00	81,98	3,04	475,02
114	N16-179	Vamzd., kurių D iki 400mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	10,00	316,76	842,19	0,00	1158,95
Skyriuje					6968,67	9542,69	283,46	16794,82

Sutapdintų (plokščių) stogų remontas

115	R8-82	Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.) K1=1.5, K2=1.5, K9=1.15	m2	200,00	432,66	0,00	11,33	443,99
116	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo stogų K9=1.15	100m2	2,00	144,00	0,00	0,00	144,00
117	R8-84	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjauinant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop ploto) K8=1.12, K9=1.15	m2	200,00	1297,98	900,12	44,27	2242,37
118	N12P-0715-3	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritininę dangą, kai stogo danga bituminė K8=1.07, K9=1.15	vnt.	6,00	129,80	199,91	0,00	329,71
119	R61P-2231-1	Plokščių stogų lietaus rinktuvų (įlajų) sandarinimas aptaisant poliesteriniu audiniu K8=1.03, K9=1.15	vnt.	6,00	198,00	157,65	2,22	357,87
120	R61P-2231-2	Lietaus rinktuvo (įlajos) grotelių montavimas K8=1.03, K9=1.15	vnt.	10,00	129,80	156,07	2,43	288,30
121	R61P-2231-1	Plokščių stogų išsikišančių konstrukcijų sandarinimas aptaisant poliesteriniu audiniu K8=1.03, K9=1.15	vnt.	10,00	193,86	201,58	2,43	397,87
122	R62P-5110-3	Plokščių stogų išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių iš birių medžiagų ardymas sluoksniai keramzito	m3	20,00	507,66	0,00	0,00	507,66
123	R8-89	Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje latakų nuolydžio formavimas, kai nuolydis normalus K8=1.12, K9=1.15	m2	10,00	227,86	210,40	2,97	441,23
124	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas K9=1.15	vnt.	10,00	162,14	271,40	0,00	433,54
125	R61P-2233-2	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių atskirų vietų sandarinimas kai stogo danga ritininė sintetinė K8=1.09, K9=1.15	m	50,00	393,72	259,95	17,83	671,50
126	R8-96	1sl.prilydom.ritin.stogo dangos"Mida"kljav.ant sutvarkyto pagr.,aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.) K1=1.8, K8=1.12, K9=1.15	m2	200,00	1153,76	1444,03	19,44	2617,23
127	R62P-5316-1	Plokščių stogų, apšiltinamų polistireniniu putplasčiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas kai plokštės storis 20 mm	100m2	2,00	865,32	534,84	4,54	1404,70
128	R8-96	1sl.prilydom.ritin.stogo dangos"Mida"kljav.ant sutvarkyto pagr.,aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.) K1=1.8, K8=1.12, K9=1.15	m2	30,00	173,06	226,16	2,92	402,14
129	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0,10	128,00	124,75	0,00	252,75

130	F12-2-4	Parapetų (38 cm pločio) dengimas cinkuota skarda, pritvirtinant medines ir plienines detales	100m	1,00	1191,98	1176,86	11,36	2380,20
131	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0,10	128,00	124,75	0,00	252,75
132	R61P-2242-3	Lietaus nuvedimo sistemos latakų laikiklių keitimas dirbant iš autobokštelių	vnt.	10,00	28,84	26,91	25,86	81,61
133	R8-41	Viengubų pakabinamų skardos latakų pakeitimas K1=2	m	10,00	94,33	189,55	0,00	283,88
134	A6-231-1	Lietvamzdžių laikiklių pakeitimas mūrinėse sienose, dirbant iš lopšių K1=1.85	vnt	10,00	139,91	35,00	0,00	174,91
135	R61P-2237-3	Šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų keitimas pagamintais elementais dirbant iš autobokštelių	m	10,00	49,32	121,79	56,63	227,74
136	R61P-2240-3	Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (įlajų) keitimas, gaminant detales dirbant iš autobokštelių	vnt.	10,00	176,24	69,26	69,14	314,64
137	R10-31	Kamino su dviem dūmtakiais atgalių viršaus permūrijimas, pridėdant iki 50% naujų plytų K8=1.07	vnt	5,00	100,00	196,11	0,00	296,11
138	N15-60	Kolonų, aptrauktų vielos tinklu, be karkaso įrengimo, labai geras tinkas K1=1.25, K8=1.09	100m2	0,10	390,02	71,85	3,04	464,91
139	N34-205	Liuko įrengimas ant stogo	vnt	2,00	246,40	506,46	0,00	752,86
140	A21-11	Pakabinamų kopėčių įrengimas	m	2,00	52,39	77,38	0,00	129,77
Skyriuje					8735,05	7282,78	276,41	16294,24
Viso žiniaraštyje S1					53042,72	77281,67	2359,87	132684,27
PVM 21,00%					11138,97	16229,15	495,57	27863,69
Iš viso					64181,69	93510,82	2855,44	160547,96

Žiniaraštis

S2 Elektrotechnika

Suma žiniaraščiui

21147,69

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skydai								
1	N21-120	Trifazio įvado skydelių montavimas	vnt	5,00	360,55	1961,03	0,00	2321,58
Skyriuje					360,55	1961,03	0,00	2321,58
Šviestuvai								
2	N21-212	Išorės LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,07	100,95	319,81	0,00	420,76
3	N21-243	Iki 4 lempų LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,50	721,10	1902,59	0,00	2623,69
4	N21-242	2 lempų LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,30	432,66	2075,91	0,00	2508,57
5	N21-241	1 lempos LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,10	144,22	836,72	0,00	980,94
6	N21-227	LED pakabinamų šviestuvų	100vnt	0,20	288,44	1685,66	0,00	1974,10
7	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas"	100vnt	0,05	72,11	149,59	0,00	221,70

Skyriuje					1759,48	6970,28	0,00	8729,76
Kabeliai								
8	N50-359	Vagų išskirtimas vagotuvu paslėptai	100m	26,10	1832,77	0,00	127,13	1959,90
9	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki	100m	5,00	1406,15	964,37	0,00	2370,52
10	N21-191	Dviejų-trijų gyslių laidų tiesimas	100m	5,00	576,88	421,08	0,00	997,96
Skyriuje					3815,80	1385,45	127,13	5328,38
Instaliaciniai gaminiai								
11	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms	100vnt	0,20	14,42	0,00	0,00	14,42
12	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija	100vnt	1,00	432,66	375,53	0,00	808,19
13	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija	100vnt	0,20	86,53	75,11	0,00	161,64
Skyriuje					533,61	450,64	0,00	984,25
Vamzdžiai ir kitos medžiagos								
14	N21-150	Iki 25mm skersmens polietileninių	100m	0,10	11,54	6,40	0,00	17,94
15	N21-548	Iki 100 A galios automatinio jungiklio	vnt	1,00	19,99	75,46	0,08	95,52
Skyriuje					31,53	81,86	0,08	113,46
Viso žiniaraštyje S2					6500,97	10849,26	127,21	17477,43
PVM 21,00%					1365,20	2278,34	26,71	3670,26
Iš viso					7866,17	13127,60	153,92	21147,69

Žiniaraštis

S3 Elektroniniai ryšiai

Suma žiniaraščiui

6209,18

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Ryšiai								
1	N50-398	Komutacinių spintų surinkimas iš	vnt.	1,00	100,95	520,46	0,14	621,55
2	N50-399	24 lizdų komutatorių montavimas	vnt.	1,00	36,06	294,06	0,00	330,12
3	N50-333	Nepertraukiamo elektros maitinimo	vnt.	1,00	72,11	520,23	0,06	592,40
4	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms	100vnt	0,50	43,00	0,00	0,00	43,00
5	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo	vnt.	76,00	323,55	380,68	4,94	709,17
6	N50-359	Vagų išskirtimas vagotuvu paslėptai	100m	1,00	144,22	0,00	4,87	149,09
7	N21-150	Iki 25mm skersmens polietileninių	100m	1,00	144,22	90,52	0,00	234,74
8	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos	100m	1,00	144,22	54,65	0,00	198,87
9	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100m	10,00	1297,98	737,64	0,00	2035,62
10	R61P-2704-1	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas),	100 m	1,00	185,06	31,61	0,32	216,99
Skyriuje					2491,37	2629,85	10,33	5131,55
Viso žiniaraštyje S3					2491,37	2629,85	10,33	5131,55
PVM 21,00%					523,19	552,27	2,17	1077,63
Iš viso					3014,56	3182,12	12,50	6209,18

Žiniaraštis

S4 ŠVOK

Suma žiniaraščiui

26869,59

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Šildymas								
1	N20-948	Oro užuolaidų iki 6 kW montavimas	vnt.	3,00	194,70	1081,03	0,40	1276,13
2	R63P-9111-2	Mažo galimumo dujinių katilų	vnt.	3,00	1081,65	4143,69	1,40	5226,74

3	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė	vnt	5,00	36,41	0,00	0,00	36,41
4	N16P-0901-1	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600	vnt.	5,00	108,17	408,74	0,87	517,78
5	N16P-0907-1	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt.	1,00	14,42	97,96	0,09	112,47
6	R19-12	Movinės armatūros nuėmimas, kai	vnt	7,00	16,34	0,00	0,00	16,34
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių	vnt	7,00	35,54	0,40	0,00	35,94
8	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių	vnt	5,00	19,51	63,96	0,00	83,47
9	N16-114-4	Kolektorių demontavimas	vnt.	1,00	28,84	0,00	0,00	28,84
10	N16P-1404	Spintų kolektoriniams mazgams	vnt.	1,00	21,63	63,61	0,11	85,35
11	N16P-0807	Šilumos skaitiklių su movinėmis	vnt.	1,00	29,00	320,63	0,09	349,72
12	F18-10-6	Iki 50 mm skersmens balansinių	vnt.	5,00	22,00	75,29	0,00	97,29
13	N16P-0501-4	Movinės uždaromosios armatūros	vnt.	5,00	23,35	36,49	0,35	60,19
14	N16P-0101-1	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio	m	100,00	456,00	357,00	2,16	815,16
15	N26P-0101-1	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija	100m	1,00	123,31	272,83	0,00	396,14
16	N16P-0201-1	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro	m	100,00	480,00	316,20	3,25	799,45
17	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm,	100m	1,00	97,00	164,99	0,00	261,99
Skyriuje					2787,87	7402,82	8,72	10199,41

Vėdinimas

18	N20P-0604-4	Vėdinimo ir oro kondicionavimo	vnt.	10,00	2432,76	55,81	270,29	2758,86
19	N20P-0314-2	900 mm ilgio apvalių triukšmo	vnt.	1,00	21,63	141,32	0,16	163,11
20	N20P-0205	Buitinės oro pašalinimo instaliacinės	vnt.	2,00	14,43	212,45	0,18	227,06
21	N20P-0201-1	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių	vnt.	1,00	8,60	18,60	0,08	27,28
22	N20P-0207-1	Difuzorių montavimas kai jungties	vnt.	5,00	50,48	33,43	0,00	83,91
23	N20P-0207-2	Difuzorių montavimas kai jungties	vnt.	2,00	20,19	15,49	0,00	35,68
24	N20-507	Ivairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi	vnt	1,00	10,22	24,90	0,00	35,12
25	N20-506	Ivairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi	vnt	5,00	38,97	28,88	0,00	67,85
26	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir	vnt	1,00	21,64	19,93	0,00	41,57
27	N20P-0204-1	Buitinių ventiliacijos grotelių	vnt.	2,00	14,42	29,72	0,00	44,14
28	N20-164	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos,	m2	20,00	307,13	491,25	0,00	798,38
29	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos,	m2	20,00	304,59	474,31	0,00	778,90
30	N20P-0113-1	Lanksčių gofruotų ortakų (prisijungimų)	vnt.	2,00	12,10	26,58	0,83	39,51
31	F26-1-1	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais	m2	20,00	124,00	88,76	0,00	212,76
Skyriuje					3381,16	1661,43	271,54	5314,13

Oro kondicionavimas

32	N20-973	Kondicionieriaus išorinio agregato,	vnt.	5,00	1081,66	2755,95	0,00	3837,61
33	N20P-0803-1	Kondicionierių vidinių kasetinių	vnt.	5,00	198,30	1252,33	0,68	1451,31
34	N16-113	Vidaus vandentiekio vamzdynų	m	50,00	422,97	328,47	0,00	751,44
35	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100m	1,50	173,06	119,57	0,00	292,63
36	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm,	100m	0,50	55,78	103,93	0,00	159,71
37	N16P-0201-1	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro	m	20,00	93,05	106,33	0,65	200,03
Skyriuje					2024,82	4666,58	1,33	6692,73

Viso žiniaraštyje S4

8193,85 13730,83 281,59 22206,27

PVM 21,00%

Iš viso

1720,71	2883,47	59,13	4663,32
9914,56	16614,30	340,72	26869,59

Žiniaraštis

S5 Vandentiekis

Suma žiniaraščiui

1633,68

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1	N16P-0201-1	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro m	5,00	21,15	38,51	0,16	59,82
2	N26P-0101-1	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija 100m	0,05	6,16	12,60	0,00	18,76
3	N16P-0501-1	Movinės uždarnosios armatūros vnt.	2,00	6,80	12,90	0,09	19,79
4	N18-76	Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų kompl.	1,00	5,77	5,34	0,00	11,11
5	N16P-0805-1	Vandens skaitiklių su movinėmis vnt.	2,00	37,10	77,72	0,14	114,96
6	N18-101	Vandens valymo filtro, kurio skersmuo vnt	2,00	55,47	138,86	0,00	194,33
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių vnt	2,00	7,81	9,66	0,00	17,47
8	N18-165	Iki 20 l talpos tūrinio šildytuvo vnt.	4,00	324,30	514,61	0,00	838,91
9	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. K8=1.03 vnt	1,00	62,27	12,73	0,00	75,00
Viso žiniaraštyje S5				526,83	822,93	0,39	1350,15

PVM 21,00%

Iš viso

110,63	172,82	0,08	283,53
637,46	995,75	0,47	1633,68

Žiniaraštis

S6 Nuotekos

Suma žiniaraščiui

480,94

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-	m	5,00	22,05	28,31	0,00	50,36
2	N16P-1103-3	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų	vnt.	2,00	4,58	10,48	0,00	15,06
3	N17-8-1	Sifono praustuvui pajungimas	kompl.	1,00	18,75	15,60	0,08	34,43
4	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas	vnt	1,00	54,12	38,45	0,00	92,57
5	N17-33-1	Praustuvės su maišytuvu montavimas,	kompl.	1,00	50,48	154,46	0,11	205,05
Viso žiniaraštyje S6					149,98	247,30	0,19	397,47
PVM 21,00%					31,50	51,93	0,04	83,47
Iš viso					181,48	299,23	0,23	480,94

8 priedas- Įkainotas darbų (veiklų) sąrašas – žiniaraštis.

ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Statinių grupė K001 AB Lietuvos paštas

Statinyss O1 Pietų regionas

Žiniaraštis S1 Bendrastatybiniai darbai

Suma žiniaraščiui

151930,72

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Tvoros								
1	N7P-0806-2	Metalinio tinklo, segmentinių tvorų įrengimas 1,5 m aukščio K8=1.03	m	6,67	45,13	96,06	2,54	143,73
2	HP8-3-5	Metalinės tvoros perdažymas	10m2	1,00	104,40	8,78	0,00	113,18
3	HP8-3-4	Tvorų stulpų keitimas metaliniais	vnt.	10,00	114,79	103,41	6,63	224,83
Skyriuje					264,32	208,25	9,17	481,74
Turėklai								
4	N7-229	Naujų, dažytų/cinkuotų, metalinių konstrukcijų turėklų įrengimas K8=1.04	100m	0,10	141,45	841,36	0,89	983,70
5	N7-229	Naujų nerūdijančio plieno konstrukcijų turėklų įrengimas K8=1.04	100m	0,10	141,45	841,36	0,89	983,70
6	A5-343-1	Turėklų metalinių konstrukcijų pakeitimas naujomis K9=1.15	m	10,00	95,07	876,73	21,68	993,48
7	HP11-4-9	Metalinių turėklų perdažymas antikoroziniais dažais, dažant teptuku, nuvalius paviršių rankiniu būdu K9=1.15	10m2	1,00	113,88	24,46	0,00	138,34
8	N10P-0902	Medinių porankių įrengimas	m	10,00	42,44	214,73	0,00	257,17
9	N15-150-1	Porankių iki 100mm pločio geras dažymas	100m	0,10	40,73	11,66	0,00	52,39
Skyriuje					575,02	2810,30	23,46	3408,78
Lauko laiptai, laiptų aikštelės, pandusai								
10	R9-6	Gelžbetonio pakopų keitimas ant laiptasijų	m	15,00	184,77	716,00	0,00	900,77
11	R61P-2111-1	Betoninių ir teraco betono plytelių laiptų remontas keičiant plyteles	m2	10,00	507,97	153,95	0,69	662,61
12	R9-10	Gelžbetonio pakopų remontas, užtaisant dideles išmušas	vnt	20,00	157,69	60,57	0,00	218,26
13	F27-15-1	Laiptų remontas nuardant akmens masės plyteles, paruošiant pagrindą ir įrengiant betoninių trinkelų dangą K8=1.03, K9=1.15	100m2	0,50	740,78	786,90	154,45	1682,13
14	N23P-0708-1	Batų valymo grotelių montavimas kai grotelės su vonele ir jungtimi prie vamzdyno K9=1.15	vnt.	2,00	70,73	257,53	0,00	328,26

15	R11-1	Atraminių sienelių tinko apdailos atstatymas K8=1.15, K9=1.15	m2	10,00	178,97	20,20	0,00	199,17
16	R16-113	Laiptų maršus, pakopas bei laiptų aikštelės laikančių mūrinių, metalinių, gelžbetoninių konstrukcijų remontas (atstatymas) K9=1.15	m3	2,50	419,25	270,26	0,00	689,51
17	N51-12	Atraminių sienelių papildomas sutvirtinimas metaliniais profiliais	vnt	4,00	141,46	210,45	7,31	359,22
18	F7-1-2	Metallinių konstrukcijų pandusų, aikštelių įrengimas, kai paviršiaus danga - cinkuotos grotelės	m3	10,00	518,58	3928,82	295,61	4743,01
19	N10-194	Laiptų iš metalinių konstrukcijų įrengimas, kai paviršiaus danga - cinkuotos grotelės	m2	10,00	148,77	741,28	0,00	890,05
Skyriuje					3068,97	7145,96	458,06	10672,99
Dury								
20	F10-4-15	Durų keitimas plastiko durimis, išlaužiant mūro užkaičius	m2	18,00	645,09	3788,34	0,00	4433,43
21	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	20,00	364,73	2722,10	6,26	3093,09
22	N9P-0705-2	II saugumo klasės "Šarvo" durų montavimas	m2	2,00	49,51	734,28	3,34	787,13
23	F15-10-1	Anksčiau dažytų aklinių durų mūro sienose gerasis dažymas, nuvalant senus dažus, šlifuojant ir glaistant (100m2 durų blokų)	100m2	0,10	268,37	59,75	2,98	331,10
24	R7-68-1	Spynų keitimas elektroninėmis spynomis	vnt	10,00	259,83	988,47	0,00	1248,30
25	R61P-3401-1	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės plieninės durys) (m2 bloko)	m2	20,00	436,19	5306,57	3,18	5745,94
26	R62P-3201-1	Medinių durų blokų keitimas plieniniais "ZK" tipo durų blokais vidinės durys, blokai iki 2 m2	m2	10,00	216,08	1180,86	2,02	1398,96
27	N9-107	Berėmio stiklo durų montavimas su elektromagnetine sklende ir pritraukėju	100m2	0,02	127,31	561,14	1,06	689,51
28	N15-81	Angokraščių aptaisymas sauso tinko lakštais, paruošiant dažymui	100m2	0,10	165,79	37,73	0,00	203,52
29	N2P-0308-6	Durų uždarymo prietaisų montavimas durų pritraukimo įtaisais	vnt.	2,00	25,46	176,89	0,21	202,56
Skyriuje					2558,36	15556,13	19,05	18133,54
Langai								
30	F10-4-13	Langų keitimas varstomais plastiko langais, išlaužiant mūro užkaičius ir nekeičiant palangių	m2	10,00	141,45	1012,11	0,00	1153,56

31	R7-87	Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, nudaužant tinką, kai angos plotas iki 1 m2	m2	10,00	141,46	995,34	0,00	1136,80
32	R3-25	Vidaus palangių keitimas naujomis PVC/Imdp palangėmis	m	10,00	114,83	208,33	0,00	323,16
33	R8-51	0,70m pločio sandrių, palangių nuolajų m ir atskirų karnizų dangos pakeitimas K1=2	m	10,00	141,46	110,92	2,65	255,03
34	N10-226	Žaliuzių automatinio atidarymo/uždarymo mechanizmų įrengimas	vnt	1,00	21,60	104,74	0,27	126,61
35	N2P-0114-2	Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas kai žaliuzių plotas daugiau 2 m2	vnt.	10,00	242,00	1569,92	2,65	1814,57
36	N20-511	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 5,0m2 šviesoje, montavimas K8=1.02	vnt	10,00	307,84	750,23	0,00	1058,07
37	N15-81	Angokraščių aptaisymas sauso tinko lakštais, paruošiant dažymui	100m2	0,10	212,19	37,73	0,00	249,92
38	A10-101	Medinių langų rėmų ar traukių paviršiaus aukštos kokybės aliejinis dažymas, nuvalant iki 30% senų dažų K1=1.25	10m2	1,00	191,39	5,06	0,00	196,45
39	N13-140	Langų stiklų apklėjimas šilumą absorbuojančia/apsaugine plėvele	m2	10,00	145,13	346,37	0,00	491,50
Skyriuje					1659,35	5140,75	5,57	6805,67
Fasadas								
40	R61P-0107-2	Priegrindų remontas, atstatant dangą kai dangą betoninių trinkelų K9=1.15	m2	10,00	143,72	121,93	2,31	267,96
41	R11-145	Cokolio tinko apdailos atstatymas K1=1.2, K8=1.09, K9=1.15	100m2	0,10	157,30	370,89	2,68	530,87
42	F60-4-2	Pažeistų fasado dalių lyginių keitimas ir dažymas parenkant spalvą	100m2	0,10	213,12	313,52	3,37	530,01
43	A8-57	Tinko nudaužymas nuo sienų arba lubų (pavienių vietų iki 5m2) K1=1.2	m2	10,00	33,67	0,00	0,00	33,67
44	F60-5-19	Stambiaplokščių sienų šiltinimas polistiro putplasčiu, tinkuojant plonasi. armuotu dekoratyv. tinku (apšilt. pav.)(be past.) K8=1.03, K9=1.15	m2	100,00	1715,91	1771,10	96,61	3583,62
45	R11-1	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m2 K1=1.2, K8=1.15, K9=1.15	m2	50,00	894,85	101,02	0,00	995,87
46	R11-9	Fasadų lygaus dekoratyv. (marmuro trupinių) tinko remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas daugiau kaip 5 m2 K8=1.15, K9=1.15	m2	50,00	1414,57	164,50	0,00	1579,07

47	R14-109	Anksčiau dažytų tinkuotų lygių fasadų dažymas 2 kartus silikatiniais dažais, paruošiant paviršių, dirbant ant žemės K9=1.15	100m2	2,00	1290,08	438,98	0,00	1729,06
48	R11-76-18	Fasadų rust. ir grubl. pav. nuvalymas vandeniu su abrazyvais, naudojant aukšto slėgio plovimo įreng., dirbant ant žemės K1=1.5, K2=1.5, K3=1.5, K8=1.15, K9=1.15	100m2	0,10	55,01	8,99	63,05	127,05
49	R3-34	Išorinių atitvarų, kolonų mūro atstatymas K8=1.07, K9=1.15	m2	40,00	2102,50	1469,73	0,00	3572,23
50	HP11-3-12	Gelžbetoninių atitvarų paviršiaus remontas K9=1.15	m2	10,00	120,15	194,48	6,40	321,03
51	N7-254-1	Išorės sienų plokščių horizont ir vertikalių sandūrų hermetizavimas neketėjančia mastika, dirbant iš montažinių lopšių K9=1.15	100m	0,10	33,95	16,02	4,45	54,42
52	R62P-2102	Mūrinių sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkumus skiediniu K9=1.15	m	10,00	89,12	9,69	0,00	98,81
53	N47-55	Laikinių aptvėrimų montavimas 1 savaitės laikotarpiui K3=0.3	100m	0,50	364,95	307,42	0,00	672,37
Skyriuje					8628,90	5288,27	178,87	14096,04
Vidaus patalpos								
54	R62P-2102	Mūrinių sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkumus skiediniu K9=1.15	m	50,00	118,82	32,30	0,00	151,12
55	F15-10-12	Anksčiau dažytų vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100m2	2,00	2263,31	439,98	0,00	2703,29
56	F11-10-1	Akmens masės plytelių dangos kiljavimas, išlyginant pagrindą	m2	50,00	707,28	2148,18	0,00	2855,46
57	F11-10-1	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m2	50,00	1060,95	1898,79	0,00	2959,74
58	R61P-2109-1	Keraminių plytelių dangos atskirų vietų remontas, keičiant plyteles kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2, plytelių plotas iki 0,05 m2	m2	1,00	49,99	10,15	0,06	60,20
59	F11-10-3	Linoleumo dangos pakeitimas, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas	m2	200,00	2546,22	5171,13	103,93	7821,28
60	F11-10-2	Linoleumo dangos pakeitimas laminuotomis grindlentėmis, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas	m2	100,00	1838,94	2421,00	48,78	4308,72
61	R14-17	Anksčiau dažytų grindų paprastas aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų	m2	10,00	56,02	8,88	0,00	64,90

62	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas K1=1.2	100m2	0,10	28,29	0,00	0,00	28,29
63	R5-46	Teracinių grindų poliravimas mechanizuotu būdu	100m2	0,10	79,22	0,08	21,56	100,86
64	F9-12-7	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	1,00	1966,25	1505,30	34,86	3506,41
65	N15-85-1	Sienų apdaila gipso kartono plokštimis, klijuojant ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius K1=1.15	100m2	0,50	565,83	246,14	0,00	811,97
66	F15-1-5	Paviršių aptaisymas gipso kartono pl., užtaisant ir glaistant siūles bei įrengiant 25x50mm tašelių kark., kai sienos nel.	100m2	0,50	976,19	174,16	4,25	1154,60
67	R14-199	Anksčiau dažytų durų, vartų, palangių nuolajų, sijų metalinių paviršių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	10,00	70,72	11,39	0,00	82,11
68	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	10,00	70,73	10,84	0,00	81,57
69	HP5-9-3	Medinių sulūžusių arba supuvusių elementų (medinės dangos, laiptų pakopos) pakeitimas	m2	50,00	1385,74	1062,41	0,00	2448,15
70	N11P-0405-4	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes orientuotų skiedrų plokštes (OSB)	100m2	0,50	141,45	218,51	0,00	359,96
71	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštimis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,10	161,53	41,48	0,47	203,48
72	F15-1-10	"Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštimis 600x600 mm įrengimas	m2	200,00	1697,47	2746,94	29,71	4474,12
Skyriuje					15784,95	18147,66	243,62	34176,23
Garažai, Ūkinės paskirties patalos								
73	N9-318	Metalinių vartų demontavimas	m2	3,00	36,56	3,02	25,48	65,06
74	R14-199	Anksčiau dažytų durų, vartų, palangių nuolajų, sijų metalinių paviršių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	3,00	21,22	2,15	0,00	23,37
75	F9-15-2	Segmentinių pakeliamų vartų el. pavara vnt. ir automatika įrengimas	vnt.	1,00	353,64	1513,17	1,91	1868,72
76	N2P-0403-2	Sekcijinių pakeliamų vartų iki 3 m aukščio su susukamų spyruoklių mechanizmu (sąraminis aukštis iki 0,8 m) montavimas kai vartų plotas daugiau 6 m2 iki 9 m2	vnt.	1,00	353,64	2081,01	3,82	2438,47
Skyriuje					765,06	3599,35	31,21	4395,62
Ardymo darbai								
77	N46-153	Sudėtingų skardos stogų išardymas	100m2	0,10	29,71	0,00	0,00	29,71

78	N46-142	Viensluoksnių plastikinių dailylenčių išardymas	100m2	0,50	186,72	0,00	0,00	186,72
79	N46-142	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš lentų išardymas	100m2	0,10	43,16	0,00	0,00	43,16
80	R6-2	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu K8=1.17	m3	1,40	116,72	0,00	0,00	116,72
81	N46-133	Mūrinių sienų išardymas K1=1.3, K8=1.17	m3	2,50	217,75	0,00	46,58	264,33
82	N46-140	Monolitinių gelžbetoninių pertvarų išardymas K8=1.17	m3	2,00	235,40	3,03	93,94	332,37
83	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,20	83,49	0,00	60,12	143,61
84	N15-333-2	Fasadinių pastolių, kurių plotis 0,73m ir aukštis iki 30m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalaus projekcijos)	100m2	0,50	178,23	49,03	0,00	227,26
85	R62P-5107-3	22 m kėlimo aukščio autobokštelių nuoma	h	15,00	0,00	0,00	343,37	343,37
Skyriuje					1091,18	52,06	544,01	1687,25
Šlaitinių stogų remontas								
86	A5-142-1	Mūroločio arba pogeinių netinkamų elementų pakeitimas K1=1.15	m	10,00	136,65	208,63	4,27	349,55
87	A5-141-1	Gegnių konstrukcijos (iš lentų) netinkamų elementų pakeitimas K1=1.15	m	10,00	98,03	40,04	3,05	141,12
88	R61P-2203	Iškilusių gegnių, sijų sutvirtinimas, paremiant spyriais ir sutvirtinant lentomis	vnt.	5,00	106,08	102,94	1,49	210,51
89	R8-3	Gegnėgalių iš tašų pakeitimas	m	10,00	142,59	38,16	0,00	180,75
90	A5-58-1	Vėjalėnčių pakeitimas (sunykimo vietose) K1=1.15	m	10,00	35,48	7,25	0,00	42,73
91	A5-154-1	Grebėstavimo su tarpais iš tašelių ir lentų pakeitimas K1=1.15	m2	10,00	65,35	34,40	0,00	99,75
92	A5-113-1	Lubų švaraus lentų pakalimo pakeitimas K1=1.15	m2	10,00	123,77	187,98	0,00	311,75
93	R16-316	Medinių laikančių konstrukcijų iš tašų 100x100mm pakeitimas	m	10,00	122,44	48,41	0,00	170,85
94	R61P-2234-1	Šlaitinių stogų sieninių latakų atskirų vietų keitimas sieniniai latakai su karnizų nuosvyromis	m	10,00	114,30	162,37	0,00	276,67
95	R8-44	Skardinių stogų tarplatakių iki 1,4m pločio iš cinkuotos skardos pakeitimas	m	10,00	109,90	114,81	0,00	224,71
96	R61P-2216	Ugniasienių ir parapetų dangos iš stoginės skardos atskirų vietų keitimas	m2	10,00	70,73	122,02	0,00	192,75
97	N12-141	Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos vnt virš ventiliacijos šachtų su dviem kanalais	vnt	10,00	217,45	407,93	0,00	625,38

98	R61P-2217-1	Šlaitinių stogų kraigų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais skardos lenktais profiliais	m	10,00	113,17	140,22	0,58	253,97
99	R61P-2242-3	Lietaus nuvedimo sistemos latakų laikiklių keitimas dirbant iš autobokštelių	vnt.	10,00	15,31	31,58	36,95	83,84
100	R8-41	Viengubų pakabinamų skardos latakų pakeitimas K1=2	m	10,00	92,52	150,31	0,00	242,83
101	A6-231-1	Lietvamzdžių laikiklių pakeitimas mūrinėse sienose, dirbant iš lopšių K1=1,85	vnt	10,00	137,23	31,22	0,00	168,45
102	R61P-2237-3	Šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų keitimas pagamintais elementais dirbant iš autobokštelių	m	10,00	48,38	119,42	81,02	248,82
103	R61P-2240-3	Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (įlajų) keitimas, gaminant detales dirbant iš autobokštelių	vnt.	10,00	172,87	161,56	62,75	397,18
104	R61P-2250-4	Stogo dangos valymas nuo kerpių, samanų, sąnašų, augalų	100 m2	1,00	353,64	0,00	0,00	353,64
105	R61P-2210-3	Šlaitinių stogų atskirų beasbesčio šiferio lakštų keitimas, dirbant iš autobokštelio lakštai 1250x920 mm	m2	100,00	746,89	1131,03	0,00	1877,92
106	R8-27	Sudėtingų stogų su sieniniais latakais iš cinkuotos skardos pakeitimas, kai stogo plotas iki 10 m2 K1=1,2, K3=1,25	m2	100,00	1158,17	1679,47	0,00	2837,64
107	R62P-5405-1	Šlaitinių stogų dengimas keraminėmis čerpėmis	100m2	0,50	353,63	1167,02	18,87	1539,52
108	R8-59	Priklijuotos 1 sluoksnio ruloninės dangos pakeitimas K1=1,7, K3=2, K8=1,12, K9=1,15	m2	10,00	55,55	129,18	0,00	184,73
109	R8-59-2	Stogelių remontas K1=1,7, K3=2, K8=1,12, K9=1,15	m2	10,00	144,29	4,16	0,00	148,45
110	N12P-0719-2	Plastikinių lauko stogelių įrengimas virš durų kai stogelio ilgis daugiau 1,6 m	m2	10,00	176,82	887,55	1,75	1066,12
111	N10-170	Stoginių įrengimas (m2 horizont. projekcijos)	m2	10,00	820,45	510,87	0,00	1331,32
112	F8-1-28	Dūmtraukių mūrijimas K8=1,12, K9=1,15	m3	3,00	339,50	472,32	48,76	860,58
113	N15-60	Kolonų, aptrauktų vielos tinklu, be karkaso įrengimo, labai geras tinkas K1=1,25, K8=1,09	100m2	0,10	382,53	80,38	2,98	465,89
114	N16-179	Vamzd., kurių D iki 400mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	10,00	310,70	866,84	0,00	1177,54
Skyriuje					6764,42	9038,07	262,47	16064,96

Sutapdintų (plokščių) stogų remontas

115	R8-82	Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.) K1=1.5, K2=1.5, K9=1.15	m2	200,00	424,37	0,00	11,11	435,48
116	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo stogų K9=1.15	100m2	2,00	141,24	0,00	0,00	141,24
117	R8-84	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop.ploto) K8=1.12, K9=1.15	m2	200,00	1273,11	855,50	43,41	2172,02
118	N12P-0715-3	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė K8=1.07, K9=1.15	vnt.	6,00	127,31	232,73	0,00	360,04
119	R61P-2231-1	Plokščių stogų lietaus rinktuvų (įlajų) sandarinimas aptaisant poliesteriniu audiniu K8=1.03, K9=1.15	vnt.	6,00	194,21	142,09	2,17	338,47
120	R61P-2231-2	Lietaus rinktuvo (įlajos) grotelių montavimas K8=1.03, K9=1.15	vnt.	10,00	127,32	137,22	2,38	266,92
121	R61P-2231-1	Plokščių stogų išsikišančių konstrukcijų sandarinimas aptaisant poliesteriniu audiniu K8=1.03, K9=1.15	vnt.	10,00	190,15	165,83	2,38	358,36
122	R62P-5110-3	Plokščių stogų išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių iš birių medžiagų ardymas sluoksniai keramzito	m3	20,00	497,93	0,00	0,00	497,93
123	R8-89	Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje latakų nuolydžio formavimas, kai nuolydis normalus K8=1.12, K9=1.15	m2	10,00	223,50	163,37	2,91	389,78
124	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas K9=1.15	vnt	10,00	159,03	259,03	0,00	418,06
125	R61P-2233-2	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių atskirų vietų sandarinimas kai stogo danga ritininė sintetinė K8=1.09, K9=1.15	m	50,00	386,18	209,09	17,48	612,75
126	R8-96	1sl.prilydom.ritin.stogo dangos"Mida"kljav.ant sutvarkyto pagr.,aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.) K1=1.8, K8=1.12, K9=1.15	m2	200,00	1131,65	1370,08	19,06	2520,79
127	R62P-5316-1	Plokščių stogų, apšiltinamų polistireniniu putplasčiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas kai plokštės storis 20 mm	100m2	2,00	848,74	485,08	4,45	1338,27
128	R8-96	1sl.prilydom.ritin.stogo dangos"Mida"kljav.ant sutvarkyto pagr.,aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.) K1=1.8, K8=1.12, K9=1.15	m2	30,00	169,75	221,74	2,86	394,35
129	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0,10	125,55	108,36	0,00	233,91

130	F12-2-4	Parapetų (38 cm pločio) dengimas cinkuota skarda, pritvirtinant medines ir plienines detales	100m	1,00	1169,14	1153,89	11,15	2334,18
131	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0,10	125,55	122,31	0,00	247,86
132	R61P-2242-3	Lietaus nuvedimo sistemos latakų laikiklių keitimas dirbant iš autobokštelių	vnt.	10,00	28,29	26,38	25,36	80,03
133	R8-41	Viengubų pakabinamų skardos latakų pakeitimas K1=2	m	10,00	92,52	185,85	0,00	278,37
134	A6-231-1	Lietvamzdžių laikiklių pakeitimas mūrinėse sienose, dirbant iš lopšių K1=1.85	vnt	10,00	137,23	34,32	0,00	171,55
135	R61P-2237-3	Šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų keitimas pagamintais elementais dirbant iš autobokštelių	m	10,00	48,38	119,42	55,52	223,32
136	R61P-2240-3	Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (lajų) keitimas gaminant detales dirbant iš autobokštelių	vnt.	10,00	172,86	67,92	67,78	308,56
137	R10-31	Kamino su dviem dūmtakiais antgalių viršaus permūrijimas, pridedant iki 50% naujų plytų K8=1.07	vnt	5,00	98,08	192,29	0,00	290,37
138	N15-60	Kolonų, aptrauktų vielos tinklu, be karkaso įrengimo, labai geras tinkas K1=1.25, K8=1.09	100m2	0,10	382,53	70,45	2,99	455,97
139	N34-205	Liuko įrengimas ant stogo	vnt	2,00	241,68	402,25	0,00	643,93
140	A21-11	Pakabinamų kopėčių įrengimas	m	2,00	51,38	75,87	0,00	127,25
Skyriuje					8567,68	6801,07	271,01	15639,76
Viso žiniaraštyje S1					49728,21	73787,87	2046,50	125562,58
PVM 21,00%					10442,92	15495,45	429,77	26368,14
Iš viso					60171,13	89283,32	2476,27	151930,72

Žiniaraštis S2 Elektrotechnika

Suma žiniaraščiui

19914,73

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skydai								
1	N21-120	Trifazio įvado skydelių montavimas	vnt	5,00	353,64	1922,77	0,00	2276,41
Skyriuje					353,64	1922,77	0,00	2276,41
Šviestuvai								
2	N21-212	Išorės LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,07	79,22	291,71	0,00	370,93
3	N21-243	Iki 4 lempų LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,50	565,83	1832,83	0,00	2398,66
4	N21-242	2 lempų LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,30	339,50	2035,41	0,00	2374,91
5	N21-241	1 lempos LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,10	113,17	813,73	0,00	926,90
6	N21-227	LED pakabinamų šviestuvų	100vnt	0,20	226,33	1527,91	0,00	1754,24
7	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas",	100vnt	0,05	70,72	136,28	0,00	207,00

Skyriuje					1394,77	6637,87	0,00	8032,64
Kabellai								
8	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai	100m	26,10	1797,64	0,00	124,66	1922,30
9	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki	100m	5,00	1273,11	945,56	0,00	2218,67
10	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100m	5,00	565,83	386,07	0,00	951,90
Skyriuje					3636,58	1331,63	124,66	5092,87
Instaliaciniai gaminiai								
11	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms,	100vnt	0,20	14,15	0,00	0,00	14,15
12	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija	100vnt	1,00	424,37	357,79	0,00	782,16
13	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija	100vnt	0,20	84,87	71,56	0,00	156,43
Skyriuje					523,39	429,35	0,00	952,74
Vamzdžiai ir kitos medžiagos								
14	N21-150	Iki 25mm skersmens polietileninių	100m	0,10	11,31	4,02	0,00	15,33
15	N21-548	Iki 100 A galios automatinio jungiklių	vnt	1,00	19,61	68,78	0,07	88,46
Skyriuje					30,92	72,80	0,07	103,80
Viso žiniaraštyje S2					5939,30	10394,42	124,73	16458,46
PVM 21,00%					1247,25	2182,83	26,19	3456,27
Iš viso					7186,55	12577,25	150,92	19914,73

Žiniaraštis S3 Elektroniniai ryšiai

Suma žiniaraščiui

5715,73

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Ryšiai								
1	N50-398	Komutacinių spintų surinkimas iš	vnt.	1,00	77,81	447,87	0,13	525,81
2	N50-399	24 lizdų komutatorių montavimas	vnt.	1,00	15,55	288,33	0,00	303,88
3	N50-333	Nepertraukiamo elektros maitinimo	vnt.	1,00	35,36	510,08	0,06	545,50
4	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms,	100vnt	0,50	42,18	0,00	0,00	42,18
5	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo	vnt.	76,00	317,36	373,25	4,84	695,45
6	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai	100m	1,00	141,45	0,00	4,78	146,23
7	N21-150	Iki 25mm skersmens polietileninių	100m	1,00	113,17	88,75	0,00	201,92
8	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos	100m	1,00	141,45	53,59	0,00	195,04
9	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100m	10,00	1131,66	723,24	0,00	1854,90
10	R61P-2704-	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas),	100 m	1,00	181,51	31,00	0,32	212,83
Skyriuje					2197,50	2516,11	10,13	4723,74
Viso žiniaraštyje S3					2197,50	2516,11	10,13	4723,74
PVM 21,00%					461,48	528,38	2,13	991,99
Iš viso					2658,98	3044,49	12,26	5715,73

Žiniaraštis S4 ŠVOK

Suma žiniaraščiui

25708,72

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Šildymas								
1	N20-948	Oro užuolaidų iki 6 kW montavimas,	vnt.	3,00	250,00	1059,93	0,40	1310,33
2	R63P-9111-	Mažo galingumo dujinių katilų	vnt.	3,00	1060,93	4062,83	1,37	5125,13

3	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė	vnt	5,00	35,71	0,00	0,00	35,71
4	N16P-0901-	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600	vnt.	5,00	106,09	400,78	0,85	507,72
5	N16P-0907-	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt.	1,00	14,15	96,05	0,09	110,29
6	R19-12	Movinės armatūros nuėmimas, kai	vnt	7,00	16,03	0,00	0,00	16,03
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių	vnt	7,00	34,86	0,39	0,00	35,25
8	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių	vnt	5,00	19,14	62,71	0,00	81,85
9	N16-114-4	Kolektorių demontavimas	vnt.	1,00	28,29	0,00	0,00	28,29
10	N16P-1404	Spintų kolektoriniams mazgams	vnt.	1,00	21,21	62,37	0,11	83,69
11	N16P-0807	Šilumos skaitiklių su movinėmis	vnt.	1,00	28,45	314,37	0,09	342,91
12	F18-10-6	Iki 50 mm skersmens balansinių	vnt.	5,00	21,58	73,82	0,00	95,40
13	N16P-0501-	Movinės uždarnosios armatūros	vnt.	5,00	22,90	35,77	0,35	59,02
14	N16P-0101-	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio	m	100,00	447,27	350,03	2,12	799,42
15	N26P-0101-	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija	100m	1,00	120,94	267,51	0,00	388,45
16	N16P-0201-	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro	m	100,00	470,80	285,61	3,18	759,59
17	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm,	100m	1,00	95,13	161,77	0,00	256,90
Skyriuje					2793,48	7233,94	8,56	10035,98

Vėdinimas								
18	N20P-0604-	Vėdinimo ir oro kondicionavimo	vnt.	10,00	2386,15	54,72	265,00	2705,87
19	N20P-0314-	900 mm ilgio apvalių triukšmo	vnt.	1,00	21,22	138,56	0,16	159,94
20	N20P-0205	Buitinės oro pašalinimo instaliacinės	vnt.	2,00	14,14	208,31	0,18	222,63
21	N20P-0201-	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų	vnt.	1,00	8,44	18,24	0,07	26,75
22	N20P-0207-	Difuzorių montavimas kai jungties	vnt.	5,00	49,51	32,78	0,00	82,29
23	N20P-0207-	Difuzorių montavimas kai jungties	vnt.	2,00	19,80	15,19	0,00	34,99
24	N20-507	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi	vnt	1,00	10,03	24,41	0,00	34,44
25	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi	vnt	5,00	38,22	28,32	0,00	66,54
26	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir	vnt	1,00	21,21	19,55	3516,76	40,76
27	N20P-0204-	Buitinių ventiliacijos grotelių	vnt.	2,00	14,15	29,13	0,00	43,28
28	N20-164	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos,	m2	20,00	301,25	481,66	0,00	782,91
29	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos,	m2	20,00	298,76	423,44	0,00	722,20
30	N20P-0113-	Lanksčių gofruotų ortakų (prisijungimų)	vnt.	2,00	11,87	26,05	0,83	38,75
31	F26-1-1	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais	m2	20,00	121,62	87,03	0,00	208,65
Skyriuje					3316,37	1587,39	266,24	5170,00

Oro kondicionavimas								
32	N20-973	Kondicionieriaus išorinio agregato,	vnt.	5,00	1060,92	2455,84	0,00	3516,76
33	N20P-0803-	Kondicionierių vidinių kasetinių	vnt.	5,00	194,51	952,29	0,66	1147,46
34	N16-113	Vidaus vandentiekio vamzdynų	m	50,00	414,87	322,06	0,00	736,93
35	N21-190	Dviejų-trijų gyslių laidų tiesimas	100m	1,50	169,75	117,23	0,00	286,98
36	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm,	100m	0,50	54,71	101,90	0,00	156,61
37	N16P-0201-	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro	m	20,00	91,26	104,26	0,64	196,16
Skyriuje					1986,02	4053,58	1,30	6040,90
Viso žiniaraštyje S4					8095,87	12874,91	276,10	21246,88

PVM 21,00%

Iš viso

1700,13	2703,73	57,98	4461,84
9796,00	15578,64	334,08	25708,72

Žiniaraštis

S5 Vandentiekis

Suma žiniaraščiui

1602,04

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1	N16P-0201-	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro	m	5,00	20,74	37,76	0,16	58,66
2	N26P-0101-	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija	100m	0,05	6,05	12,35	0,00	18,40
3	N16P-0501-	Movinės uždarnosios armatūros	vnt.	2,00	6,67	12,65	0,08	19,40
4	N18-76	Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų kompl.	kompl.	1,00	5,66	5,24	0,00	10,90
5	N16P-0805-	Vandens skaitiklių su movinėmis	vnt.	2,00	36,39	76,20	0,14	112,73
6	N18-101	Vandens valymo filtro, kurio skersmuo	vnt.	2,00	54,41	136,15	0,00	190,56
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių	vnt.	2,00	7,65	9,48	0,00	17,13
8	N18-165	Iki 20 l talpos tūrinio šildytuvo	vnt.	4,00	318,08	504,58	0,00	822,66
9	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. K8=1,03	vnt.	1,00	61,09	12,47	0,00	73,56
Viso žiniaraštyje S5					516,74	806,88	0,38	1324,00

PVM 21,00%

Iš viso

108,52	169,44	0,08	278,04
625,26	976,32	0,46	1602,04

Žiniaraštis

S6 Nuotekos

Suma žiniaraščiui

471,62

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-	m	5,00	21,62	27,76	0,00	49,38
2	N16P-1103-	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų	vnt.	2,00	4,50	10,27	0,00	14,77
3	N17-8-1	Sifono praustuvui pajungimas	kompl.	1,00	18,39	15,30	0,08	33,77
4	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas	vnt.	1,00	53,08	37,70	0,00	90,78
5	N17-33-1	Praustuvės su maišytuvu montavimas	kompl.	1,00	49,51	151,45	0,11	201,07
Viso žiniaraštyje S6					147,10	242,48	0,19	389,77

PVM 21,00%

Iš viso

30,89	50,92	0,04	81,85
177,99	293,40	0,23	471,62

8 priedas– Įkainotas darbų (veiklų) sąrašas – žiniaraštis.

ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Statinių grupė K001 AB Lietuvos paštas

Statiny's O1 Rytų regionas

Žiniaraštis S1 Bendrastatybiniai darbai

Suma žiniaraščiui

160547,96

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Tvoros								
1	N7P-0806-2	Metalinio tinklo, segmentinių tvorų įrengimas 1,5 m aukščio K8=1.03	m	6,67	46,02	97,97	2,59	146,58
2	HP8-3-5	Metalinės tvoros perdažymas	10m2	1,00	106,43	8,96	0,00	115,39
3	HP8-3-4	Tvorų stulpų keitimas metaliniais	vnt.	10,00	117,03	116,08	6,76	239,87
Skyriuje					269,48	223,01	9,35	501,84
Turėklai								
4	N7-229	Naujų, dažytų/cinkuotų, metalinių konstrukcijų turėklų įrengimas K8=1.04	100m	0,10	144,22	953,61	0,90	1098,73
5	N7-229	Naujų nerūdijančio plieno konstrukcijų turėklų įrengimas K8=1.04	100m	0,10	144,22	953,61	0,90	1098,73
6	A5-343-1	Turėklų metalinių konstrukcijų pakeitimas naujomis K9=1.15	m	10,00	96,92	894,18	22,13	1013,23
7	HP11-4-9	Metalinių turėklų perdažymas antikoroziniais dažais, dažant teptuku, nuvalius paviršių rankiniu būdu K9=1.15	10m2	1,00	116,10	24,95	0,00	141,05
8	N10P-0902	Medinių porankių įrengimas	m	10,00	43,26	219,01	0,00	262,27
9	N15-150-1	Porankių iki 100mm pločio geras dažymas	100m	0,10	21,63	6,19	0,00	27,82
Skyriuje					566,35	3051,55	23,93	3641,83
Lauko laiptai, laiptų aikštelės, pandusai								
10	R9-6	Gelžbetonio pakopų keitimas ant laiptasijų	m	15,00	188,39	730,24	0,00	918,63
11	R61P-2111-1	Betoninių ir teraco betono plytelių laiptų remontas keičiant plyteles	m2	10,00	517,89	157,01	0,71	675,61
12	R9-10	Gelžbetonio pakopų remontas, užtaisant dideles išmušas	vnt	20,00	160,77	61,78	0,00	222,55
13	F27-15-1	Laiptų remontas nuardant akmens masės plyteles, paruošiant pagrindą ir įrengiant betoninių trinkelų dangą K8=1.03, K9=1.15	100m2	0,50	755,26	802,56	194,67	1752,49
14	N23P-0708-1	Batų valymo grotelių montavimas kai grotelės su vonelė ir jungtims prie vamzdyno K9=1.15	vnt.	2,00	72,11	328,45	0,00	400,56

15	R11-1	Atramių sienelių tinko apdailos atstatymas K8=1.15, K9=1.15	m2	10,00	182,47	20,61	0,00	203,08
16	R16-113	Laiptų maršus, pakopas bei laiptų aikštelės laikinųjų mūrinių, metalinių, gelžbetoninių konstrukcijų remontas (atstatymas) K9=1.15	m3	2,50	427,44	275,64	0,00	703,08
17	N51-12	Atramių sienelių papildomas sutvirtinimas metaliniais profiliams	vnt	4,00	144,22	214,63	7,46	366,31
18	F7-1-2	Metalinių konstrukcijų pandusų, aikštelių įrengimas, kai paviršiaus danga - cinkuotos grotelės	m3	10,00	528,71	4007,01	301,49	4837,21
19	N10-194	Laiptų iš metalinių konstrukcijų įrengimas, kai paviršiaus danga - cinkuotos grotelės	m2	10,00	151,67	756,03	0,00	907,70
Skyriuje					3128,93	7353,96	504,33	10987,22

Dury								
20	F10-4-15	Durų keitimas plastiko durimis, išlaužiant mūro užkaičius	m2	18,00	657,69	3863,73	0,00	4521,42
21	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	20,00	371,86	2776,27	6,38	3154,51
22	N9P-0705-2	II saugumo klasės "Šarvo" durų montavimas	m2	2,00	50,48	829,54	3,40	883,42
23	F15-10-1	Anksčiau dažytų aklinių durų mūro sienose gerasis dažymas, nuvalant senus dažus, šlifuojant ir glaistant (100m2 durų blokų)	100m2	0,10	273,62	60,94	3,03	337,59
24	R7-68-1	Spynų keitimas elektroninėmis spynomis	vnt	10,00	264,90	1008,15	0,00	1273,05
25	R61P-3401-1	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės plieninės durys) (m2 bloko)	m2	20,00	444,72	5412,16	3,25	5860,13
26	R62P-3201-1	Medinių durų blokų keitimas plieniniais "ZK" tipo durų blokais vidinės durys, blokai iki 2 m2	m2	10,00	220,30	1241,61	2,06	1463,97
27	N9-107	Bėrimo stiklo durų montavimas su elektromagnetine sklende ir pritraukėju	100m2	0,02	129,79	572,31	8,78	710,88
28	N15-81	Angokraščių aptaisymas sauso tinko lakštais, paruošiant dažymui	100m2	0,10	169,03	38,48	0,00	207,51
29	N2P-0308-6	Durų uždarymo prietaisų montavimas durų vnt. pritraukimo įtaisais	vnt.	2,00	25,95	180,41	0,22	206,58
Skyriuje					2608,34	15983,60	27,12	18619,06

Langai								
30	F10-4-13	Langų keitimas varstomais plastiko langais, išlaužiant mūro užkaičius ir nekeičiant palangių	m2	10,00	144,22	1032,25	0,00	1176,47

31	R7-87	Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, nudaužant tinką, kai angos plotas iki 1 m2	m2	10,00	144,22	1015,15	0,00	1159,37
32	R3-25	Vidaus palangių keitimas naujomis PVC/lmdp palangėmis	m	10,00	117,08	212,47	0,00	329,55
33	R8-51	0,70m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos pakeitimas K1=2	m	10,00	144,22	113,13	2,70	260,05
34	N10-226	Žaliuzių automatinių atidarymo/uždarymo mechanizmų įrengimas	vnt	1,00	22,03	106,82	0,27	129,12
35	N2P-0114-2	Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas kai žaliuzių plotas daugiau 2 m2	vnt	10,00	246,73	1919,51	2,71	2168,95
36	N20-511	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 5,0m2 šviesoje, montavimas K8=1,02	vnt	10,00	313,85	765,16	0,00	1079,01
37	N15-81	Angokraščių aptaisymas sauso tinko lakštais, paruošiant dažymui	100m2	0,10	216,33	38,48	0,00	254,81
38	A10-101	Medinių langų rėmų ar traukių paviršiaus aukštos kokybės aliejinis dažymas, nuvalant iki 30% senų dažų K1=1,25	10m2	1,00	195,13	5,16	0,00	200,29
39	N13-140	Langų stiklų apklėjimas šilumą absorbuojančia/apsaugine plėvele	m2	10,00	147,96	353,29	0,00	501,25
Skyriuje					1691,77	5561,42	5,68	7258,87

Fasadas

40	R61P-0107-2	Priegrindų remontas, atstatant dangą kai danga betoninių trinkelų K9=1,15	m2	10,00	146,53	124,35	2,36	273,24
41	R11-145	Cokolio tinko apdailos atstatymas K1=1,2, K8=1,09, K9=1,15	100m2	0,10	160,37	378,27	2,74	541,38
42	F60-4-2	Pažeistų fasado dalių keitimas ir dažymas parenkant spalvą	100m2	0,10	217,28	319,76	3,44	540,48
43	A8-57	Tinko nudaužymas nuo sienų arba lubų (pavienių vietų iki 5m2) K1=1,2	m2	10,00	34,33	0,00	0,00	34,33
44	F60-5-19	Stambiaplokščių sienų šiltinimas polistir. putplasčiu, tinkuojant plonasl. armuotu dekoratyv. tinku (apšilt. pav.) (be past.) K8=1,03, K9=1,15	m2	100,00	1749,42	1806,35	165,76	3721,53
45	R11-1	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m2 K1=1,2, K8=1,15, K9=1,15	m2	50,00	912,33	103,03	0,00	1015,36
46	R11-9	Fasadų lygaus dekoratyv. (marmuro trupinių) tinko remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas daugiau kaip 5 m2 K8=1,15, K9=1,15	m2	50,00	1479,63	167,78	0,00	1647,41

47	R14-109	Anksčiau dažytų tinkuotų lygių fasadų dažymas 2 kartus silikatiniais dažais, paruošiant paviršių, dirbant ant žemės K9=1.15	100m2	2,00	1315,29	447,71	0,00	1763,00
48	R11-76-18	Fasadų rust. ir grubl. pav. nuvalymas vandeniu su abrazyvais, naudojant aukšto slėgio plovimo įreng., dirbant ant žemės K1=1.5, K2=1.5, K3=1.5, K8=1.15, K9=1.15	100m2	0,10	56,09	9,17	64,30	129,56
49	R3-34	Išorinių atitvarų, kolonų mūro atstatymas K8=1.07, K9=1.15	m2	40,00	2143,57	1498,98	0,00	3642,55
50	HP11-3-12	Gelžbetoninių atitvarų paviršiaus remontas K9=1.15	m2	10,00	122,50	212,16	23,98	358,64
51	N7-254-1	Išorės sienų plokščių horizont ir vertikalių sandūrų hermetizavimas neketėjančia mastika, dirbant iš montažinių lopšių K9=1.15	100m	0,10	34,63	16,33	4,53	55,49
52	R62P-2102	Mūrinių sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkumus skiediniu K9=1.15	m	10,00	90,85	9,88	0,00	100,73
53	N47-55	Laikinių aptvėrimų montavimas 1 savatės laikotarpiui K3=0.3	100m	0,50	510,69	345,37	0,00	856,06
Skyriuje					8973,51	5439,14	267,11	14679,76

Vidaus patalpos

54	R62P-2102	Mūrinių sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkumus skiediniu K9=1.15	m	50,00	121,15	49,40	0,00	170,55
55	F15-10-12	Anksčiau dažytų vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100m2	2,00	3764,15	448,74	0,00	4212,89
56	F11-10-1	Akmens masės plytelių dangos klajavimas, išlyginant pagrindą	m2	50,00	951,85	2275,45	0,00	3227,30
57	F11-10-1	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m2	50,00	1189,82	1973,00	0,00	3162,82
58	R61P-2109-1	Keraminių plytelių dangos atskirų vietų remontas, keičiant plyteles kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2, plytelių plotas iki 0,05 m2	m2	1,00	50,97	10,35	0,06	61,38
59	F11-10-3	Linoleumo dangos pakeitimas, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas	m2	200,00	2769,03	5571,52	105,99	8446,54
60	F11-10-2	Linoleumo dangos pakeitimas laminuotomis grindlentėmis, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas	m2	100,00	2076,77	2469,18	49,75	4595,70
61	R14-11	Anksčiau dažytų grindų paprastas aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų	m2	10,00	57,11	9,06	0,00	66,17

62	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas K1=1,2	100m2	0,10	28,84	0,00	0,00	28,84
63	R5-46	Teracinių grindų poliravimas mechanizuotu būdu	100m2	0,10	80,76	0,09	21,99	102,84
64	F9-12-7	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	1,00	2004,66	1624,39	35,56	3664,61
65	N15-85-1	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius K1=1,15	100m2	0,50	576,88	229,45	0,00	806,33
66	F15-1-5	Paviršių aptaisymas gipso kartono pl., užtaisant ir glaistant siūles bei įrengiant 25x50mm tašelių kark., kai sienos nel.	100m2	0,50	995,27	177,62	4,33	1177,22
67	R14-199	Anksčiau dažytų durų, vartų, palangių nuolajų, sijų metalinių paviršių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	10,00	72,11	11,61	0,00	83,72
68	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	10,00	72,11	11,06	0,00	83,17
69	HP5-9-3	Medinių sulūžusių arba supuvusių elementų (medinės dangos, laiptų pakopos) pakeitimas	m2	50,00	1412,81	1083,55	0,00	2496,36
70	N11P-0405-4	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes orientuotų skiedrų plokštes (OSB)	100m2	0,50	144,22	267,42	0,00	411,64
71	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,10	164,68	42,30	0,48	207,46
72	F15-1-10	"Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	200,00	1730,65	2865,27	30,30	4626,22
Skyriuje					18263,84	19119,46	248,46	37631,76

Garažai, Ūkinės paskirties patalos								
73	N9-318	Metalinių vartų demontavimas	m2	3,00	37,28	3,08	25,98	66,34
74	R14-199	Anksčiau dažytų durų, vartų, palangių nuolajų, sijų metalinių paviršių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	3,00	21,63	2,20	0,00	23,83
75	F9-15-2	Segmentinių pakeliamų vartų el. pavara ir automatika įrengimas	vnt.	1,00	360,55	1543,28	1,95	1905,78
76	N2P-0403-2	Sekcijinių pakeliamų vartų iki 3 m aukščio su susukamų spyruoklių mechanizmu (sąraminis aukštis iki 0,8 m) montavimas kai vartų plotas daugiau 6 m2 iki 9 m2	vnt.	1,00	360,55	2122,42	3,90	2486,87
Skyriuje					780,01	3670,97	31,84	4482,82

Ardymo darbai								
77	N46-183	Sudėtingų skardos stogų išardymas	100m2	0,10	30,29	0,00	0,00	30,29

78	N46-142	Viensluoksnių plastikinių dailylenčių išardymas	100m2	0,50	190,37	0,00	0,00	190,37
79	N46-142	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš lentų išardymas	100m2	0,10	44,00	0,00	0,00	44,00
80	R6-2	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu K8=1.17	m3	1,40	119,00	0,00	0,00	119,00
81	N46-133	Mūrinių sienų išardymas K1=1.3, K8=1.17	m3	2,50	222,00	0,00	47,51	269,51
82	N46-140	Monolitinių gelžbetoninių pertvarų išardymas K8=1.17	m3	2,00	240,00	3,09	95,81	338,90
83	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,20	85,12	0,00	61,32	146,44
84	N15-333-2	Fasadinių pastolių, kurių plotis 0,73m ir aukštis iki 30m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	0,50	126,00	50,00	0,00	176,00
85	R62P-5107-3	22 m kėlimo aukščio autobokštelių nuoma	h	15,00	0,00	0,00	477,54	477,54
Skyriuja					1056,78	53,09	682,18	1792,05

Šlaitinių stogų remontas

86	A5-142-1	Mūrločio arba pogeignių netinkamų elementų pakeitimas K1=1.15	m	10,00	139,31	212,79	4,35	356,45
87	A5-141-1	Gegnių konstrukcijos (iš lentų) netinkamų elementų pakeitimas K1=1.15	m	10,00	99,94	40,84	3,11	143,89
88	R61P-2203	Iškilusių gegnių, sijų sutvirtinimas, paremiant spyriais ir sutvirtinant lentomis	vnt.	5,00	108,17	104,98	1,52	214,67
89	R8-3	Gegnėgalių iš tašų pakeitimas	m	10,00	145,37	38,92	0,00	184,29
90	A5-58-1	Vėjalėnčių pakeitimas (sūnykimo vietose) K1=1.15	m	10,00	36,17	7,40	0,00	43,57
91	A5-154-1	Grebėstavimo su tarpais iš tašelių ir lentų pakeitimas K1=1.15	m2	10,00	66,63	35,08	0,00	101,71
92	A5-113-1	Lubų švaraus lentų pakalimo pakeitimas K1=1.15	m2	10,00	126,19	191,71	0,00	317,90
93	R16-316	Medinių laikančių konstrukcijų iš tašų 100x100mm pakeitimas	m	10,00	124,84	49,37	0,00	174,21
94	R61P-2234-1	Šlaitinių stogų sieninių latakų atskirų vietų keitimas sieniniai latakai su karnizų nuosvyromis	m	10,00	116,53	208,05	0,00	324,58
95	R8-44	Skardinių stogų tarplatakių iki 1,4m pločio iš cinkuotos skardos pakeitimas	m	10,00	112,05	164,85	0,00	276,90
96	R61P-2216	Ugniasienių ir parapetų dangos iš stoginės skardos atskirų vietų keitimas	m2	10,00	72,11	124,45	0,00	196,56
97	N12-141	Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos virš ventiliacijos šachtų su dviem kanalais	vnt	10,00	221,70	533,84	0,00	755,54

98	R61P-2217-1	Šlaitinių stogų kraigų atskirų vietų keitimas m pagamintais elementais skardos lenktais profilais	m	10,00	115,38	119,87	0,60	235,85
99	R61P-2242-3	Lietaus nuvedimo sistemos latakų laikiklių vnt. keitimas dirbant iš autobokštelių	vnt.	10,00	15,60	32,21	37,69	85,50
100	R8-41	Viengubų pakabinamų skardos latakų pakeitimas K1=2	m	10,00	94,33	153,30	0,00	247,63
101	A6-231-1	Lietvamzdžių laikiklių pakeitimas mūrinėse sienose, dirbant iš šėpšių K1=1.85	vnt	10,00	139,91	31,84	0,00	171,75
102	R61P-2237-3	Šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų keitimas pagamintais elementais dirbant iš autobokštelių	m	10,00	49,32	121,80	82,63	253,75
103	R61P-2240-3	Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (jlajų) keitimas, gaminant detales dirbant iš autobokštelių	vnt.	10,00	176,24	164,78	69,13	410,15
104	R61P-2250-4	Stogo dangos valymas nuo kerpių, samanų, sąnašų, augalų	100 m2	1,00	432,66	0,00	0,00	432,66
105	R61P-2210-3	Šlaitinių stogų atskirų beasbesčio šiferio lakštų keitimas, dirbant iš autobokštelio lakštai 1250x920 mm	m2	100,00	761,48	1153,54	0,00	1915,02
106	R8-27	Sudėtingų stogų su sieniniais latakais iš cinkuotos skardos pakeitimas, kai stogo plotas iki 10 m2 K1=1.2, K3=1.25	m2	100,00	1180,79	1712,89	0,00	2893,68
107	R62P-5405-1	Šlaitinių stogų dengimas keraminėmis čerpėmis	100m2	0,50	360,56	1372,04	22,01	1754,61
108	R8-59	Priklijuotos 1 sluoksnio ruloninės dangos pakeitimas K1=1.7, K3=2, K8=1.12, K9=1.15	m2	10,00	56,64	131,75	0,00	188,39
109	R8-59-2	Stogelių remontas K1=1.7, K3=2, K8=1.12, K9=1.15	m2	10,00	147,10	4,25	0,00	151,35
110	N12P-0719-2	Plastikinių lauko stogelių įrengimas virš durų kai stogelio ilgis daugiau 1,6 m	m2	10,00	180,28	905,20	1,79	1087,27
111	N10-170	Stoginių įrengimas (m2 horizont. projekcijos)	m2	10,00	836,48	521,04	0,00	1357,52
112	F8-1-28	Dūmtraukių mūrijimas K8=1.12, K9=1.15	m3	3,00	346,13	481,73	57,59	885,45
113	N15-60	Kolonų, aptrauktų vielos tinklu, be karkaso įrengimo, labai geras tinkas K1=1.25, K8=1.09	100m2	0,10	390,00	81,98	3,04	475,02
114	N16-179	Vamzd., kurių D iki 400mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	10,00	316,76	842,19	0,00	1158,95
Skyriuje					6968,67	9542,69	283,46	16794,82

Sutapdintų (plokščių) stogų remontas

115	R8-82	Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritinės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.) K1=1.5, K2=1.5, K9=1.15	m2	200,00	432,66	0,00	11,33	443,99
116	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo stogų K9=1.15	100m2	2,00	144,00	0,00	0,00	144,00
117	R8-84	"Pūslių" remontas ritinėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop. ploto) K8=1.12, K9=1.15	m2	200,00	1297,98	900,12	44,27	2242,37
118	N12P-0715-3	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė K8=1.07, K9=1.15	vnt.	6,00	129,80	199,91	0,00	329,71
119	R61P-2231-1	Plokščių stogų lietaus rinktuvų (įlajų) sandarinimas aptaisant poliesteriniu audiniu K8=1.03, K9=1.15	vnt.	6,00	198,00	157,65	2,22	357,87
120	R61P-2231-2	Lietaus rinktuvo (įlajos) grotelių montavimas K8=1.03, K9=1.15	vnt.	10,00	129,80	156,07	2,43	288,30
121	R61P-2231-1	Plokščių stogų išsikišančių konstrukcijų sandarinimas aptaisant poliesteriniu audiniu K8=1.03, K9=1.15	vnt.	10,00	193,86	201,58	2,43	397,87
122	R62P-5110-3	Plokščių stogų išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių iš birių medžiagų ardymas sluoksniai keramzito	m3	20,00	507,66	0,00	0,00	507,66
123	R8-89	Ritinėje (ruloninėje) stogo dangoje latako nuolydžio formavimas, kai nuolydis normalus K8=1.12, K9=1.15	m2	10,00	227,86	210,40	2,97	441,23
124	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas K9=1.15	vnt	10,00	162,14	271,40	0,00	433,54
125	R61P-2233-2	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių atskirų vietų sandarinimas kai stogo danga ritinė sintetinė K8=1.09, K9=1.15	m	50,00	393,72	259,95	17,83	671,50
126	R8-96	1sl. prilydom. ritin. stogo dangos "Mida" klijav. ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.) K1=1.8, K8=1.12, K9=1.15	m2	200,00	1153,76	1444,03	19,44	2617,23
127	R62P-5316-1	Plokščių stogų, apšiltinamų polistireniniu putplasčiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas kai plokštės storis 20 mm	100m2	2,00	865,32	534,84	4,54	1404,70
128	R8-96	1sl. prilydom. ritin. stogo dangos "Mida" klijav. ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.) K1=1.8, K8=1.12, K9=1.15	m2	30,00	173,06	226,16	2,92	402,14
129	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0,10	128,00	124,75	0,00	252,75

130	F12-2-4	Parapetų (38 cm pločio) dengimas cinkuota skarda, pritvirtinant medines ir plienines detales	100m	1,00	1191,98	1176,86	11,36	2380,20
131	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m ²	0,10	128,00	124,75	0,00	252,75
132	R61P-2242-3	Lietaus nuvedimo sistemos latakų laikiklių keitimas dirbant iš autobokštelių	vnt.	10,00	28,84	26,91	25,86	81,61
133	R8-41	Viengubų pakabinamų skardos latakų pakeitimas K1=2	m	10,00	94,33	189,55	0,00	283,88
134	A6-231-1	Lietvamzdžių laikiklių pakeitimas mūrinėse sienose, dirbant iš lopšių K1=1,85	vnt	10,00	139,91	35,00	0,00	174,91
135	R61P-2237-3	Šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų keitimas pagamintais elementais dirbant iš autobokštelių	m	10,00	49,32	121,79	56,63	227,74
136	R61P-2240-3	Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (lajų) keitimas, gaminant detales dirbant iš autobokštelių	vnt.	10,00	176,24	69,26	69,14	314,64
137	R10-31	Kamino su dviem dūmtakiais antgalių viršaus permūrijimas, pridedant iki 50% naujų plytų K8=1,07	vnt	5,00	100,00	196,11	0,00	296,11
138	N15-60	Kolonų, aptrauktų vielos tinklu, be karkaso įrengimo, labai geras tinkas K1=1.25, K8=1.09	100m ²	0,10	390,02	71,85	3,04	464,91
139	N34-205	Liuko įrengimas ant stogo	vnt	2,00	246,40	506,46	0,00	752,86
140	A21-11	Pakabinamų kopėčių įrengimas	m	2,00	52,39	77,38	0,00	129,77
Skyriuje					8735,05	7282,78	276,41	16294,24
Viso žiniaraštyje S1					53042,72	77281,67	2359,87	132684,27
PVM 21,00%					11138,97	16229,15	495,57	27863,69
Iš viso					64181,69	93510,82	2855,44	160547,96

Žiniaraštis

S2 Elektrotechnika

Suma žiniaraščiui

21147,69

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skydai								
1	N21-120	Trifazio įvado skydelių montavimas	vnt	5,00	360,55	1961,03	0,00	2321,58
Skyriuje					360,55	1961,03	0,00	2321,58
Šviestuvai								
2	N21-212	Išorės LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,07	100,95	319,81	0,00	420,76
3	N21-243	Iki 4 lempų LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,50	721,10	1902,59	0,00	2623,69
4	N21-242	2 lempų LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,30	432,66	2075,91	0,00	2508,57
5	N21-241	1 lempos LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,10	144,22	836,72	0,00	980,94
6	N21-227	LED pakabinamų šviestuvų montavimas	100vnt	0,20	288,44	1685,66	0,00	1974,10

7	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas",	100vnt	0,05	72,11	149,59	0,00	221,70
Skyriuje					1759,48	6970,28	0,00	8729,76
Kabeliai								
8	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai	100m	26,10	1832,77	0,00	127,13	1959,90
9	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40	100m	5,00	1406,15	964,37	0,00	2370,52
10	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir	100m	5,00	576,88	421,08	0,00	997,96
Skyriuje					3815,80	1385,45	127,13	5328,38
Instaliaciniai gaminiai								
11	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams,	100vnt	0,20	14,42	0,00	0,00	14,42
12	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija	100vnt	1,00	432,66	375,53	0,00	808,19
13	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija	100vnt	0,20	86,53	75,11	0,00	161,64
Skyriuje					533,61	450,64	0,00	984,25
Vamzdžiai ir kitos medžiagos								
14	N21-150	Iki 25mm skersmens polietileningų	100m	0,10	11,54	6,40	0,00	17,94
15	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių	vnt	1,00	19,99	75,46	0,08	95,52
Skyriuje					31,53	81,86	0,08	113,46
Viso žiniaraštyje S2					6500,97	10849,26	127,21	17477,43
PVM 21,00%					1365,20	2278,34	26,71	3670,26
Iš viso					7866,17	13127,60	153,92	21147,69

Žinīaraštis

S3 Elektroniniai ryšiai

Suma žiniaraščiui

6209,18

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Ryšiai								
1	N50-398	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų	vnt.	1,00	100,95	520,46	0,14	621,55
2	N50-399	24 lizdų komutatorių montavimas	vnt.	1,00	36,06	294,06	0,00	330,12
3	N50-333	Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinio	vnt.	1,00	72,11	520,23	0,06	592,40
4	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams,	100vnt	0,50	43,00	0,00	0,00	43,00
5	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	76,00	323,55	380,68	4,94	709,17
6	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai	100m	1,00	144,22	0,00	4,87	149,09
7	N21-150	Iki 25mm skersmens polietileninių	100m	1,00	144,22	90,52	0,00	234,74
8	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų	100m	1,00	144,22	54,65	0,00	198,87
9	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir	100m	10,00	1297,98	737,64	0,00	2035,62
10	R61P-2704-	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas),	100 m	1,00	185,06	31,61	0,32	216,99
Skyriuje					2491,37	2629,85	10,33	5131,55
Viso žiniaraštyje S3					2491,37	2629,85	10,33	5131,55
PVM 21,00%					523,19	552,27	2,17	1077,63
Iš viso					3014,56	3182,12	12,50	6209,18

Žinjiaraštis

S4 ŠVOK

Suma žiniaraščiui

26869,59

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Šildymas

1	N20-948	Oro užuolaidų iki 6 kW montavimas, kai	vnt.	3,00	194,70	1081,03	0,40	1276,13
2	R63P-9111-	Mažo galingumo dujinių katilų montavimas	vnt.	3,00	1081,65	4143,69	1,40	5226,74
3	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki	vnt	5,00	36,41	0,00	0,00	36,41
4	N16P-0901-	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm	vnt.	5,00	108,17	408,74	0,87	517,78
5	N16P-0907-	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas	1 vnt.	1,00	14,42	97,96	0,09	112,47
6	R19-12	Movinės armatūros nuėmimas, kai	vnt	7,00	16,34	0,00	0,00	16,34
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D	vnt	7,00	35,54	0,40	0,00	35,94
8	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D	vnt	5,00	19,51	63,96	0,00	83,47
9	N16-114-4	Kolektorių demontavimas	vnt.	1,00	28,84	0,00	0,00	28,84
10	N16P-1404	Spintų kolektoriniams mazgams	vnt.	1,00	21,63	63,61	0,11	85,35
11	N16P-0807	Šilumos skaitiklių su movinėmis jungtimis	vnt.	1,00	29,00	320,63	0,09	349,72
12	F18-10-6	Iki 50 mm skersmens balansinių ventilių	vnt.	5,00	22,00	75,29	0,00	97,29
13	N16P-0501-	Movinės uždarnosios armatūros	vnt.	5,00	23,35	36,49	0,35	60,19
14	N16P-0101-	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio	m	100,00	456,00	357,00	2,16	815,16
15	N26P-0101-	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija	100m	1,00	123,31	272,83	0,00	396,14
16	N16P-0201-	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro	m	100,00	480,00	316,20	3,25	799,45
17	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm,	100m	1,00	97,00	164,99	0,00	261,99
Skyriuje					2787,87	7402,82	8,72	10199,41

Vėdinimas								
18	N20P-0604-	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių iš	vnt.	10,00	2432,76	55,81	270,29	2758,86
19	N20P-0314-	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų	vnt.	1,00	21,63	141,32	0,16	163,11
20	N20P-0205	Buitinės oro pašalinimo instaliacinės	vnt.	2,00	14,43	212,45	0,18	227,06
21	N20P-0201-	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas	vnt.	1,00	8,60	18,60	0,08	27,28
22	N20P-0207-	Difuzorių montavimas kai jungties	vnt.	5,00	50,48	33,43	0,00	83,91
23	N20P-0207-	Difuzorių montavimas kai jungties	vnt.	2,00	20,19	15,49	0,00	35,68
24	N20-507	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi	vnt	1,00	10,22	24,90	0,00	35,12
25	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi	vnt	5,00	38,97	28,88	0,00	67,85
26	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir	vnt	1,00	21,64	19,93	0,00	41,57
27	N20P-0204-	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	2,00	14,42	29,72	0,00	44,14
28	N20-164	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių	m2	20,00	307,13	491,25	0,00	798,38
29	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių	m2	20,00	304,59	474,31	0,00	778,90
30	N20P-0113-	Lankstčių gofruotų ortakų (prisijungimų)	vnt.	2,00	12,10	26,58	0,83	39,51
31	F26-1-1	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais	m2	20,00	124,00	88,76	0,00	212,76
Skyriuje					3381,16	1661,43	271,54	5314,13

Oro kondicionavimas								
32	N20-973	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio	vnt.	5,00	1081,66	2755,95	0,00	3837,61
33	N20P-0803-	Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų	vnt.	5,00	198,30	1252,33	0,68	1451,31
34	N16-113	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš	m	50,00	422,97	328,47	0,00	751,44
35	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100m	1,50	173,06	119,57	0,00	292,63
36	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm,	100m	0,50	55,78	103,93	0,00	159,71
37	N16P-0201-	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro	m	20,00	93,05	106,33	0,65	200,03
Skyriuje					2024,82	4666,58	1,33	6692,73

Viso žiniaraštyje S4

8193,85 13730,83 281,59 22206,27

PVM 21,00%

Iš viso

1720,71	2883,47	59,13	4663,32
9914,56	16614,30	340,72	26869,59

Žiniaraštis

S5 Vandentiekis

Suma žiniaraščiui

1633,68

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N16P-0201-	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro	m	5,00	21,15	38,51	0,16	59,82
2	N26P-0101-	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija	100m	0,05	6,16	12,60	0,00	18,76
3	N16P-0501-	Movinės uždarnosios armatūros	vnt.	2,00	6,80	12,90	0,09	19,79
4	N18-76	Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų	kompl.	1,00	5,77	5,34	0,00	11,11
5	N16P-0805-	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis	vnt.	2,00	37,10	77,72	0,14	114,96
6	N18-101	Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki	vnt	2,00	55,47	138,86	0,00	194,33
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D	vnt	2,00	7,81	9,66	0,00	17,47
8	N18-165	iki 20 l talpos turinio šildytuvo montavimas	vnt.	4,00	324,30	514,61	0,00	838,91
9	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. K8=1.03	vnt	1,00	62,27	12,73	0,00	75,00
Viso žiniaraštyje S5					526,83	822,93	0,39	1350,15

PVM 21,00%

Iš viso

110,63	172,82	0,08	283,53
637,46	995,75	0,47	1633,68

Žiniaraštis

S6 Nuotekos

Suma žiniaraščiui

480,94

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-	m	5,00	22,05	28,31	0,00	50,36
2	N16P-1103-	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų	vnt.	2,00	4,58	10,48	0,00	15,06
3	N17-8-1	Sifono praustuvui pajungimas	kompl.	1,00	18,75	15,60	0,08	34,43
4	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas	vnt	1,00	54,12	38,45	0,00	92,57
5	N17-33-1	Praustuvės su maišytuvu montavimas,	kompl.	1,00	50,48	154,46	0,11	205,05
Viso žiniaraštyje S6					149,98	247,30	0,19	397,47

PVM 21,00%

Iš viso

31,50	51,93	0,04	83,47
181,48	299,23	0,23	480,94

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai

1. Statybos darbų objekto aprašymas:

- 1.1. statybos darbai perkami pagal Užsakovo poreikį 36 mėnesių laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo datos arba iki kol bus atlikta darbų už visą Sutarties sumą, jeigu ši sąlyga įvyks anksčiau.
- 1.2. Pirkimo objektas skaidomas į 4 dalis pagal Užsakovo paštų tinklo struktūrą (1 lentelė):
 - 1.1.1 statybos darbai Rytų regione;
 - 1.1.2. statybos darbai Pietų regione;
 - 1.1.3. statybos darbai Vakarų regione;
 - 1.1.4. statybos darbai Šiaurės regione.
- 1.3. Preliminarūs statybos darbų aprašymai ir kiekiai, reikalavimai medžiagoms nurodyti techninės specifikacijos 3 priede. Darbų kiekiai Sutarties galiojimo metu gali keistis, tačiau bendrai atliktų statybos darbų suma negali viršyti bendros vienam regionui skirtos maksimalios Sutarties kainos.
- 1.4. Statybos darbų preliminarios atlikimo vietos nurodytos techninės specifikacijos 1 lentelėje.
- 1.5. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio statybos priežiūra“, Statybos techniniu reglamentu STR STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintomis Rangovo įmonės statybos taisyklėmis, kitais galiojančiais norminiais teisės aktais, specialiaisiais architektūros reikalavimais ir kitais techninėje specifikacijoje išdėstytais reikalavimais.
- 1.6. Pirkimą laimėjęs Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos įstatymo, kitų teisės aktų tvarka patvirtintas statybos taisykles, pagal kurias bus vykdomi statybos darbai.
- 1.7. Rangovas patalpų vidaus statybos darbus turės atlikti pagal su Užsakovo atsakingu darbuotoju iš anksto suderintą grafiką, kaip numatyta 2.1. punkte, netrukdamat Užakovo darbuotojų veiklai, išorės statybos darbus – Rangovo pasirinktu darbo laiku, nepažeidžiant Užsakovo ar trečiųjų šalių interesų.
- 1.8. Už statybos darbus neįtrauktus į 2 priede numatytų darbų sudėtį ar Rangovo teikto pasiūlymo darbų sudėtį, bus atsiskaitoma pagal tuo metu galiojančius Sistela duomenų bazės įkainius. Rangovas gavęs užsakymą nenumatytiems techninės specifikacijos (1 priedo) 2 priede darbams atlikti per 5 darbo dienas turi pateikti sąmatą šių statybos darbų atlikimui ir suderinti ją su Užsakovo atstovu, gaudamas Užsakovo atstovo tvirtinimą parašu ir data.
- 1.9. Kiekvienu atveju, Užsakovas ir Rangovas suderinę sąmatą, pasirašo papildomą Susitarimą. Susitarimo šablonas pridėtas 1 priede.
- 1.10. 1-oje lentelėje nurodytos maksimalios Sutarčių kainos. Užsakovas įsipareigoja nupirkti iki 30 % darbų nuo Sutarties vertės.

2. Reikalavimai statybos darbų atlikimui

- 2.1. Užsakovui pateikus objekto statybos darbų užduotį, Rangovas privalo per ne ilgesnį nei dviejų savaitių laikotarpį (jeigu Užsakovas užduotyje nenurodo ilgesnio laikotarpio) suderinti su Užsakovu statybos darbų atlikimo grafiką, sąmatą, pasirašyti Susitarimą ir pradėti vykdyti darbus.
- 2.2. Užsakymas teikiamas Rangovui, Rangovo nurodytu el. paštu. Užsakymą sudaro:
 - 2.2.1. Tikslus objekto adresas;
 - 2.2.2. Reikalingų atlikti Darbų aprašymas;
 - 2.2.3. Patalpų planas;
 - 2.2.4. Darbų vykdymo terminas;
 - 2.2.5. Statinio techninis projektas (jeigu yra).
- 2.3. Pirkimą laimėjęs Rangovas turi naudoti naujas, originalias prekes. Medžiagos, įranga, ir įrenginiai turintys cheminių medžiagų, bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.
- 2.4. Rangovas privalo savo lėšomis išsivežti utilizacijai visas susidariusias atliekas (instaliacines medžiagas, įrenginius ir kt.) ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais. Po statybos darbų patalpas, aplinką palikti švarias ir tvarkingas.
- 2.5. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atliktų matavimų, patikrų, bandymų, apžiūrų rezultatų protokolus bei kitą pagal Lietuvos Respublikos norminius ir teisės aktus reikiamą pildyti dokumentaciją lietuvių kalba, naudotų gaminių, medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas arba kitus atitiktį įrodančius dokumentus, saugos duomenų lapus arba jų kopijas, taip pat Rangovo statybos taisyklių kopiją.
- 2.6. Rangovas privalo skirti asmenį, atsakingą už statybos darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę statybos darbo metu.
- 2.7. Rangovas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, vykdant darbus Užsakovo objektuose. Rangovas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis.
- 2.8. Rangovo darbuotojai, vykdydami darbus Užsakovo statybvietyje, privalo dėvėti švarią ir tvarkingą aprangą su įmonės skiriamaisiais ženklais.
- 2.9. Rangovo darbuotojai statybos darbus turi atlikti kokybiškai, nepažeisti, nesugadinti materialinių vertybių, užtikrinant materialinių vertybių saugumą. Rangovas atlygina Užsakovui arba trečiosioms šalims Rangovo darbuotojų padarytą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

1 lentelė. Numatomos statybos darbų atlikimo vietos.

Regionas	Maksimali planuojama suma be PVM	Regionas apima
Rytų regione	iki 302.000 EUR	Ignalinos r. sav. Visagino sav. Molėtų r. sav. Šalčininkų r. sav. Švenčionių r. sav. Trakų r. sav. Elektrėnų sav. Vilniaus m. sav. Vilniaus r. sav.
Pietų regione	iki 159.700 EUR	Alytaus r. sav. Kaišiadorių r. sav. Kauno m. sav.

		Kauno r. sav. Druskininkų sav. Lazdijų r. sav. Kazlų Rūdos sav. Kalvarijos sav. Marijampolės sav. Prienų r. sav. Birštono sav. Elektrėnų sav. Varėnos r. sav. Vilkaviškio r. sav.
Vakarų regione	iki 154.000 EUR	Jurbarko r. sav. Kelmės r. sav. Klaipėdos r. sav. Klaipėdos m. sav. Neringos sav. Palangos m. sav. Kretingos r. sav. Mažeikių r. sav. Plungės r. sav. Rietavo sav. Raseinių r. sav. Skuodo r. sav. Šakių r. sav. Šilalės r. sav. Šilutės r. sav. Tauragės r. sav. Pagėgių sav. Telšių r. sav.
Šiaurės regione	iki 203.000 EUR	Anykščių r. sav. Biržų r. sav. Jonavos r. sav. Joniškio r. sav. Kėdainių r. sav. Kupiškio r. sav. Akmenės r. sav. Pakruojo r. sav. Panevėžio m. sav. Panevėžio r. sav. Pasvalio r. sav. Radviliškio r. sav. Rokiškio r. sav. Šiaulių r. sav. Šiaulių m. sav. Širvintų r. sav. Ukmergės r. sav. Utenos r. sav. Zarasų r. sav.

SUSITARIMAS

prie 2018 m. mėn. d. Sutarties Nr. 18/R-.....

201.. m. mėn. d.

Vilnius

UAB „.....“, juridinio asmens kodas, buveinės adresas,
miestas, atstovaujama direktoriaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau -
Rangovas), iš vienos pusės ir

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas, juridinio asmens kodas 121215587, PVM mokėtojo kodas
LT212155811, buveinės adresas Jasinskio g. 16, Vilnius, atstovaujama Bendrųjų reikalų departamento
vadovo, veikiančio pagal bendrovės išduotą įgaliojimą (toliau - Užsakovas), iš kitos
pusės,

atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. mėn. ... d. šalys sudarė Nekilnojamojo turto statybos darbų
pirkimo sutartį Nr. 18/R-..... (toliau – Sutartis) dėl statybos darbų atlikimo Užsakovo
valdomuose nekilnojamojo turto objektuose.

Sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria papildyti pasirašytą Sutartį šiuo Susitarimu ir išdėstyti jį taip:

SUSITARIMO OBJEKTAS

Atlikti pridėtame 1 priede, lokalinėje sąmatoje
nurodytus darbus, Užsakovo valdomame
nekilnojamojo turto objekte, esančiame adresu
.....

DARBŲ KAINA

....., EUR (..... euras (-ai, -ų) ir euro
centas (-ai, -ų)) be PVM, PVM sudaro
EUR (..... euras (-ai, -ų) ir euro centas (-ai, -
ų)), kas iš viso sudaro EUR (..... euras (-
ai, -ų) ir euro centas (-ai, -ų)).

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

Atlikti 1 priede nurodytus darbus iki 201.. m.
mėn.d.

ATSAKINGI ASMENYS

Už 1 priede nurodytų darbų kokybišką ir savalaikį
darbų atlikimą atsakingas Rango atstovas Vardenis
Pavardenis, mob. tel.: +370 6...., el. p.
.....@.....

Už 1 priede nurodytų atliekamų darbų kontrolę ir
atliktų darbų priėmimą atsakingas Užakovo atstovas
Vardenis Pavardenis, mob. tel.: +370 6...., el.
p.@.....

2. Kaip priedas prie susitarimo pridedama Rangovo paruošta ir Užsakovo patvirtinta lokalinė sąmata (1 priedas).
3. 1-ame priede nurodyti darbų įkainiai negali skirtis nuo Sutartyje nurodytų įkainių.
4. Kitos Sutarties nuostatos lieka galioti nepakeistos.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.
6. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Šis Susitarimas ir jo priedai gali būti pakeistas ar papildytas tik dvišaliu raštišku Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
8. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais: po vieną kiekvienai Šaliai.

Rangovas:

UAB „.....“

Juridinio asmens kodas

Adresas:,

A. s. LT

AB bankas

Užsakovas:

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius

Juridinio asmens kodas 121215587

PVM mokėtojo kodas LT212155811

Tel. 8 700 55400

A. s. LT71 7044 0600 0018 7388

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Direktorius

.....

A.V.

Bendrųjų reikalų departamento vadovas

.....

A.V.



PRELIMINARŲ STATYBOS DARBŲ APRAŠYMAI, REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS



1. Išorės darbai.

1.1. Išorės laiptai:

Laiptų pakopos aukštis turi būti – 15-17 cm, o jos plotis 30-40cm.

Laiptų pakopų, aikštelių danga:

- Laiptų pakopoms naudojamos klinkerio pakopos plytelės, laiptų aikštelėms, tos pačios kolekcijos klinkerio plytelės (2 pav.). Betono pagrindas turi būti padengtas cementinės hidroizoliacijos sluoksniu, ant kurio, klėjais tinkančiais klinkerio kljavimo lauko sąlygomis, klijuojamos klinkerio pakopų plytelės. Tarpai užpildomi vandeniui atspariu klinkerinių grindų plytelių siūlių glaistas cemento pagrindu, skirtu lauko sąlygoms;

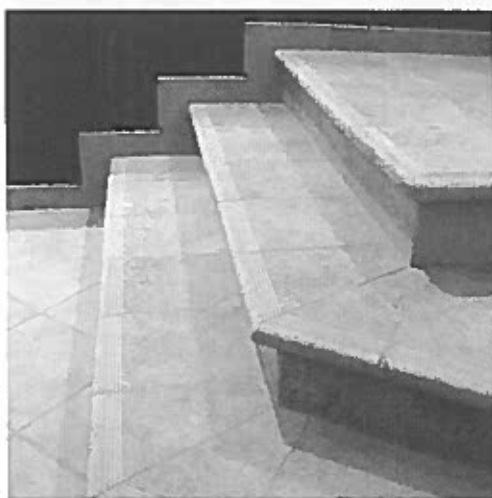

2 pav. Laiptų iš klinkerio plytelių danga.

- įrengiama natūralios spalvos betoninių trinkelų (200x100x60 mm) danga (3 pav.);



3 pav. Trinkelų danga

-


1.2. Pandusas.

- panduso plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių;

– panduso pradžioje bei pabaigoje ir ten, kur panduso juosta keičia kryptį, turi būti įrengta poilsio aikštelė ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm. Ne rečiau kaip kas 9 000 mm panduso juostos ilgio ir ne rečiau kaip kas 750 mm vertikalaus pakilimo turi būti įrengta poilsio aikštelė, kurios ilgis būtų ne mažesnis nei 1 500 mm, o plotis ne mažesnis už panduso juostos plotį.

1.3. Turėklai.

Montuojami laiptų kraštuose. Nerūdijančio plieno turėklas, statramstis – nerūdijančio plieno vamzdis d 40 mm prie jo montuojami užpildų laikikliai, porankis – nerūdijančio plieno vamzdis d 40 – d 50 mm, užpildas – nerūdijančio plieno vamzdis d 12 mm. Porankis turi būti 1000 mm aukštyje nuo pakopų. Turėklų paviršius turi būti lygus, ištisinis ir be išsikišimų. Turėklų stveriamoji konstrukcija turi būti patogi suimti ranka (5 pav.).

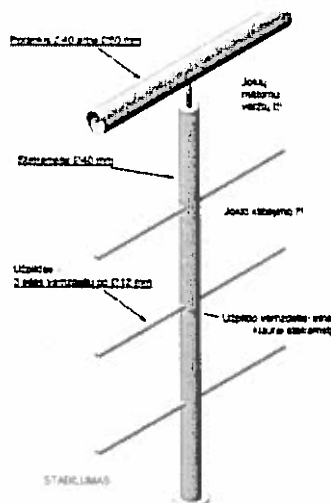


5 pav. Turėklai

Tarp turėklo ir sienos paviršiaus turi būti paliktas ne siauresnis kaip 40-50 mm tarpas. Šiame tarpe neturi būti šiurkščių paviršių, aštrių elementų ar kyšančių konstrukcijų. Turėklai turi būti gerai įtvirtinti: jie neturi klibėti, linkti ar sukinėtis aplink savo ašį.

1.4. Dviračių stovas.

Ne toliau kaip 5 m nuo pagrindinio įėjimo įrengiamas 3 vietų dviračių stovas. Rėmas gaminamas iš kvadratinio 30 mm kvadratinio profilio, vamzdžiai 16 mm skersmens. Visa konstrukcija padengta cinku arba nerūdijančio plieno, tai dviračio stovą apsaugo nuo aplinkos poveikio. Tvirtinamas ankeriais prie grindinio. Matmenys – 720 x 330 x 250 mm (6 pav.).

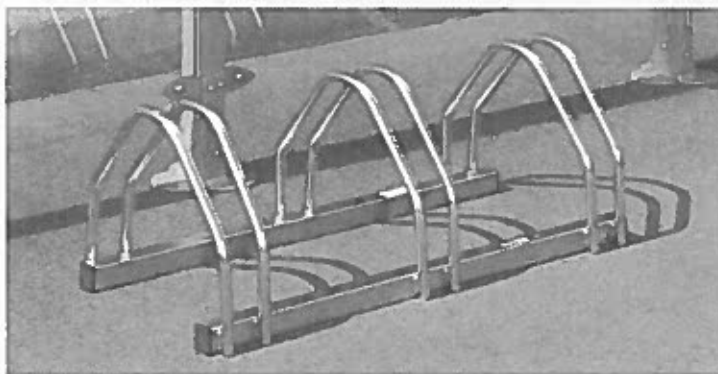


6 pav. Dviračių stovas

1.5. Lauko durys.

Keičiamos tik nesandarios, susidėvėjusios arba mechaniškai pažeistos durys.

Pagrindinio įėjimo į pastatą išorinės durys turi būti PVC rėmo konstrukcijos su stiklo paketo užpildu. Durys turi turėti durų varčios pritraukimo mechanizmą „Geze“ arba ne prastesnių kokybinių parametrų, vyriai - cilindriniai 3D reguliuojami, stiklo paketas – 33.1VSG – 16arg – 33.1VSGTF (laminuotas, saugus dūžio atveju), šilumos laidumo koeficientas – 1,1 W/(m²K), spyna (užraktas) – 3-jų taškų (spyna komplektuojama su septynių raktų komplektu). Stacionari „ofisinė“ rankena (7 pav.). Mechaninių durų įrengimo specifikacija:

- durys gali būti vienvėrės arba dvivėrės esant platesnei angai nei 1100 mm, su viena pasyvia durų varčia, atsiveriančios į išorę. Gali būti su viršulangiū esant aukštesnei angai nei 2200 mm;
- durų varčios plotis ne mažesnis nei 1000 mm;
- durys turi būti komplektuojamos kartu su durų varčios pritraukimo mechanizmu, kojele durų varčios fiksavimui;
- išorinių durų mechaninio patvarumo klasė pagal STR 2.05.20:2006 – šešta;
- durys turi neturėti aštrių atsikišusių dalių su kuriomis gali kontaktuoti praeiviai. Jeigu tokių dalių yra, turi būti įrengiami atitvarai ir atitinkamos apsaugos;
- slenksčiai ne aukštesni nei 12mm ir nuleistais kampais, kad būtų kuo mažesnė rizika užkliūti;
- stiklai turi būti saugūs. Atitikti EN 12150-1, EN ISO 12543-1, EN ISO 12543-2 standartus. Tokioms konstrukcijoms negalima naudoti paprasto lietinio ir armuoto stiklo, nes jam dužus kyla didelė sužalojimų grėsmė.
- garantinis durų laikotarpis – ne mažiau 2 metai.

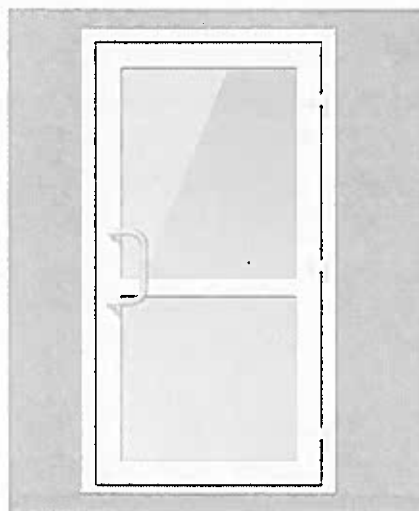

7 pav. Lauko durys

Pagalbiniam išoriniam įėjimui montuojamos metalinės apšiltintos durys ne mažiau 900 mm pločio ir 2000 mm aukščio. Laukinių įėjimo durų saugumo klasė VK-3. Durys turi turėti durų varčios pritraukimo mechanizmą, atraminę kojelę, fiksuojančią duris atidarytoje padėtyje, bei akutę. Spalva – šviesiai pilka. Spynos komplektuojamos su septynių raktų komplektu. Garantija durims ne mažiau 2 metai.

1.6. Langai.

Keičiami tik esami nesandarūs, mechanškai pažeisti langai kartu su išorės ir vidaus palangėmis, naujais plastikiniiais langais ir naujomis palangėmis, atstatomi ir apdailinami lauko ir vidaus angokraščiai. Langų suskirstymas atliekamas analogiškai esamiems langams. Konkrečiame objekte montuojama ne daugiau nei 50 % varstomų langų (horizontaliai, vertikaliai, mikroventiliacija), likę langai – nevarstomi (8 pav.). Minimalūs langų reikalavimai:


- ne mažiau kaip 5 kamerų profilis;
- profilio spalva viduje – balta, iš išorės – balta (jeigu nenurodoma kitaip, kad derintųsi prie esamo fasado);
- stiklo paketas vienos kameros;
- langų šilumos perdavimo koeficiento U ($W/(m^2 \cdot K)$) vertė turi būti ne didesnė kaip $1,4 W/(m^2 \cdot K)$;
- langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm;
- langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;
- langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm;
- langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne mažesnis kaip 1,5 mm;
- languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno M klasės gumos (EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono;
- PVC profilis yra vienalytis per visą jo pjūvį;
- PVC langai negali būti gaminami iš Lietuvos klimatui netinkamo plastikinio profilio pagal galiojančius reglamentus;
- lauko palangės – cinkuotos (jeigu nenurodoma kitaip), skardos matmenys parenkami priklausomai pagal sienos storį;
- vėjo apkrovos klasė – A1;
- vandens nepralaidumo klasė – 4A, 4B;
- oro skverbties klasė – 2;
- mechaninio patvarumo klasė – 1;
- mechaninio stiprio klasė – 1;
- garantinis aptarnavimas – ne mažiau 5 metai.



8 pav. Langai

1.7. Stogelis virš įėjimo.

Virš išorės durų įrengiamas lengvą konstrukciją, dengtas skaidriu polikarbonatu, stogelis. Stogelis įrengiamas ne žemiau 2200 mm ir ne aukščiau 2700 mm nuo pagrindo. Stogelio matmenys 1500x1000 mm (9 pav.).




9 pav. Stogelis virš įėjimo

1.8. Fasadas.


1.9. Medžio apdailos fasadai.

Fasado apdailai naudojamos eglinės dailylentės (kokybės klasė ne mažesnė nei B). Fasado apdailai naudojamos medienos drėgmė turi būti mažiau nei 20 %. Dažomų dailylenčių drėgmė, priklausomai nuo dažų rūšies gali būti 15-18%. Naudojamos 28 mm storio dailylentės, kurios jau gamykloje padengtos pradiniu dažų sluoksniu, antrą kartą dailylentės dažomos jas sumontavus ant fasado. Už dailylenčių paliekamas 22 – 25 mm atviras tarpas vėdinimui. Cokolio aukštis turi būti toks, kad dailylenčių apatinis kraštas būtų nuo žemės mažiausiai 300 mm aukštyje. Lietvamzdžiai ir latakai turi būti sandarūs, PVC, vieno gamintojo sistemos, tamsiai rudos spalvos. Pakraigės plotis turi būti nuo 300 mm. Galimi dailylenčių profiliai (12 pav.):

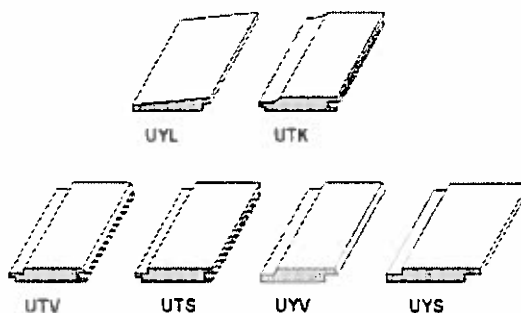


12 pav. Dailylenčių profiliai


Dailylentės tvirtinamos horizontaliai (13-20 pav.):

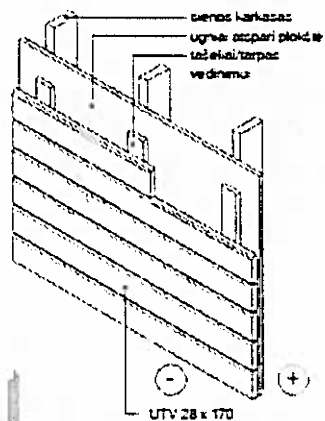


13 pav. Horizontaliai tvirtinamų *dailylenčių* pavyzdys. Lentos UTV 28 x 170 mm.

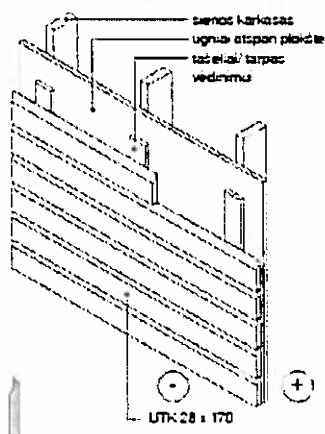


14 pav. Horizontaliai tvirtinamų *dailylenčių* pavyzdys. Lentos UTK 28 x 170 mm.

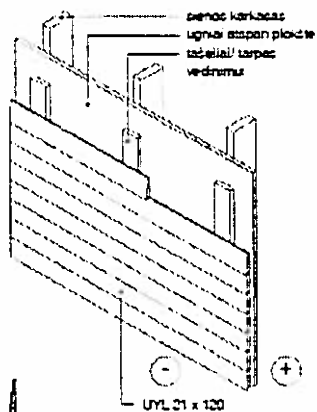


15 pav. Horizontaliai tvirtinamų *dailylenčių* pavyzdys. Lentos UYL 28 x 120 mm.

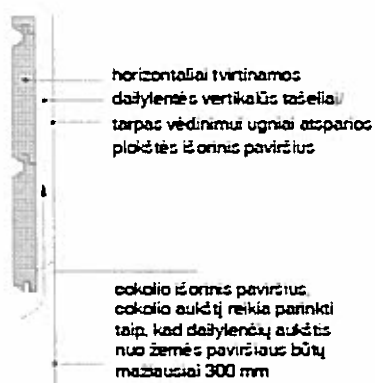


16 pav. Horizontaliai tvirtinamų *dailylenčių* apatinė dalis / tarpas vėdinimui. Lentų apatinė dalis atidžiai nudažoma.




17 pav. Horizontaliai tvirtinamomis UTS dailylentėmis sienos kampas. Kampą galima padaryti be kampinių lentų. Tokiu atveju lentų pakraščiai nupjaunami kampu.



18 pav. Iš kampu nupjautų UYL daililenčių padarytas kampas.

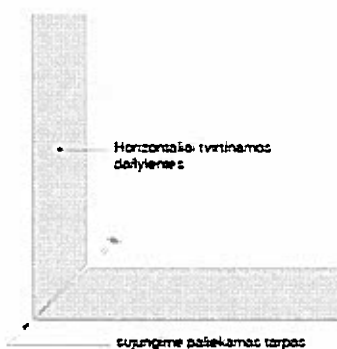

19 pav. Horizontaliai tvirtinamų daililenčių išorinio kampo sujungimas. Lentos pjaunamos taip, kad galinėje dalyje sujungimas liktų 2 mm atviras.

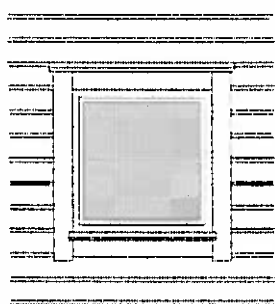

20 pav. Lango priderinimas prie horizontaliai tvirtinamų plačių daililenčių. Virš ir apačioje lango yra pritaisyta skarda su nuolydžiu į išorę.

1.10. Tinkuoti fasadai.

Nuvalomi esami dažai, atšokę dažai nuvalomi mechaniškai. Visi įtrūkimai rievėjami, užpildomi specialiais įtrūkiams užpildyti skirtais mišiniais/hermetikais, sutvirtinimui klijuojamas stiklo pluošto tinkliukas ir glaistomas cementiniu fasado glaistu. Nuo mūro atšokęs tinkas nudaužomas. Paviršiai paruošiami dažymui, gruntuojami ir dažomi du kartus silikatiniais dažai. Spalva parenkama artimiausia esamai fasado spalvai.

Paviršius prieš dažant turi būti vientisas, švarus, sausas ir lygus. Tinkuoto paviršiaus drėgmė - < 8 proc. Kiekvieno sluoksnio paviršius turi būti lygus, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažyto paviršiaus kokybė turi vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus.

Paviršius, padengtas dažais, turi būti vienodo tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. Vietinis taisymas 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomas. Negali būti išsisluoksniavusių pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko arba volelio žymių, neturi prasišviesti apatinis dažų sluoksnis.

Seni lietvamzdžiai ir latakai keičiami naujais, keičiant tvirtinimo elementus. Latakai ir lietvamzdžiai turi būti sandarūs, skardiniai, dengti PVC, vieno gamintojo sistemos, tamsiai rudos spalvos (jei nenurodoma kitaip).

1.11. Vartai. Montuojami segmentiniai pakeliami garažo vartai iš horizontalių juostų – segmentų. Segmentiniai pakeliami garažo vartai turi būti su įmontuotais langeliais ir durimis. Spalva RAL 7035. Preliminarūs vartų matmenys – aukštis - 3 m; plotis – 2,8 m.

2. Vidaus darbai.

2.1. Grindys.

Esama grindų danga išardoma, atliekamas grindų lyginimas išlyginamaisiais mišiniais. Paviršius dengiamas klijuojant PVC grindų danga, suvirinant siūles.

Prieš liejant grindų išlyginamuosius mišinius, turi būti:

- išvedžiota kanalizacijos ir vandentiekio sistema;
- pakloti elektros maitinimo kabeliai klientų aptarnavimo salės įrangos pajungimui;
- pakloti kompiuterinių tinklų magistraliniai vamzdžiai.

Esant medinėms grindų konstrukcijoms, įrengiamas 22 mm storio špuntuotų MFP plokščių paklotas. Pažeistos lagės keičiamos naujomis. Medinių konstrukcijų grindys negali deformotis ar girgždėti.

Grindjuostės:

- Užleidžiama PVC grindų danga;
- Iki 100 mm aukščio.

2.1.1. Sienų apdaila.

Sienos virš grindjuostės aptaisomos 18 mm storio, baltos matinės spalvos (RAL9016 LMDP) plokšte. Tvirtinamos ant laikiklių arba klijuojamos, neturi būti matomų tvirtinimo elementų ar varžtų galvutė. Tarp plokščių sujungimų paliekamas 5 mm tarpas. Plokščių kraštinės laminuojamos balta PVC juosta. Atstumai tarp tarpų turi būti vienodi.

2.1.2. Pertvaros.

Visos naujos vidinės pertvaros montuojamos naudojant gipso kartono plokščių pertvarų sistemas. Gipso kartono plokštės naudojamos vidaus sienų paviršių apdailai, pertvarų, dekoratyvinių elementų, papildomam konstrukcijų apšiltinimo įrengimui, ugniaatsparumui didinti, inžinerinių komunikacijų uždengimui.

Įrengiant pertvaras, gipso kartono plokštės tvirtinamos prie metalinio karkaso iš lenktų cinkuotų profilių savisriegiais sraigtais – plokštės kraštuose kas 150mm, viduryje kas 300mm. Jungtys daromos lygios ir nematomos. Siūlės užglaistomos, užklijuojamos stiklo audinio juoste, glaistomos. Sraigtų galvutės turi būti įgilintos ir užglaistytos.

Pertvarų iš gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimus. Visi kampai apsaugomi tam skirtais specialiais kampuočiais. Visi sienų paviršiai aptaisyti gipso kartono plokštėmis turi būti vertikalūs, kampai statūs, išskyrus nurodytus brėžiniuose.

Gipso kartono plokščių, naudojamų pertvarų įrengimui, paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų, briaunos be ištrupėjimų, neturi būti riebalinių ir kitokių dėmių, plokščių storis vienodas (plokštės turi būti vieno tiekėjo, vieno gamintojo).

Pertvaroms įrengti naudojami metaliniai cinkuoti karkaso profiliai, statomi vertikaliai kas 600 mm arba kaip nurodyta brėžiniuose ir ties horizontalioms siūlėms (CW). Prie grindų ir prie lubų tvirtinami specialūs loviniai karkaso profiliai (UW). Tarp sienų ar grindų paviršiaus ir profilio turi būti

įrengtas garso izoliacinės juostos sluoksnis. Visi, pašte naudojami, gipso kartono lakštai turi būti drėgmei atsparūs.

Pagrindinis reikalavimas pertvaroms - absoliutus sandarumas. Jungtys su sienomis ir perdangomis turi būti hermetiškos, nedegios ir izoliuojančios garsą. Pertvaros turi būti ištisinės nuo grindų iki perdangos arba kaip nurodyta brėžiniuose.

Visur, kur reikalinga, pertvarų konstrukcijoje turi būti sumontuoti inžineriniai tinklai ir įrengti revizijų liukai. Pertvarose montuojama elektros instaliacija, jokia būdu, negali pažeisti akmens vatos garso ar šilumos izoliacinių savybių.

Visur, kur reikia prie pertvaros tvirtinti santechnikos ar kitą įrangą, pertvaros konstrukcijoje turi būti įrengtas papildomas metalinis cinkuotas karkasas, impregnuota medžio drožlių plokštė ar cinkuota plokštelė, vamzdynų laikikliai pagal naudojamos sistemos gaminius. Durų angoms ir sieninių baldų tvirtinimo vietose turi būti naudojami sustiprinti plieniniai profiliai (UA).

Rekomenduojamas gipso kartono pertvarų storis 100mm – 125mm.

2.1.3. Lubos.

Įrengiamos pakabinamos segmentinės „Amstrong“ tipo lubos su lygiu baltu mineraliniu užpildu.

Plokščių matmenys: 600x600 mm, 17mm storio, mineralinės, baltos, lygios. Priklausomai nuo patalpų priešgaisrinių reikalavimų gali būti įrengiamos atvirojo tipo (vietoje plokščių montuojamos grotelės) lubos. Šviesos atspindžio koeficientas turi būti ne mažiau 80%.

Garso izoliacija 34dB 5. Sunkiai degios LST 1531/1K

Lubos turi būti valomos sausa kempine ar vakuuminiu būdu. Paketai ir gaminys turi būti naudojami pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.

Visos atvežtos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime.

Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai:

- apdailiniai – sukuriantys matomą patalpų lubų paviršių;
- kontūriniai – įrengiami lubų apdailinių elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų atitvaromis vietose;
- laikantys – naudojami Tegular tipo 15mm profiliai įgilintam plokščių montavimui;
- tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t.t.) – naudojamos surenkant ir pakabinant laikančius bei apdailinius elementus.

Apdailinių elementų jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turi būti naudojamas 32 × 32 mm kontūrinis elementas iš šaltai lenkto cinkuoto profilio. Jis kas 1000 mm tvirtinamas Ø 4,5 mm kietvinėmis.

Plieninės tvirtinimo detalės turi būti cinkuotos, o sraigčiai ir varžtai cinkuoti arba padengti kadmiu.

Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos.

Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaujami pagal šviestuvo kontūrą (jei šviestuvai įleidžiami), turi būti suderinta su AB Lietuvos paštas atstovu.

Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo.

Pakabinamos lubos montuojamos sumontavus jų karkasą (pagal projektinį sprendimą). Karkaso horizontalumas turi atitikti projektines altitudes. Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti.

Visos virš lubų esančios sienų ir pertvarų dalys turi būti užsandarintos, be plyšių ir angų, remtis į perdangos konstrukcijas.

Jei pakabinamų lubų apatinė dalis nutolusi nuo perdenginio daugiau kaip 0,4 m, tai po juo būtina papildomai įrengti gaisrinius signalizatorius.

2.1.4. Vidaus durys.

Vidaus durys (išskyrus virtuvės ir WC duris) pagalbinėse patalpose turi būti ne mažesnės kaip 2000 mm x 900 mm, baltai (RAL 9016) dažyta, laminuota MDF (vidutinio tankio medienos plaušų plokštė), metalinės. Visos durys (išskyrus virtuvės ir WC duris) komplektuojamos su rankenomis, autonominė praėjimo kontrole, pritraukėju ir mechaninėmis spynomis. Kiekviena spyna komplektuojama su septyniomis kortelėmis ir septyniais raktais. WC ir virtuvės patalpoms naudojamos

ZK tipo metalinės durys 875x2000mm, baltos spalvos, lygios. WC durys komplektuojamos su užrakinimo suktuku iš vidinės pusės ir su indikatoriumi iš išorinės pusės.

2.1.5. Autonominė praėjimo kontrolė.

Visos vidaus durys, išskyrus virtuvę ir sanitarinį mazgą, komplektuojamos su autonome praėjimo kontrole. Šalia durų turi būti sumontuota kodinė klaviatūra su kortelių skaitytuvu. Metalinis korpusas (garsinė, šviesos indikacija), apšviečiami mygtukai, montavimas – virštinkinis, atmintis iki 1000 kortelių, programuojamas naudojant administratoriaus kodą, kortelės nuskaitymo atstumas 5 - 10 cm., durys atidaromos surinkus kodą arba pridėjus kortelę. Išorinė rankena nejudri, vidinė nulenkiama. Sklendė – elektromagnetinė.

3. Inžinerinės sistemos.

3.1. Elektrotechninė dalis:

3.1.1. Bendrieji reikalavimai:

Būtina vadovautis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis:

- specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės;
- STR2.01.04:2004 Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai;
- Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EIT);
- Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės;
- HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;

bendrieji matavimo reikalavimai“;

- STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“;
- Kitos Lietuvoje galiojančios normos ir standartai.

Pagrindinė elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros energijos tiekimo sistemoje reikalavimus, kurios charakteristikos yra tokios:

- žema įtampa 400V/ 230V;
- 3 fazės, TN-S tinklo posistemė;
- dažnis 50 Hz;

Elektros lizdai įrengiami pagal pateiktą elektros ir kompiuterinio tinklo lizdų išdėstymo planą.

3.1.2. Elektros energijos tiekimas

Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

- žema įtampa $400V \pm 5\%$ / $230V \pm 5\%$;
- 3 fazės, TN-S tinklo posistemė;
- Dažnis 50 Hz.

3.1.3. Elektros jėgos tinklai

Patalpų jėgos tinklams montuojamas naujas skydas nemažiau IP30.

Patalpų jėgos tinklams ir apšvietimui elektros paskirstymui skyde montuojami nauji automatiniai jungikliai.

Grupiniai tinklai klojami sienose po tinku/gkp, lubų konstrukcijose ir PVC loveliuose, vamzdžiuose. Vidaus tinklams naudojami kabeliai varinėmis gyslomis su PE laidininku (5 laidininkų trifazėje sistemoje ir 3 laidininkų vienfazėje sistemoje). Naudojami savaime gęstantys (nepalaikantys degimo) A kategorijos kabeliai.

Visi kabelių praėjimai per sienas, grindis hermetizuojami instaliacinėmis medžiagomis, kurių atsparumas ugniai yra toks pats, kaip ir kertamų konstrukcijų. Iki 2m aukštyje nuo grindų lygio ir praėjimų per sienas, grindis, kabeliai apsaugoti 25mm vamzdžiais.

Visi darbai atliekami pagal Lietuvoje galiojančias normas.

3.1.4. Reikalavimai medžiagoms, įrenginiams.

Visos medžiagos ir įrenginiai, tiekiami pagal šį standartą, turi atitikti nurodytas specifikacijas ir turi būti sukonstruoti ir pagaminti gamyklos sąlygomis. Medžiagos turi atitikti vartojimo paskirtį. Prietaisai turi būti naujausių modelių – nauji ir nenaudoti, išskyrus tuos, kurie reikalingi testavimui.

Visos medžiagos ir įrenginiai turi turėti CE žymenį.

Turi būti užtikrintas instaliacijos ir įrenginių kvalifikuotas aptarnavimas.

Visi vienodos kategorijos prietaisai turi būti vieno gamintojai.

Sudėtiniai įrenginiai gali būti surinkti iš atskirų gamintojų komponentų, tačiau gamintojas, surinkęs įrenginius, turi atsakyti už galutinį rezultatą ir komponentų suderinamumą. Visa įranga turi būti atspari skaičiuotai trumpo jungimo srovei.

Iki 1 kV kabeliai turi atitikti šiuos reikalavimus:

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartas	LST EN 50525-2-1
2.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje	Pateikti bandymų protokolų kopijas
3.	Vardinė įtampa	$U_0/U \geq 450/750$ V
4.	Vardinis dažnis	50 Hz
5.	Bandymo įtampa	≥ 2500 V, 50 Hz, 5 min.
6.	Eksploatavimo sąlygos	Uždaroje patalpoje
7.	Aplinkos temperatūra	-35 °C ... +35 °C
8.	Laidininkų skaičius	3
9.	Laidininkas	Atkaitintas apvalus varis, 5 klasė pagal LST EN 60228
10.	Laidininkų izoliacija	PVC
11.	Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas	Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757
12.	Išorinis apvalkalas	PVC
13.	Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra	+70 °C
14.	Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s)	+160 °C
15.	Žemiausia montavimo temperatūra	-5 °C
16.	Kabelio skerspjūvio plotas	1,5mm ² . 2,5 mm ² .
17.	Minimalus lenkimo spindulys montuojant	10xD; sulenkus vieną kartą 8xD. D – išorinis kabelio skersmuo
18.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metų
19.	Garantinis laikas	≥ 12 mėnesių

0,4 kV automatiniai jungikliai:

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikšmė, sąlyga
1.	Standartas	IEC 60898
2.	Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu	CE
3.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje	Pateikti bandymų protokolų kopijas
4.	Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi	Pateikti bandymų protokolus kartu su automatiniais jungikliais
5.	Skirtas naudoti	Lauke ir patalpoje
6.	Aplinkos temperatūra	-25 °C ÷ +35 °C
7.	Santykinė oro drėgmė	≤ 95 %
8.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m
9.	Vardinė įtampa	230 V/400 V AC

10.	Maksimalioji įtampa	440 V
11.	Vardinis dažnis	50 Hz
12.	Tinklo neutralė	Ižeminta
13.	Vardinė izoliacijos įtampa	≥ 500 V
14.	Vardinė impulsinė įtampa	≥ 4 kV
15.	Vardinė srovė (Ie)	25 A; 20A; 16A
16.	Maksimali atjungimo srovė (Ics)	6 kA
17.	Atsparumas susidėvimui (darbo ciklų skaičius)	elektrinis ≥ 10000; mechaninis ≥ 20000.
18.	Kategorija	C
19.	Apsaugos laipsnis	IP2X
20.	Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje)	≥25 mm ²
21.	Laidininko prijungimas	Varžtiniais apkabiniais gnybtais
22.	Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai)	Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams
23.	Atkabiklio poveikis	Nurodomas užsakant: nuo šiluminės elektromagnetinės apsaugos;
24.	Atkabiklio poveikio reguliatorius	Nurodoma užsakant: be reguliatoriaus; su reguliatoriumi.
25.	Polių skaičius	1; 3
26.	Tvirtinimo būdas	kaišių (-io) pagalba ant montažinio DIN bėgelio (šynos)
27.	Korpuso medžiaga	Aukštos kokybės izoliacinė medžiaga, nepalaikanti degimo
28.	Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma	Vardinė srovė; Kategorija; Mnemoschema; Įjungimo ir išjungimo padėtys.
29.	Techniniai dokumentai	Automatinio jungiklio pasas (bandymo protokolai); Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba.
30.	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai
31.	Garantinis laikas	≥ 12 mėnesių

3.1.4.1. Instaliaciniai kanalai

Inst. kanalas 100x50 su dangčiu, baltas. Skirtas instaliuoti rozetes, jungiklius.

3.1.4.2. Kabeliai

Laidininkas

Izoliacija

Gyslų spalvos

Vienvielis, atkaitinto vario, 1 klasė pagal LST EN 60228+AC

TI 1 tipo PVC izoliacinis kompaundas pagal LST EN 50363-3

Izoliuotų gyslų spalvos pagal LST HD 308

<i>Apvalkalas</i>	<i>TM 1 tipo PVC apvalkalinis kompaundas pagal LST EN 50363-4-1</i>
<i>Apvalkalo spalva</i>	<i>Balta, juoda arba pagal užsakovo reikalavimus</i>
<i>Įžeminimo gysla</i>	<i>Žaliai/geltona, pagal LST EN 50396</i>
<i>Gyslų skaičius</i>	3
<i>Gyslos skerspjūvis, mm²</i>	2.5

3.1.5. Jėgos ir apšvietimo skydai.

Jėgos ir apšvietimo tinklo skydai skirti jėgos ir apšvietimo tinklo elektros energijos paskirstymui. Skydai turi būti su durimis ir užraktais. Jėgos ir apšvietimo skyduose turi būti pritvirtintos aiškiai matomos ir parašu patvirtintos skydą įrengusio asmens schemos.

Skydai komplektuojami su įvadiniais tripoliais kirtikliais ir linijiniais tripoliais ir vienpoliais automatiniais jungikliais su nuotėkio srovės apsauga.

Skyde montuojami automatiniai jungikliai skirti apsaugai nuo perkrovimo, trumpo jungimo ir nuotėkio srovių.

Skydai turi būti metaliniai arba plastikiniai, pritaikyti uždarams patalpoms.

Prijungtos apkrovos turi būti tolygiai paskirstytos tarp fazių.

Skydai turi būti pritaikyti aptarnavimui, kabelių prijungimui ir prietaisų pakeitimui iš priekio. Skydai turi turėti kabelių įėjimus apačioje arba viršuje. Kiekvienas skydas turi turėti 30% vietos rezervą išplėtimui ateityje. Visi metaliniai skydų elementai turi būti patikimai sujungti su įžeminimo kontūru.

3.1.5.1. Elektros skydo komplektacija		
<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas</i> <i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis</i>
1	<i>Paskirstymo skydas 54 mod.</i> <i>vnt.</i>	1
2	<i>Trifazis automatinis išjungiklis, 3F/25 A „C“</i> 1	<i>vnt.</i>
3	<i>Vienfazis automatinis išjungiklis, 1F/20 A „C“</i> 20	<i>vnt.</i>
4	<i>Vienfazis automatinis išjungiklis, 1F/20 A „C“ apšv.</i> 10	<i>vnt.</i>
5	<i>Srovės nuotėkio jungikliai</i> 2	<i>vnt.</i>
6	<i>Modulinis trifazis skaitiklis</i> <i>vnt.</i>	1

3.1.6. Kištukiniai lizdai.

Visi kištukiniai lizdai (rozetės) turi būti su atskiru įžeminimo (PE) kontaktu. PE Kontaktas turi būti tokios konstrukcijos, kad, įjungus į lizdą tinkamu kištuku bet kokį kilnojimą elektros įrenginį, būtų užtikrintas jo įžeminimas. Kištukiniai lizdai turi būti paslėpto tipo.

Lizdai WC patalpoje turi būti min. IP44 tipo ir turi turėti spyruoklės pagalba užsidarančius dangtelius. Klientų aptarnavimo staluose kištukiniai lizdai montuojami į instaliacinius kanalus ir turi būti pateikti komplekte su to paties gamintojo atitinkančiomis montavimo dėžutėmis.

Lizdai turi būti parinktos vardinei IN = 16A srovei, jeigu brėžiniuose nenurodyta kitaip.

3.1.7. Apšvietimo jungikliai

Apšvietimo jungikliai turi būti įleidžiami, atitinkantys vardinius grandinių apkrovos parametrus. Paskirtis – elektrinio apšvietimo šviestuvų valdymui, įjungimui ir išjungimui. Klavišiniai jungikliai, perjungikliai turi būti vieno arba dviejų klavišų, klavišai įspaudžiami, laidai priveržiami, baltos spalvos.

Nominalioji srovė turi būti ne mažiau 16 A, įtampa 250 V kintamosios srovės. Keletas šalia esančių jungiklių turi sudaryti bendrą modulį, todėl turi turėti vieną rėmelį ir būti vienoje dėžutėje. Bendras rėmelis negali būti, jeigu šalia esantys jungikliai priklauso skirtingoms įtampos sistemoms. Turi būti panaudoti paslėptai arba atvirai instaliacijai naudojami jungikliai. Paviršinio montavimo tipo jungikliai turi būti pateikti komplekte su atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis ir tvirtinimo detalėmis.

Būvio daviklis 230V, lubinis, paviršinis, baltas. 8 m spindulys (naudojamas WC, vertvybių patalpoje).

3.1.8. Žymėjimas.

Prietaisų žymėjimas

Visa įranga turi būti aiškiai sužymėta. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba.

Paskirstymo skydų žymėjimas:

Paskirstymo skydai turi būti sužymėti:

- ant skydų durų turi būti etiketės, kuriose nurodytas skydo numeris, pagrindinis jungiklis, saugikliai ir valdymo įrenginiai;
- ant valdymo įrenginio turi būti aiškiai nurodytas to įrengimo, kurį jis valdo pavadinimas, kodas bei funkcija.

Kabelių žymėjimas

Magistraliniai kabeliai turi būti pažymėti, nurodant kabelio tipą, gyslų skaičių, skerspjūvio plotą, bei turi būti nurodyta, kas yra prijungta kitame kabelio gale. Visi pagrindiniai kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais keičiamais plastikiniais žymekliais, užspausiais abiejuose kabelio galuose.

Tuščių vamzdžių žymėjimas – jie turi būti sužymėti iš abiejų vamzdžio galų.

Žymekliai turi būti pritvirtinti taip, kad jie išliktų netgi tada, jei įrengimai yra keičiami. Tekstas ant žymeklių turi atliktas juodas dažais ant balto fono.

3.1.9. Montażas.

Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas.

Atlikus elektros montavimo darbus turi būti užtikrintas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas visiems vartotojams.

Paskirstymo dėžutės turi būti sumontuotos taip, kad jas galima būtų atidaryti, prieiti prie kabelių sujungimų, esant reikalui, pratraukti kabelius, neardant pertvarų.

Parinkus konkrečius įrenginius, turi būti patikrinti maitinančių kabelių skerspjūviai, automatinų išjungiklių nominalios srovės. Jie turi atitikti įrenginio gamintojų rekomendacijas ir užtikrinti įrenginio saugų darbą. Atlikus visą numatytą instaliaciją, turi būti pateiktas el. tinklo varžų matavimo protokolas.

3.1.10. Įžeminimas.

Visos metalinės konstrukcijos, el. prietaisai ir įrengimai, technologiniai vamzdiniai, ortakiai, galintys patekti po įtampa, pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžeminti, prijungiant prie PE šynos. Įžeminimui naudoti ne mažesnio kaip fazinio laidininko skerspjūvio viengyslius kabelius, su žalios ir geltona spalvos izoliacija.

Perėjimui tarp plieno ir vario naudoti specialias jungtis.

3.1.11. Šviestuvai ir lempos.

Apšvietimo planas pateikiamas kartu su standartu.

Šviestuvai WC patalpoje turi būti min.– IP44.

Patalpose, kur bus dirbama kompiuteriais, turi būti instaliuojami šviestuvai su neakinančia optika. Apšviestumas turi atitikti higienos normas HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

Minimalus atstumas tarp į pakabinamas lubas įleidžiamų šviestuvų ir perdangos konstrukcijos, įskaitant šilumos bei garso izoliacijos sluoksnį turi būti lygus 25 mm. Jeigu šviestuvai yra skirti įrengimui ant degių paviršių ir paženklinanti tai patvirtinančiu žymeniu, šis reikalavimas netaikytinas.

Šviestuvų tvirtinimui naudoti kartu su šviestuvais tiekiamus montažinius aksesuarus, užtikrinančius saugų ir patikimą atitinkamos masės šviestuvų įrengimą, bei leidžiančius prireikus juos nuimti ir vėl pakartotinai pritvirtinti.

Prijungimui skirtų laidininkų ilgio atsarga turi užtikrinti pakartoti nuo prijungimo galimybę.

Galimi šviestuvų variantai:

- LED pakabinamas šviestuvas – T5 1x80W GS, matinis difuzorius. Baltas korpusas. L – 1,0 m arba 1,5 m (naudojamas darbo vietų apšvietimui, vienai darbo vietai montuojamas vienas šviestuvas).

- šviestuvas montuojamas į segmentines lubas - neakinanti optika. 595x595mm, LED 36W, 3600lm, 3000K, 230V. Baltas rėmelis (naudojamas pagalbinėse patalpose bendram apšvietimui).

- šviestuvas montuojamas į segmentines lubas pagalbinėse patalpose - matinis stiklas. LED 36W, 3000K. 595 x 295mm. Baltas rėmelis (naudojamas pagalbinėse patalpose bendram apšvietimui).

- evakuaciniai šviestuvai su LED apšvietimu, su akumuliatoriumi, išėjimo simboliais. Jie turi šviesti visu paros metu.

Visos lempos turi būti ryškiai baltos spalvos arba artimos dienos šviesai. Šviestuvai gaminami pagal IEC 598 reikalavimus.

Išoriniam įėjimų apšvietimui naudojami hermetiniai, antivandaliniai LED šviestuvai:

- Spalvinė temperatūra: 4000K;
- Šviestuvų korpusas: aliuminis;
- Galingumas: 15W – 25W LED;
- Hermetiškumo klasė: IP65/ IP66;
- Šviestuvų tarnavimo laikas: ne mažiau 10 metų;
- Pagalbiniam įėjimui naudojami šviestuvai nuo judesio daviklio.

3.2. Elektroniniai ryšiai.

3.2.1. Reikalavimai:

Kompiuterinio tinklo lizdai įrengiami pagal akcinės bendrovės Lietuvos pašto pateiktą elektros ir kompiuterinio tinklo lizdų išdėstymo planą.

Pagrindinių projektavimo ir darbų vykdymo normų sąrašas:

- STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas;
- EIA/TIA-568 (tinklo struktūra);
- EIT/TIA-569 (reikalavimai instaliaciniams kanalams ir instaliacijai);
- EN 50173;
- Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EIIT);
- IEC (International Electrotechnical Commission Publications);
- LST 1516:1998;
- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (patvirtinti PAGD 2010 gruodžio 7d.) standartų reikalavimais.

Pašto patalpose projektuojama vieninga kompiuterinio ir telefoninio tinklo sistema. Vieninga kompiuterinio ir telefoninio tinklo sistema leidžia lanksčiau naudoti suinstaliuotą tinklą, t. y. sumontuotą lizdą RJ45 sukomutuoti kaip kompiuterinį, taip ir telefoninį ryšį.

Kompiuterizuota darbo vieta – tai bendrovės darbuotojo darbo vieta, aprūpinta kompiuterine technika, programine įranga, kompiuterinio ryšio priemonėmis, kurioje gaunama, apdorojama, spausdinama ir išsiunčiama elektroninio pavidalo informacija, atliekamos kitos Lietuvos pašto veiklai reikalingos funkcijos.

Kiekvienoje kompiuterizuotoje darbo vietoje įrengiamos rozetės su trimis FTP Cat 5e RJ45 ekranuotais lizdais (jeigu nenurodoma kitaip). Tinklinių spausdintuvų ar multifunkcinių aparatų statymo vietoje įrengiamos rozetės su dviem FTP Cat 5e RJ45 ekranuotais lizdais (jeigu nenurodoma kitaip). Rozečių lizdų tipai ir skaičius atskiruose instaliacijos taškuose bendrovės atsakingų asmenų nurodymu gali būti pakeisti priklausomai nuo konkrečių poreikių atskiruose instaliacijos taškuose.

Visi darbo vietų ryšio tinklo kabeliai vedami į vertybių patalpą ir į vieną komutacinę spintą.

Kabelių sistemai tvarkyti ryšių komutavimo mazge įrengiama 19“ pločio, 15U aukščio ir 800mm gylio rakinama komutacinė spinta su viena 19“ rėmų pora. Spintoje turi būti aktyvi ventiliacija su termodavikliu. Turi būti galimybė keisti 19“ rėmų gylį. Spintoje turi būti įžeminimo šyna ir laidų

komplektas visų spintos metalinių dalių įžeminimui. Įžeminimo laidai turi būti su žiediniais antgaliais ir prisukami patikimai priveržiamais varžtais. Komutavimo spinta žeminama elektros paskirstymo skydelyje. Priekinės durys turi būti stiklinės. Kabeliai įvedami į spintą per viršų ir apačią.

Kompiuterinės įrangos ir ryšių spintoje numatomas atitinkamos kategorijos komutavimo kabelių komplektas, kabeliai parenkami pagal reikiamus ilgius ir su reikiamais antgaliais:

Instaliacijos vietose – prie kiekvienos kompiuterinės rozetės 3 vnt. po 1,5 m. ilgio.

Komutacinėje spintoje – po 1 vnt. kiekvienam panaudotam komutavimo panelių lizdai (ilgis turi būti pakankamas pajungimui prie komutacinėje spintoje esančios įrangos).

Visi komutavimo kabeliai paliekami komutacinėje spintoje.

Projektuojama kompiuterinio - telefoninio tinklo pasyvinė dalis turi atitikti 6 kategorijos reikalavimus (ISO /IEC 11801) ir priešgaisrinius reikalavimus (IEC 1084-1). Sistema pilnai turi tenkinti Europos sąjungos standartą EN 50173. Visai kompiuterinio tinklo pasyviai daliai suteikiama ne mažiau 20 metų sisteminė garantija.

Dvigubos kompiuterinės-telefoninės rozetės projektuojamos montuoti ant patalpų pertvarų, baldų ir į grindis įgilintose dėžutėse patalpų viduryje šalia elektros rozečių.

Nuo komutacinės spintos KS iki kiekvienos rozetės lizdo klojami 6 kategorijos neekranuoti kompiuteriniai UTP 4x2x0,5 kabeliai. Kabeliai klojami horizontaliai virš pakabinamų lubų. Patalpose vertikalčiai ir horizontalčiai tarp sienų gipso kartono plokščių iki grindų ir grindų paruošiamajame sluoksnyje kabeliai klojami plastikiniuose instaliaciniuose vamzdeliuose d20.

Komutacinėje spintoje kabeliai iš darbo vietų iškrosumojami komutacinėje panelėje. Komutacinė panelė ir komutatoriaus sujungiami komutaciniais RJ45/RJ45 kabeliais. Telefoninio ryšio įvadui, komutacinėje spintoje numatomas 30 porų 19" pločio plintų laikiklis, kuris montuojamas komutacinėje spintoje.

Įvadinio signalo pajungimui nuo komutacinės spintos iki esamos optinio ryšio dėžutės tiesiamas kabelis UTP 4x2x0,5, kuris užbaigiamas RJ45 kištuku.

Vaizdo stebėjimo sistema:

Įranga	Reikalavimai
Įrašo masyvas, kietieji diskai	• Kamerų iki 5 MP palaikymas, • 8 nepriklausomos PoE išvestys, • galimybė montuoti 2 kietuosius diskus po 4GB, • HDMI ir VGA vaizdo išvestys, • 19" standartas komutacinėms spintoms, • įeinantis srautas 50Mbps, išeinantis srautas 80Mbps. • Kietasis diskas - talpa 4TB, paskirtis pritaikyta vaizdo stebėjimo sistemoms.
IP vaizdo kamera	• 4 megapikselių vidaus vaizdo stebėjimo kamera, • 105° matymo kampas, • maksimali vaizdo rezoliucija - 2688 × 1520, 2,8mm fiksuotas lęšis, • PoE maitinimas, • iki 10 metrų naktinis IR pašvietimas, • integruotas judesio daviklis, • integruotas mikrofonas garso įrašymui, • dvipusio garso palaikymas.
Vaizdo kamerų įrengimo vietos	• Vaizdo kamerų stebėjimo zona turi apimti: ○ Įėjimus į pašto patalpas; ○ Prekybinę įrangą, klientų aptarnavimo salę; ○ Pašto viršininko zoną; ○ Visus seifus; ○ Visus išėjimus iš klientų salės.

3.2.2. Žymėjimai.

• Visi kabelinės sistemos elementai turi būti sužymėti, kabelinė sistema dokumentuojama. Rozečių žymėjimas instaliacijos taškuose ir komutavimo panelėse turi sutapti. Rozetės turi būti žymimos:

- Kompiuterinės rozetės – K1, K2, ...
- Telefono rozetės – T1, T2, ...
- Banko kortelių skaitytuvų rozetės – B1, B2, ...
- „Perlo“ terminalų rozetės – P1, P2, ...
- Saugos kamerų rozetės – S1, S2, ...
- Rozetės televizoriams – T1, T2, ...
- Rozetės NAS įrenginiams – N1, N2, ...
- Rozetės nepertraukiamo maitinimo šaltiniams – U1, U2, ...
- Rozetės eilių valdymo įrangai – E1, E2, ...

3.2.3. Reikalavimai komutacinei spintai bei įrangai.

Vietinio kompiuterinio tinklo (VKT) struktūra projektuojama pagal struktūrizuotų kabelinių sistemų standarto EN 50173 reikalavimus. Visi darbo vietų ryšio tinklo kabeliai vedami į vieną komutavimo mazgą ir vieną komutavimo spintą. Instaliacijai naudojami kabeliai tarp VKT instaliavimo taškų ir komutavimo jungiami prie RJ45 tipo lizdų. Kabelis turi atitikti 5E arba aukštesnės kategorijos reikalavimus. Kompiuterinės įrangos ir ryšių spintoje numatomas atitinkamos kategorijos komutavimo kabelių komplektas, kabeliai parenkami pagal reikiamus ilgį ir su reikiamais antgaliais:

– 19", 15U aukščio, 800mm gylis, pakabinama ant sienos. Stiklinės, rakinamos raktu durys. Nuimamos, rakinamos raktu šoninės bei galinė sienelės. Sumontuotas dugnas. Galimybė įvesti kabeliu per galinę sienelę tiek apačioje, tiek viršuje.

– 24 portų, 19" colių, 6 kategorijos neekranuotos kompiuterinės komutacinės panelės. Komutacinėje spintoje 5E kategorijos kabelių prijungimui prie galinio įrenginio naudojamos ekranuotos komutavimo panelės su RJ45 lizdais. Optinių kabelių prijungimui prie galinio įrenginio naudojamos komutavimo panelės su LC tipo lizdais.

– 24 portų, 19" colių, komutatorius: Dell Networking X1052P arba analogiškas, bet ne prastesnių kokybinių parametrų - Switch - L2+ - Managed - 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ - rack-mountable - PoE+ (360 W). Įranga turi būti skirta montavimui į 19" serverių spintą, pateikiama su montavimo detalėmis, elektros maitinimas turi būti ~230V 50Hz. Siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo teikiamas nemokamas programinės aparatinės įrangos atnaujinimas (į naujas versijas) garantinio laikotarpio metu.

– Komutavimo kabelių tvarkymui numatomas pakankamas kabelių tvarkymo panelių kiekis. Kabelių tvarkymo panelės korpusas turi būti metalinis.

– Kabelių tvarkymo panelės montuojamos 19" rėme, jų aukštis – 1U. Kabelių tvarkymo panelės korpusas turi būti metalinis, panelė su metaliniais, nemažiau, kaip 40x70 mm dydžio žiedais.

– Montažinis rėmelis 19", 10 plintų laikiklis, 2U PROFIL.

– Atjungiamasis telefoninis plintas 2/10 serijos, 10 porų, 3 kategorijos, atjungiamasis kontaktas, tvirtinimas ant PROFIL strypų.

– 19", 8x220V maitinimo panelė, 6 maitinimo lizdai. Apsauga nuo viršįtampių. Elektros rozečių blokai turi būti be jungiklio. Elektros rozečių bloko kabelis turi būti su IES-320 C14 tipo antgaliu, skirtu jungimui prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS).

– Keturių ventiliatorių komplektas su termostatu skirtas montuoti 19" komutacinėje spintoje.

– 19" 1U stacionari lentyna skirta aktyviai įrangai talpinti. Komutacinėje spintoje turi būti 19" lentyna, skirta ryšių įrangai, kurių konstrukcija neskirta montavimui 19" rėme (modemui, maršrutizatoriui). Lentyna turi išlaikyti ne mažesnę nei 10 kg svorį.

– Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) Eaton 5P 1150iR arba analogiškas, bet ne prastesnių kokybinių parametrų - UPS (rack-mountable) – AC 160-290 V – 770 Watt – 1150 VA – RS-232, USB – output connectors: 6 – 1U; Eaton Network Card-MS arba analogiškas, bet ne prastesnių kokybinių parametrų - Remote management adapter – 10Mb LAN, 100Mb LAN, RS-232 - XL3U; 5PX 1000, 1500, 2200, 3000, 3000 3U Rack / Tower LCD. Siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų trukmės gamintojo garantija elektronikai ir ne trumpiau 2 metų akumuliatoriams.

Jungiamasis neekranuotas 6 kategorijos kabelis RJ45/RJ45 3,0 m ilgio su RJ45 tipo ISO/IEC11801 ClassE kištukais abiejuose galuose su PVC apvalkalo izoliacija. Jungiamasis neekranuotas 5e kategorijos kabelis LSA PLUS/RJ45 3,0 m , viename gale turintis LSA PLUS sistemai tinkanti kištuką, o kitame-RJ45 su PVC apvalkalo izoliacija.

Rozetės: 2xRJ45 su dviem arba vienu 6 kategorijos ISO/IEC11801 ClassE neekranuotais lizdais skirtos potinkiniam montavimui, apdailos rėmelis, montažinė dėžutė. Rozečių apdailos dizainas pritaikytas elektros rozečių dizainui. Rozetės montuojamos viename bloke su kompiuterinėmis elektros rozetėmis.

Kompiuteriniai ir telefoniniai tinklai tiesiami 6 kategorijos UTP 4x2x0,5 kompiuteriniais vytytos poros variniais kabeliais su PVC izoliacija, ir tinkamais kloti po tinku, pakabinamose lubose. Kabeliai skirti darbui vidaus sąlygomis, privalo būti sertifikuoti Lietuvos gaisrinių tyrimų centro ir atitikti Europos Sąjungos standartus.

Tinklo įranga turi būti apsaugota nuo impulsinių elektros trikdžių, atsirandančių dėl galingų elektros šaltinių bei išorinio elektromagnetinio spinduliavimo veikimo. Būtina apsaugoti telefoninio ryšio linijas nuo elektros išlydžių, perkūnijos ir elektros linijų avarijų.

Prietaisų, aparatūros montavimas, laidų išvedžiojimas ir įrangos įžeminimas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EIT ir prietaisų techninės dokumentacijos nurodymais. Instaliacija turi atitikti aplinkos sąlygas, statinio paskirtį, jo konstrukciją ir architektūrinius ypatumus bei aukščiau paminėtus standartus ir reikalavimus.

Instaliacijos rūšis ir kabelių bei laidų klojimo būdai turi būti nustatomi laikantis saugos taisyklių reikalavimų. Kabelius ir laidus, instaliacijos įrengimo būdą reikia parinkti pagal aplinkos sąlygas. Instaliacija turi atitikti visas aplinkai būdingas sąlygas.

Vietose, kur galimi mechaniniai pažeidimai, kabeliai ir laidai turi būti klojami vamzdžiuose, loviuose, arba instaliuojami paslėptai. Klojant kabelius ir laidus vamzdžiuose, uždaruose loviuose, lanksčiose metalinėse rankovėse ir uždaruose kanaluose, turi būti numatyta kabelių ir laidų pakeitimo galimybė.

Kabelių ir laidų perėjas per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, kad juos būtų galima lengvai pakeisti. Dėl to perėjos turi būti įrengtos vamzdyje, lovyje ir pan.


Kabeliai instaliuojami taip, kad nebūtų susipynę, tvarkingai surišti.

Atlikus instaliacijos darbus pateikiami:

- „Kaip instaliuota“ brėžiniai elektroninėje laikmenoje PDF formatu.
- Kompiuterinio tinklo testavimo rezultatai

Instaliuotai kabelinei sistemai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 10 metų garantija – medžiagoms ir montavimo darbams (29 pav.).



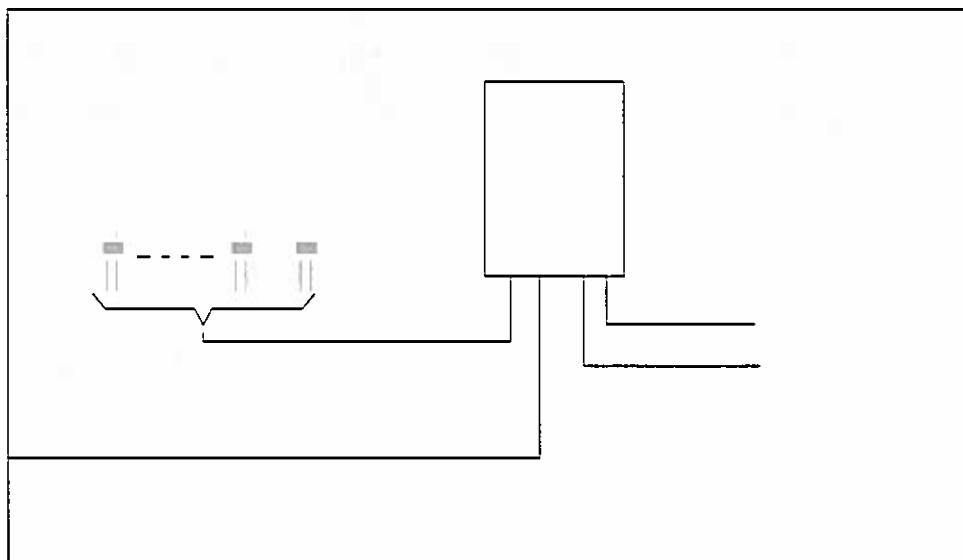

29 av. Kabelinės sistemos struktūra projektuojama vadovaujantis sekančia schema (pavyzdys)

3.3. Vandentiekis, nuotekos.

3.3.1. Šaltas ir karštas vandentiekis:

1.1.1.1. Bendri reikalavimai:

Įvadas į pastatą iš polietileninių PVC, PN 10. Vadovaujantis priešgaisriniais reikalavimais polietileniniui vamzdžiui kirtus lauko sieną, jis keičiamas į plieninį. Visas vandens apskaitos mazgas montuojamas iš plieninių vamzdžių ir plieninės armatūros. Tolimesnis vandens tiekimas į buitinio vandentiekio sistemą gali būti montuojamas iš plieninių arba polietileninių (polipropileninių) vamzdžių, o į priešgaisrinio vandentiekio sistemą, per elektrinę sklendę, iš plieninių vamzdžių.

Šalto ir karšto vandentiekio tinklus montuoti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ ir saugaus darbo norminiais dokumentais. Vandentiekio vamzdynų galutinis taškas baigiamas montuojant rutulinius ventilius „vidus-vidus“, nuo kurio montuotojai pasijungia įrangą variniais vamzdeliais. PVC nuotekų vamzdžiai gali būti WAVIN, PipeLife, Ostendorf, Magnaplast arba panašūs, bet ne blogesnių kokybinių parametrų. Uždaromoji armatūra vandentiekiui gali būti Schell, Herz, Luxor, santechniniai prietaisai Cersanit, IDO, Gustavsberg, Wenko, vandens maišytuvai ir kranai ORAS, Hansgrohe, Grohe arba panašūs, bet ne blogesnių kokybinių parametrų.

Virtuviniai stalai su kriauklėmis pajungiami iš apačios. Visose bendro naudojimosi patalpose (tualetai, rūbinės, nuomos patalpos) numatoma standartinė keraminė santechninė įranga, kurią montuoja darbus vykdančias rangovas.

1.1.1.2. Reikalavimai plastmasiniams daugiasluoksniams vamzdžiams.

Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti visus reikalavimus, keliamus geriamojo ir karšto vandens sistemoms. Rangovas privalo pateikti sertifikatus, kad vamzdžių sistema yra pritaikyta visoms geriamojo vandens kategorijoms bei fiziologiškai nekenksminga maisto produktams.

Daugiasluoksniai vamzdžiai turi turėti šias technines charakteristikas:

- Maksimali darbo temperatūra 95°C.
- Maksimali trumpalaikė temperatūra 110°C.
- Maksimalus ilgalaikis darbo slėgis — 10 bar.
- Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas — 0,025 mm/m K.
- Linijinis šilumos laidumo koeficientas - 0,43 W/m K.
- Vamzdžio šiurkštumas — 0,007 mm.

Vandentiekio instaliacijoms galimas ir kitokių tipų vamzdynų naudojimas, su sąlyga, kad jie atitinka visus aukščiau paminėtus techninius bei kokybės reikalavimus, yra pritaikyti naudoti geriamojo ir karšto vandens sistemoms ir sertifikuoti Lietuvoje.

Vamzdynų sistemos ir gaminiai turi atitikti šiuos normatyvinius dokumentus:

Vamzdžiai turi turėti LR visuomenės sveikatos centro sprendimą, kad vamzdynai ir jų fasoninės dalys leidžiamos naudoti geriamam vandeniui ūkio buities reikmėms.

1.1.1.3. Armatūra.

Atjungimo armatūra turi būti sertifikuota.

Atjungimo armatūra turi būti pritaikyta vandens temperatūrai ne žemesnei 95°C.

Atjungimo armatūros išlaikomas slėgis ne mažesnis, kaip 10,0 barų.

Movinė armatūra montuojama gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose ir prijungiama srieginiais sujungimais.

Armatūros montavimo vietose sienose įrengiami metaliniai karštu būdu padengti liukai su hermetiškai uždaromomis drelėmis.

1.1.1.4. Vamzdynų montavimas.

Montuojant vamzdžių perėjimus per sienas, statybines pertvaras, perdangos plokštes reikalinga panaudoti apsaugines įvoves pvz., galima naudoti didesnio skersmens vamzdį, tarpus užpildyti nedegia sandarinimo medžiaga. Šios įvovės turi būti ilgesnės už statybinės konstrukcijos storį. Perėjimų vietose neturi būti vamzdžių sujungimų bei tvirtinimų. Angos ir vagos nustatyto atsparumo ugniai atitvarinėse konstrukcijose, pro kurias eina vamzdynai, turi būti užtaisomos nedegiomis medžiagomis taip, kad nesumažintų pačiai konstrukcijai keliamų ugniaatsparumo reikalavimų.

Visiems vamzdynams naudojami šilumos izoliacijos kevalai.

Visi vamzdynai tiesiami taip, kad galėtų kisti jų ilgis. Vamzdžio pailgėjimą ar susitraukimą reikia kompensuoti tempimo lanko, kompensatoriaus pagalba ar keičiant vamzdynų kryptį. Horizontalūs vamzdynai tiesiami 0,002-0,005 nuolydžiu į stovų arba vandens išleistuvų pusę. Vandeniui išleisti žemiausiose tinklų vietose montuojami trišakiai su kamščiais arba ventiliai.

Visi vamzdynai montuojami paslėptai, statybinėse konstrukcijose, bei virš pakabinamų lubų (išskyrus rūšio, technines ir panašias patalpas).

Sistemos vamzdynus reikia tvirtinti prie statybinių konstrukcijų atramų, kronšteinų, pakabų ir paslankių bei pastovių laikiklių pagalba, įvertinant galimą vamzdynų pailgėjimą ar susitraukimą.

3.3.2. Nuotekų šalinimo sistema.

1.1.1.5. Reikalavimai nuotekų šalinimo vamzdžiams.

Nuotekų vamzdynai montuojami iš plastikinių beslėgių vamzdžių (PVC).

Būtina numatyti šilumos izoliaciją lietaus nuotekų stovams (mažiausiai 2 (du) metrai nuo stogo konstrukcijos apatinio taško).

Į buitinių nuotekų sistemą suvedama visos buitinės kriauklės, tualetai, trapai.

Vandens mazge, šiluminiame mazge, vent. kameroje, reikia numatyti trapus vandens surinkimui.

Nuotakinėje sistemoje negali būti 90 laipsnių kampinių jungčių.

Vidaus nuotekų vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš neplastifikuoto polichlorido.

PVC vamzdžiai turi turėti sekančias technines charakteristikas;

- Plastmasė – PVC, skersmuo nuo 32 iki 160mm;
- Guma – SBR (stiril-butanas);
- Tankis – 1410kg/m³,
- Elastingumo modulis – 3000MPa;
- Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas – 0,06mm/m0C;
- Šiluminio laidumo koeficientas 0,15W/m K;

1.1.1.6. Vamzdynų ir fasoninių dalių montavimas.

Nuotekų tinklo vamzdynai montuojami paslėptai statybinėse konstrukcijose, virš pakabinamų lubų arba aptaisomi gipso-kartonu ant metalinio karkaso (išskyrus rūšio, technines ir panašias patalpas).

Revizijų pastatymo vietose sienose įrengiami metaliniai liukai su lygiais paviršiais ir hermetiškai uždaromomis durelėmis.

3.3.3. Sanitariniai prietaisai.

Sanitariniai prietaisai privalo turėti bendrus bruožus: jų vidaus ir išorės paviršius privalo turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise nei tvirtinimo detalėse. Visi sanitariniai prietaisai, nuotekų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius.

Praustuvai ir klozetai su bakeliais pagaminti iš fajanso ar porceliano, glazūruoti.

Klozetai su vandens užtvara viduje. Vanduo į klozetų bakelius tiekiamas be garso ir nuplovimui naudojama ne daugiau kaip 6 l vandens. Klozetų puodų, skirtų žmonėms su fiziniais trūkumais, bakelių rankenėlės turi būti svirtinio tipo.

Klozeto puodai komplektuojami su sėdynėmis ir dangčiais iš plastmasės.

Praustuvai komplektuojami su sifonais, kurie gali būti plastmasiniai arba chromuoti ir atitikti vandens ėmimo maišytuvų ir čiaupų padengimo spalvą.

Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.

Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją ir deramą (pagal DIN 4109) garso gesinimo laipsnį. Maišytuvai pagal DIN 5518. Praustuvų skirtų žmonėms su fiziniais trūkumais čiaupų rankenėlės turi būti svirtinio tipo.

Praustuvai įrengiami 0,80m aukštyje virš grindų (kriauklės viršus), unitazai ir bidė montuojami taip, kad jų viršus būtų 0,40m virš grindų.

Nuotekynės nuvedimai nuo praustuvų įrengiami sienoje. Vandens privedimas prie unitazo bakelio turi būti montuojamas naudojant metalinį vamzdelį.

Žmonių su negalia sanmazguose prie praustuvo ir unitazo įrengiamos specialios rankenos naudotis neįgaliesiems. Prie unitazo įrengiama viena stacionari ir viena atlenkiama rankena.

3.3.4. Tūrinis karšto vandens šildytuvas

Šildytuvas skirtas vandens pašildymui buitiniams reikmėms. Jis montuojamas sanmazge, po praustuve. Pagrindiniai techniniai duomenys: elektros įtampos pajungimas 220 V; maksimalus leistinas slėgis 0,6 MPa; termosaugiklio suveikimo temperatūra 99°C - 100°C.

Šildytuvo korpusas pagamintas iš plieno, iš vidaus eliuminuotas, iš išorės patikimai izoliuotas poliuretano sluoksniu. Prietaisas turi termostatą, atbulinį - apsauginį vožtuvą, apsaugą nuo perkaitimo ir užšalimo, dirba nuo vandentiekio slėgio, turi antikorozinę anodinę apsaugą.

Talpa: 10 litrų

Galingumas: iki 1,2kW.

3.4. Šildymas, vėdinimas, kondicionavimas.

3.4.1. Vėdinimas.

Vėdinimas, išskyrus sanmazgus ir patalpas, kuriose jau yra įrengtos rekuperacinės sistemos, numatomas natūralus. Iš sanmazgų oras šalinamas buitinais ventiliatoriais, su laiko rėle. Visuose san. mazguose būtina numatyti 2 cm plyšį durų apačioje – oro pritekėjimui arba oro pratekėjimo groteles.

3.4.2. Šildymas.

Esant centralizuotam šildymui, šildymo sistema paliekama esama, jei nenurodoma kitaip (tais atvejais jeigu šildymo prietaisai arba vamzdynai fiziškai nusidėvėję, nesandarūs jie keičiami naujais, analogiškais).

Jeigu patalpos nešildomos centralizuotai, šildymui naudojami ant sienos pakabinami elektriniai konvekciniai šildytuvai kartu su kondicionieriais turinčiais šildymo funkciją.

Reikalavimai elektriniams konvekciniams šildytuvams:

- iki 2000 W;
- termostato tikslumas ne daugiau kaip 1°C;
- atsparūs korozijai;
- garantija 2 m.

3.4.3. Kondicionavimas

Patalpų oro vėsinimui ir šildymui naudojami inverteriniai kondicionieriai iki 2,5kW galingumo. Šildytuvų montavimo vietos nurodomos pateikiamame technologiniame plane.

Kondicionavimo įrenginio vidinės dalys montuojamos į pakabinamas lubas pagalbinėse patalpose ir klientų zonoje, montavimo vietos nurodomos pateikiamame lubų plane. Vidiniai blokai komplektuojami su nuotolinio valdymo pulteliais.

Išorinis blokas montuojamas ant pastato išorinės sienos su pastato savininku suderintoje vietoje.

Atlikus darbus įrenginys turi būti išbandytas, Rangovas Užsakovui turi pateikti bandymo dokumentaciją.

Įrenginio garantija ne mažesnė kaip 2 metams.

Minimalūs reikalavimai kondicionavimo įrangai:

- | | |
|---|----------------------------|
| • energijos vartojimo efektyvumo klasė šildymui | A++; |
| • šildymo galios minimalus poreikis | 3,5 kW; |
| • energijos vartojimo efektyvumo klasė šildymui | A+; |
| • šildymo galios minimalus poreikis | 3 kW; |
| • įrenginio dalies patalpoje triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 42 dB; |
| • įrenginio dalies pastato išorėje triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 55 dB; |
| • įrenginio darbinė temperatūra šildymo režime | + 45°C ar daugiau; |
| • įrenginio darbinė temperatūra šildymo režime | - 22 °C ar žemiau (minus); |
| • įrenginio garantija | ≥ 2 metai. |

Patalpų mikroklimatas turi tenkinti Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ reikalavimams.

3.4.4. Oro užuolaida.

Jeigu įėjimas į pašto patalpas iš lauko numatytas be tambūro, tiesiogiai į klientų aptarnavimo salę arba pagalbinės patalpas, virš įėjimo montuojama elektrinė oro užuolaida.

Reikalavimai oro užuolaidai:

- režimas su šildymu/be šildymo;
- montuojama horizontaliai
- trifazis pajungimas (galimybė pajungti ir nuo vienfazio įvado);
- belaidis nuotolinio valdymo pultas (iki 8 m);
- reguliuojama šildymo galia 2/4/6 kW;
- reguliuojamas oro srautas;
- garantija 2 metai.

ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

2018-11-02 Nr. 2793889

Kam: AB „LIETUVOS PAŠTAS“
J. JASINSKIO G. 16, VILNIUS, LIETUVA

UAB "VILUNGES STATYBA", įmonės kodas 304584210, KAPSIŲ G. 96B, KAUNAS, LIETUVA (toliau "Draudėjas") pagal 2018 m. spalio mėn. 25 d. nekilnojamojo turto remonto darbų pirkimo sutartį Nr. 2018-P00063 "Nekilnojamojo turto objektų statybos darbai Pietų regione" (toliau "Sutartis") įsipareigojo AB "LIETUVOS PAŠTAS" (toliau "Užsakovas") atlikti sutartyje nurodytas paslaugas.

Pagal Sutartį Draudėjas privalo tinkamam Sutartyje nustatytų prievolių įvykdymui užtikrinti, susijusių su minėtų paslaugų atlikimu laiku ir tinkamos kokybės, pateikti draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą sumai, lygiai 11 000,00 EUR (Vienuolika tūkstančių EUR 00 ct). Laiduojama suma mažėja pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtų sumų dydžiu.

Atsižvelgiant į šį reikalavimą pareikiame, kad Užsakovui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, suteikiame Užsakovui Draudėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo laidavimo draudimo raštą. ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") atsakomybė pagal šį laidavimo draudimo raštą yra apribota bendra 11 000,00 EUR (Vienuolika tūkstančių EUR 00 ct) draudimo suma. Jeigu Draudėjas neįvykdys prievolės, Draudikas, neviršydamas aukščiau nurodytos sumos, atsakys už tiesioginių nuostolių atlyginimą kaip ir Draudėjas. Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų mokėjimą bei Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų arba juos įvykdžius netinkamai, Draudikas įsipareigoja gavęs Užsakovo vadovo raštišką reikalavimą registruotu laišku sumokėti jame nurodytas Draudėjo pagal Sutartį priklausančias mokėti sumas, neviršijant bendros 11 000,00 EUR (Vienuolika tūkstančių EUR 00 ct) draudimo sumos. Reikalavime išmokėti pagal Sutartį priklausančias sumas turi būti nurodyta, kurias Sutarties sąlygas Draudėjas pažeidė ir kuriomis Sutarties nuostatomis vadovaujantis turi būti išmokėtos Užsakovui pagal Sutartį priklausančios pagrįstos draudimo išmokos. Prie reikalavimo išmokėti aukščiau nurodytas sumas turi būti pridedami Užsakovo reikalavimą pagrindžiantys dokumentai.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Draudėjo turta.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės tokos Draudiko įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymui ar apimčiai ir neatleis Draudiko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šį laidavimo draudimo raštą įvykdymo. Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ar tai jų apimčiai, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.) (toliau "Taisyklės Nr. 036") ir 2018 m. lapkričio mėn. 02 d. Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2793889 pagrindu.
(Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

Šis laidavimo draudimo raštas yra neatskiriama Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2793889 sudėtinė dalis.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo Draudėjo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki pilno Draudėjo pareigų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. lapkričio mėn. 01 d. imtinai. Reikalavimai pagal šį laidavimo draudimo raštą turi būti Draudikui pateikti iki nurodytos datos (2021-11-01) imtinai. Po to šis laidavimo draudimo raštas netenka galios.





Sutartinių prievolių laidavimo draudimas

Draudimo liudijimas: GJELT Nr. 2793889

Draudimo sutartis galioja: nuo 2018-11-02 iki 2021-11-01 24:00

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas	Draudimo grupė: Laidavimo draudimas
Draudimo objektas: Užsakovo turiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu	POLISO ID Nr.: 2009824881

DRAUDIMO SUTARTIES ŠALYS

Draudėjas: UAB „VILUNGES STATYBA“, įm. kodas 304584210

Adresas: KAPSIU G. 96B, KAUNAS, LIETUVA. Kontaktinis telefonas: +37065097783

Naudos gavėjas: AB „LIETUVOS PAŠTAS“, J. JASINSKIO G. 16, VILNIUS, LIETUVA

Draudikas: ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius. Įmonės kodas 110057869

Draudimo sutartį sudaro:

Šis draudimo liudijimas GJELT Nr. 2793889;

Laidavimo draudimo raštas Nr. 2793889;

Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugpjūčio 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2016 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.), (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Draudimo objektas: Atlikimo laidavimo draudimas

Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartine civiline atsakomybe dėl Draudėjo prisiimtų įsipareigojimų, už kuriuos Draudikas laiduoja draudimo sutartimi, neįvykdymo ar netinkamo vykdymo

Draudimo objekto pavadinimas: 2018 m. spalio mėn. 25 d. nekilnojamojo turto remonto darbų pirkimo sutartis Nr. 2018-P00063 "Nekilnojamojo turto objektų statybos darbai Pietų regione"

Bendra draudimo suma EUR 11 000,00

Draudimo sutarties individualios sąlygos:

* Remiantis 2018-01-02 d. Susitarimu Nr. 2 prie laidavimo draudimo sutarties, Laiduotojas UAB „Vilunge“, įm.k. 134522910, atsako solidariai pagal prievolės, susijusias su draudimo išmokos grąžinimu Draudikui.

BENDRA INFORMACIJA

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo:

- suprantu, jog Draudikas privalo tvarkyti mano asmens duomenis tam, kad galėtų su manimi sudaryti ir vykdyti draudimo sutartį;
- esu informuotas, kad mano asmens duomenis, susijusius su sveikata, kiek jų reikia draudimo sutarčiai sudaryti ar vykdyti, Draudikas tvarkys mano sutikimo pagrindu, arba mano kreipimosi dėl įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, pagrindu;
- suprantu, kad draudikas turi teisę teikti ir / ar perduoti tvarkyti mano asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, bankams, VĮ „Regitra“, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, UAB „Creditinfo Lietuva“, valstybės registrams, sveikatos priežiūros įstaigoms, „Gjensidige Forsikring ASA“ įmonių grupei, draudimo bendrovėms, draudimo tarpininkams, draudimo žalių administravimo partneriams, informacinių technologijų paslaugas teikiančioms įmonėms, archyvacijos paslaugas teikiančioms įmonėms, kokybės tyrimų apklausos paslaugas teikiančioms įmonėms, turto vertinimo ir apžiūros įmonėms, skambučių centro paslaugas teikiančioms įmonėms ir kitiems tretiesiems asmenims pagal poreikį, reikalingą draudikui vykdančiam draudimo veiklą. Draudikas taip pat turi teisę teikti ir / ar perduoti tvarkyti mano asmens duomenis asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ir / ar jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkymu, kad pastarieji prireikus galėtų organizuoti skolų administravimą ir skolų išieškojimą iš draudėjo;
- suprantu, kad turiu teisę susipažinti su draudiko tvarkomais mano asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neišsamius, neteisingus, netikslius asmens duomenis, taip pat reikalauti ištrinti asmens duomenis, apriboti ar nesutikti su jų tvarkymu, taip pat prašyti perkelti asmens duomenis, pateikti skundą priežiūros institucijai;
- esu informuotas, kad išsamiau su asmens duomenų tvarkymo principais galiu susipažinti Draudiko tinklalapyje: <https://www.gjensidige.lt/privatumo-politika-ir-slaptumai>. Draudiko duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: dpo@gjensidige.lt.

Tarpininkas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi ADB „Gjensidige“ akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo. ADB „Gjensidige“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi tarpininko akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo.

Dėl šio draudimo produkto rekomendacija Jums nebuvo teikiama.

Tarpininko komisinis atlygis (procentinė išraiška nuo draudimo įmokos sumos) įskaičiuotas į draudimo įmoką.

Draudimo paslaugos nėra apmokestinamos PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnį.

ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

2018-11-02 Nr. 2793886

Kam: AB „LIETUVOS PAŠTAS“
J. JASINSKIO G. 16, VILNIUS, LIETUVA

UAB „VILUNGĖS STATYBA“, įmonės kodas 304584210, KAPŠŲ G. 96B, KAUNAS, LIETUVA (toliau „Draudėjas“) pagal 2018 m. spalio mėn. 25 d. nekilnojamojo turto remonto darbų pirkimo sutartį Nr. 2018-P00063 „Nekilnojamojo turto objektų statybos darbai. Rytų regione“ (toliau „Sutartis“) įsipareigojo AB „LIETUVOS PAŠTAS“ (toliau „Užsakovas“) atlikti sutartyje nurodytas paslaugas.

Pagal Sutartį Draudėjas privalo tinkamam Sutartyje nustatytų prievolių įvykdymui užtikrinti, susijusių su minėtų paslaugų atlikimu laiku ir tinkamos kokybės, pateikti draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą sumai, lygiai 21 000,00 EUR (Dvidešimt vienas tūkstantis EUR 00 ct). Laiduojama suma mažėja pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtų sumų dydžiu.

Atsižvelgiant į šį reikalavimą pareiškiami, kad Užsakovui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, suteikiame Užsakovui Draudėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo laidavimo draudimo raštą. ADB „GJENSIDIGE“, ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau „Draudikas“) atsakomybė pagal šį laidavimo draudimo raštą yra apribota bendra 21 000,00 EUR (Dvidešimt vienas tūkstantis EUR 00 ct) draudimo suma. Jeigu Draudėjas neįvykdys prievolės, Draudikas, neviršydamas aukščiau nurodytos sumos, atsakys už tiesioginių nuostolių atlyginimą kaip ir Draudėjas. Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų mokėjimą bei Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų arba juos įvykdžius netinkamai, Draudikas įsipareigoja gavęs Užsakovo vadovo raštišką reikalavimą registruotu laišku sumokėti jame nurodytas Draudėjo pagal Sutartį priklausančias mokėti sumas, neviršijant bendros 21 000,00 EUR (Dvidešimt vienas tūkstantis EUR 00 ct) draudimo sumos. Reikalavime išmokėti pagal Sutartį priklausančias sumas turi būti nurodyta, kurias Sutarties sąlygas Draudėjas pažeidė ir kuriomis Sutarties nuostatomis vadovaujantis turi būti išmokėtos Užsakovui pagal Sutartį priklausančios pagrįstos draudimo išmokos. Prie reikalavimo išmokėti aukščiau nurodytas sumas turi būti pridedami Užsakovo reikalavimą pagrindžiantys dokumentai.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Draudėjo turtą.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Draudiko įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymui ar apimčiai ir neatleis Draudiko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šį laidavimo draudimo raštą įvykdymo. Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ar tai jų apimčiai, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.) (toliau „Taisyklės Nr. 036“) ir 2018 m. lapkričio mėn. 02 d. Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2793886 pagrindu.

(Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

Šis laidavimo draudimo raštas yra neatskiriama Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2793886 sudėtinė dalis.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo Draudėjo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki pilno Draudėjo pareigų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. lapkričio mėn. 01 d. imtinai. Reikalavimai pagal šį laidavimo draudimo raštą turi būti Draudikui pateikti iki nurodytos datos (2021-11-01) imtinai. Po to šis laidavimo draudimo raštas netenka galios.





Sutartinių prievolių laidavimo draudimas

Draudimo liudijimas: GJELT Nr. 2793886

Draudimo sutartis galioja: nuo 2018-11-02 iki 2021-11-01 24 00

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas	Draudimo grupė: Laidavimo draudimas
Draudimo objektas: Ušaakovo turiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu vykdymu	POLISO ID Nr. 2009624573

DRAUDIMO SUTARTIES ŠALYS

Draudėjas: UAB „VILUNGES STATYBA“, įm. kodas 304584210

Adresas: KAPSU G. 96B, KAUNAS, LIETUVA. Kontaktinis telefonas: +37065097783

Naudos gavėjas: AB „LIETUVOS PAŠTAS“, J. JASINSKIO G. 16, VILNIUS, LIETUVA

Draudikas: ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius. Įmonės kodas 110057869

Draudimo sutartį sudaro:

Šis draudimo liudijimas GJELT Nr. 2793886.

Laidavimo draudimo raštas Nr. 2793886.

Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.).

(Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Draudimo objektas: Atikimo laidavimo draudimas

Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartine civiline atsakomybe dėl Draudėjo prisiimtų (sipareigojimų, už kuriuos Draudikas laiduoja draudimo sutartimi, neįvykdymo ar netinkamo vykdymo

Draudimo objekto pavadinimas: 2018 m. spalio mėn. 25 d. nekilnojamojo turto remonto darbų pirkimo sutartis Nr. 2018-P00063 "Nekilnojamojo turto objektų statybos darbai. Rytų regione"

Bendra draudimo suma EUR

21 000,00

Draudimo sutarties individualios sąlygos:

* Remiantis 2018-01-02 d. Susitarimu Nr.2 prie laidavimo draudimo sutarties, Laiduotojas UAB "Vilunge", įm.k. 134522910, atsako solidariai pagal prievolės, susijusias su draudimo išmokos grąžinimu Draudikui.

BENDRA INFORMACIJA

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo:

- suprantu, jog Draudikas privalo tvarkyti mano asmens duomenis tam, kad galėtų su manimi sudaryti ir vykdyti draudimo sutartis;
- esu informuotas, kad mano asmens duomenis, susijusius su sveikata, kiek jų reikia draudimo sutarčiai sudaryti ar vykdyti, Draudikas tvarkys mano sutikimo pagrindu, arba mano kreipimosi dėl įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, pagrindu;
- suprantu, kad draudikas turi teisę teikti ir / ar perduoti tvarkyti mano asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, bankams, VĮ „Regitra“, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, UAB „Creditinfo Lietuva“, valstybės registrams, sveikatos priežiūros įstaigoms, „Gjensidige Forsikring ASA“ įmonių grupei, draudimo bendrovėms, draudimo tarpininkams, draudimo žalių administravimo partneriams, informacinių technologijų paslaugas teikiančioms įmonėms, archyavavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kokybės tyrimų apklausos paslaugas teikiančioms įmonėms, turto vertinimo ir apžiūros įmonėms, skambučių centro paslaugas teikiančioms įmonėms ir kitiems tretiesiems asmenims pagal poreikį, reikalingą draudikui vykdančiam draudimo veiklą. Draudikas taip pat turi teisę teikti ir / ar perduoti tvarkyti mano asmens duomenis asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ir / ar jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkymu, kad pastarieji prirėkus galėtų organizuoti skolų administravimą ir skolų išieškojimą iš draudėjo;
- suprantu, kad turiu teisę susipažinti su draudiko tvarkomais mano asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neišsamius, netikslingus, netikslius asmens duomenis, taip pat reikalauti ištrinti asmens duomenis, apriboti ar nesutikti su jų tvarkymu, taip pat prašyti perkelti asmens duomenis, pateikti skundą priežiūros institucijai;
- esu informuotas, kad išsamiau su asmens duomenų tvarkymo principais galiu susipažinti Draudiko tinklalapyje: <https://www.gjensidige.lt/privatumo-politika-lr-slapukai>. Draudiko duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: dp@gjensidige.lt.

Tarpininkas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi ADB „Gjensidige“ akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo. ADB „Gjensidige“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi tarpininko akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo.

Dėl šio draudimo produkto rekomendacija Jums nebuvo teikiama.

Tarpininko komisinis atlygis (procentinė išraiška nuo draudimo įmokos sumos) įskaičiuotas į draudimo įmoką.

Draudimo paslaugos nėra apmokestinamos PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnį.

ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

2018-11-02 Nr. 2793906

Kam: AB „LIETUVOS PAŠTAS“
J. JASINSKIO G. 16, VILNIUS, LIETUVA

UAB „VILUNGES STATYBA“, įmonės kodas 304584210, KAPSIŲ G. 96B, KAUNAS, LIETUVA (toliau „Draudėjas“) pagal 2018 m. spalio mėn. 25 d. nekilnojamojo turto remonto darbų pirkimo sutartį Nr. 2018-P00063 „Nekilnojamojo turto objektų statybos darbai. Šiaurės regione“ (toliau „Sutartis“) įsipareigojo AB „LIETUVOS PAŠTAS“ (toliau „Užsakovas“) atlikti sutartyje nurodytas paslaugas.

Pagal Sutartį Draudėjas privalo tinkamam Sutartyje nustatytų prievolių įvykdymui užtikrinti, susijusių su minėtų paslaugų atlikimu laiku ir tinkamos kokybės, pateikti draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą sumai, lygiam 14 000,00 EUR (Keturiolika tūkstančių EUR 00 ct). Laiduojama suma mažėja pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtų sumų dydžiu.

Atsižvelgiant į šį reikalavimą pareikiame, kad Užsakovui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, suteikiame Užsakovui Draudėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo laidavimo draudimo raštą. ADB „GJENSIDIGE“, ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau „Draudikas“) atsakomybė pagal šį laidavimo draudimo raštą yra apribota bendra 14 000,00 EUR (Keturiolika tūkstančių EUR 00 ct) draudimo suma. Jeigu Draudėjas neįvykdys prievolės, Draudikas, neviršydamas aukščiau nurodytos sumos, atsakys už tiesioginių nuostolių atlyginimą kaip ir Draudėjas. Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų mokėjimą bei Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų arba juos įvykdžius netinkamai, Draudikas įsipareigoja gavęs Užsakovo vadovo raštą reikalavimą registruotu laišku sumokėti jame nurodytas Draudėjo pagal Sutartį priklausančias mokėti sumas, neviršijant bendros 14 000,00 EUR (Keturiolika tūkstančių EUR 00 ct) draudimo sumos. Reikalavime išmokėti pagal Sutartį priklausančias sumas turi būti nurodyta, kurias Sutarties sąlygas Draudėjas pažeidė ir kuriomis Sutarties nuostatomis vadovaujantis turi būti išmokėtos Užsakovui pagal Sutartį priklausančios pagrįstos draudimo išmokos. Prie reikalavimo išmokėti aukščiau nurodytas sumas turi būti pridedami Užsakovo reikalavimą pagrindžiantys dokumentai.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Draudėjo turtą.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės (takos Draudiko įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui ar apimčiai ir neatsako Draudiko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šį laidavimo draudimo raštą vykdymo. Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ar tai jų apimčiai, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kildami dėl pareikšto reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.) (toliau „Taisyklės Nr. 036“) ir 2018 m. lapkričio mėn. 02 d. Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2793906 pagrindu.
(Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

Šis laidavimo draudimo raštas yra neatskirama Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2793906 sudėtinė dalis.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir nekeičiamas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo Draudėjo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki pilno Draudėjo pareigų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. lapkričio mėn. 01 d. imtinai. Reikalavimai pagal šį laidavimo draudimo raštą turi būti Draudikui pateikti iki nurodytos datos (2021-11-01) imtinai. Po to šis laidavimo draudimo raštas netenka galios.





Sutartinių prievolių laidavimo draudimas

Draudimo liudijimas: GJELT Nr. 2793906

Draudimo sutartis galioja: nuo 2018-11-02 iki 2021-11-01 24.00

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas	Draudimo grupė: Laidavimo draudimas
Draudimo objektas: Užsakovo turtiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių nevykdymu arba netinkamu įvykdymu	POLISO ID Nr.: 200834985

DRAUDIMO SUTARTIES ŠALYS

Draudėjas: UAB „VILUNGES STATYBA“, (m. kodas 304584210)

Adresas: KAPSIŲ G. 96B, KAUNAS, LIETUVA. Kontaktinis telefonas: +37065097783

Naudos gavėjas: AB „LIETUVOS PAŠTAS“, J. JASINSKIO G. 16, VILNIUS, LIETUVA

Draudikas: ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius. Įmonės kodas 110057869

Draudimo sutartį sudaro:

Šis draudimo liudijimas GJELT Nr. 2793906,

Laidavimo draudimo raštas Nr. 2793906,

Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsejo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.).

(Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Draudimo objektas:	Atlikimo laidavimo draudimas
Naudos gavėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartine civiline atsakomybe dėl Draudėjo prisiimtų įsipareigojimų, už kuriuos Draudikas laiduoja draudimo sutartimi, neįvykdymo ar netinkamo vykdymo	
Draudimo objekto pavadinimas:	2018 m. spalio mėn. 25 d. nekilnojamojo turto remonto darbų pirkimo sutartis Nr. 2018-P00063 "Nekilnojamojo turto objektų statybos darbai. Šiaurės regione"
Bendra draudimo suma EUR	14 000,00

Draudimo sutarties individualios sąlygos:

* Remiantis 2018-01-02 d. Susitarimu Nr.2 prie laidavimo draudimo sutarties, Laiduotojas UAB "Vilunge", (m.k. 134522910, atsako solidariai pagal prievolės, susijusias su draudimo išmokos grąžinimu Draudikui.

BENDRA INFORMACIJA

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo:

- suprantu, jog Draudikas privalo tvarkyti mano asmens duomenis tam, kad galėtų su manimi sudaryti ir vykdyti draudimo sutartis;
- esu informuotas, kad mano asmens duomenis, susijusius su sveikata, kiek jų reikia draudimo sutarčiai sudaryti ar vykdyti, Draudikas tvarkys mano sutikimo pagrindu, arba mano kreipimosi dėl įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, pagrindu;
- suprantu, kad draudikas turi teisę teikti ir / ar perduoti tvarkyti mano asmens duomenis teisės saugos institucijoms, bankams, VĮ „Regitra“, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, UAB „Creditinfo Lietuva“, valstybės registrams, sveikatos priežiūros įstaigoms, „Gjensidige Forsikring ASA“ įmonių grupei, draudimo bendrovėms, draudimo tarpininkams, draudimo žalių administravimo partneriams, informacinių technologijų paslaugas teikiančioms įmonėms, archyvacijos paslaugas teikiančioms įmonėms, kokybės tyrimų apklausos paslaugas teikiančioms įmonėms, turto vertinimo ir apžiūros įmonėms, skambučių centro paslaugas teikiančioms įmonėms ir kitiems tretiesiems asmenims pagal poreikį, reikalingą draudikui vykdančiam draudimo veiklą. Draudikas taip pat turi teisę teikti ir / ar perduoti tvarkyti mano asmens duomenis asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ir / ar jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkymu, kad pastarieji prireikus galėtų organizuoti skolų administravimą ir skolų išieškojimą iš draudėjo;
- suprantu, kad turiu teisę susipažinti su draudiko tvarkomais mano asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neišsamius, neteisingus, netikslius asmens duomenis, taip pat reikalauti ištrinti asmens duomenis, apriboti ar nesutikti su jų tvarkymu, taip pat prašyti perkelti asmens duomenis, pateikti skundą priežiūros institucijai;
- esu informuotas, kad išsamiau su asmens duomenų tvarkymo principais galiu susipažinti Draudiko tinklalapyje: <https://www.gjensidige.lt/privatumo-politika-ir-slapukai>. Draudiko duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: do@gjensidige.lt.

Tarpininkas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi ADB „Gjensidige“ akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo. ADB „Gjensidige“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi tarpininko akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo.

Dėl šio draudimo produkto rekomendacija Jums nebuvo teikiama.

Tarpininko komisinis atlygis (procentinė išraiška nuo draudimo įmokos sumos) įskaičiuotas į draudimo įmoką.

Draudimo paslaugos nėra apmokestinamos PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnį.

ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

2018-11-02 Nr. 2793896

Kam: AB „LIETUVOS PAŠTAS“
J. JASINSKIO G. 16, VILNIUS, LIETUVA

UAB "VILUNGĖS STATYBA", įmonės kodas 304584210, KAPSIŲ G. 96B, KAUNAS, LIETUVA (toliau "Draudėjas") pagal 2018 m. spalio mėn. 25 d. nekilnojamojo turto remonto darbų pirkimo sutartį Nr. 2018-P00063 "Nekilnojamojo turto objektų statybos darbai. Vakarų regione" (toliau "Sutartis") įsipareigojo AB "LIETUVOS PAŠTAS" (toliau "Užsakovas") atlikti sutartyje nurodytas paslaugas.

Pagal Sutartį Draudėjas privalo tinkamam Sutartyje nustatytų prievolių įvykdymui užtikrinti, susijusių su minėtų paslaugų atlikimu laiku ir tinkamos kokybės, pateikti draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą sumai, lygiai 10 000,00 EUR (Dešimt tūkstančių EUR 00 ct). Laiduojama suma mažėja pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtų sumų dydžiu.

Atsižvelgiant į šį reikalavimą pareiškiamo, kad Užsakovui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, suteikiame Užsakovui Draudėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo laidavimo draudimo raštą. ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") atsakomybė pagal šį laidavimo draudimo raštą yra apribota bendra 10 000,00 EUR (Dešimt tūkstančių EUR 00 ct) draudimo suma. Jeigu Draudėjas neįvykdys prievolės, Draudikas, neviršydamas aukščiau nurodytos sumos, atsakys už tiesioginių nuostolių atlyginimą kaip ir Draudėjas. Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų mokėjimą bei Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų arba juos įvykdžius netinkamai, Draudikas įsipareigoja gavęs Užsakovo vadovo raštišką reikalavimą registruotu laišku sumokėti jame nurodytas Draudėjo pagal Sutartį priklausančias mokėti sumas, neviršijant bendros 10 000,00 EUR (Dešimt tūkstančių EUR 00 ct) draudimo sumos. Reikalavime išmokėti pagal Sutartį priklausančias sumas turi būti nurodyta, kurias Sutarties sąlygas Draudėjas pažeidė ir kuriomis Sutarties nuostatomis vadovaujantis turi būti išmokėtos Užsakovui pagal Sutartį priklausančios pagrįstos draudimo išmokos. Prie reikalavimo išmokėti aukščiau nurodytas sumas turi būti pridedami Užsakovo reikalavimą pagrindžiantys dokumentai.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Draudėjo turtą.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės (takos Draudiko įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui ar apimčiai ir neatleis Draudiko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šį laidavimo draudimo raštą vykdymo. Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ar tai jų apimčiai, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kildę dėl pareikšto reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.) (toliau "Taisyklės Nr. 036") ir 2018 m. lapkričio mėn. 02 d. Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2793896 pagrindu.
(Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko Interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

Šis laidavimo draudimo raštas yra neatskiriama Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2793896 sudėtinė dalis.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir neįkeistas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo Draudėjo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki pilno Draudėjo pareigų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. lapkričio mėn. 01 d. imtinai. Reikalavimai pagal šį laidavimo draudimo raštą turi būti Draudikui pateikti iki nurodytos datos (2021-11-01) imtinai. Po to šis laidavimo draudimo raštas netenka galios.



[Handwritten signature]



Sutartinių prievolių laidavimo draudimas

Draudimo liudijimas: GJELT Nr. 2793896

Draudimo sutartis galioja: nuo 2018-11-02 iki 2021-11-01 24 00

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas	Draudimo grupė: Laidavimo draudimas
Draudimo objektas: Užsakovo turtiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu	POUSO ID Nr: 2009830483

DRAUDIMO SUTARTIES ŠALYS	
Draudėjas: UAB „VILUNGĖS STATYBA“, įm. kodas 304584210	
Adresas: KAPSIJ G. 96B, KAUNAS, LIETUVA. Kontaktinis telefonas: +37065097783	
Naudos gavėjas: AB „LIETUVOS PAŠTAS“, J. JASINSKIO G. 16, VILNIUS, LIETUVA	
Draudikė:	ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius. Įmonės kodas 110057869
Draudimo sutartį sudaro:	
Šis draudimo liudijimas GJELT Nr. 2793896;	
Laidavimo draudimo raštas Nr. 2793896;	
Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsejo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.). (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas).	
DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGOS	
Draudimo objektas:	Atlikimo laidavimo draudimas
Naudos gavėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartine civiline atsakomybe dėl Draudėjo prislimtų įsipareigojimų, už kuriuos Draudikas laiduoja draudimo sutartimi, neįvykdymo ar netinkamo vykdymo	
Draudimo objekto pavadinimas:	2018 m. spalio mėn. 25 d. nekilnojamojo turto remonto darbų pirkimo sutartis Nr. 2018-P00063 "Nekilnojamojo turto objektų statybos darbai. Vakarų regione"
Bendra draudimo suma EUR	10 000,00
Draudimo sutarties individualios sąlygos:	
* Remiantis 2018-01-02 d. Susitarimu Nr.2 prie laidavimo draudimo sutarties, Laiduotojas UAB "Vilunge", įm.k. 134522910, atsako solidariai pagal prievolės, susijusias su draudimo išmokos grąžinimu Draudikui.	
BENDRA INFORMACIJA	
Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo:	
- suprantu, jog Draudikas privalo tvarkyti mano asmens duomenis tam, kad galėtų su manimi sudaryti ir vykdyti draudimo sutartis; - esu informuotas, kad mano asmens duomenis, susijusius su sveikata, kiek jų reikia draudimo sutarčiai sudaryti ar vykdyti, Draudikas tvarkys mano sutikimo pagrindu, arba mano kreipimosi dėl įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, pagrindu; - suprantu, kad draudikas turi teisę teikti ir / ar perduoti tvarkyti mano asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, bankams, VĮ „Regitra“, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, UAB „Creditinfo Lietuva“, valstybės registrams, sveikatos priežiūros įstaigoms, „Gjensidige Forsikring ASA“ (monių grupei, draudimo bendrovėms, draudimo tarpininkams, draudimo žalių administravimo partneriams, informacinių technologijų paslaugas teikiančioms įmonėms, archyvacijos paslaugas teikiančioms įmonėms, kokybės tyrimų apklausos paslaugas teikiančioms įmonėms, turto vertinimo ir apžiūros įmonėms, skambučių centro paslaugas teikiančioms įmonėms ir kitiems tretiesiems asmenims pagal poreikį, reikalingą draudikui vykdančiam draudimo veiklą. Draudikas taip pat turi teisę teikti ir / ar perduoti tvarkyti mano asmens duomenis asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ir / ar jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkymu, kad pastarieji prireikus galėtų organizuoti skolų administravimą ir skolų išieškojimą iš draudejo; - suprantu, kad turiu teisę susipažinti su draudiko tvarkomais mano asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neišsamius, neteisingus, netikslius asmens duomenis, taip pat reikalauti ištrinti asmens duomenis, apriboti ar nesutikti su jų tvarkymu, taip pat prašyti perkelti asmens duomenis, pateikti skundą priežiūros institucijai; - esu informuotas, kad išsamiau su asmens duomenų tvarkymo principais galiu susipažinti Draudiko tinklalapyje: https://www.gjensidige.lt/privatumo-politika-ir-slapukai. Draudiko duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: dpd@gjensidige.lt.	
Tarpininkas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi ADB „Gjensidige“ akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo. ADB „Gjensidige“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi tarpininko akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo.	
Dėl šio draudimo produkto rekomendacija Jums nebuvo teikiama.	
Tarpininko komisinis atlygis (procentinė išraiška nuo draudimo įmokos sumos) (skaičiuotas į draudimo įmoką.	
Draudimo paslaugos nėra apmokestinamos PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnį.	

