

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „DS-1“, atstovaujama direktoriaus Vykinto Belicko, toliau vadinama **Rangovu**, remdamiesi Antžeminių magistralinio dujotiekio (toliau – **MD**) perėjų (3 vnt.) pakeitimo požeminėmis darbų supaprastinto pirkimo (toliau – **Pirkimas**) skelbiamų derybų būdu sąlygomis (toliau – **Pirkimo sąlygos**) (pirkimo Nr. 396723), Rangovo pateiktu galutiniu pasiūlymu (toliau – **Pasiūlymas**) ir pirkimo rezultatais, sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**). Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

1. Sutarties dalykas:

1.1. Sutarties objektą sudaro Magistralinio dujotiekio (ypatingasis statinys) Vilnius – Kaunas, MD Kaunas - Šakiai ir MD atšakoje į Alytaus DSS antžeminių dujotiekio perėjų (3 vnt.) pakeitimo požeminėmis (toliau – **Objektas**) darbai ir su jais susijusios paslaugos, atliekami pagal parengtus kapitalinio remonto projektus (etapas - techniniai darbo projektai) (toliau – **Projektai**), kuriuos statybos eigoje rengia Rangovas arba jo pasirinktas subrangovas, taip pat pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Pirkimo sąlygose įtvirtintas darbų apimtis ir atlikimo sąlygas, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra būtini Projektų ir Darbo projektų sprendiniams įgyvendinti (toliau – **Darbai**). Darbų apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos Pirkimo sąlygose, Sutartyje ir jos prieduose.

1.2. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais Rangovas įsipareigoja, pasitelkdamas savo darbo išteklius ir priemones, sugebėjimus, patirtį ir žinias, atlikti visus Sutarties 1.1 punkte nurodytus Darbus, ištaisyti jų defektus bei atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų trūkumų patirtus nuostolius, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Kainą.

1.3. Šalys susitaria, kad dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių atsiradimo Rangovo Pasiūlymo pateikimo metu Šalys negalėjo protingai numatyti, negalėjo kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos (pvz., esant aiškiai įrodomiems netikslumams ar klaidoms Objekto techniniame pase ar kitame dokumente, kuriuo buvo remtasi rengiant atitinkamą Pirkimo sąlygose įtvirtintą reikalavimą), dėl kurių nebereikia atlikti dalies Darbų; arba dėl techninių sprendinių keitimo ar teisės aktų pasikeitimo tam tikri Darbai tampa nereikalingi ir pan.), Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies Darbų, tačiau bendra atsisakytų Darbų vertė negali viršyti 10 procentų Kainos, apie tai informuodamas Rangovą ne vėliau kaip 60 dienų iki atitinkamų Darbų vykdymo pradžios, nebent dalies Darbų atsisakymas vykdomas Rangovo iniciatyva ar jam dalyvaujant, arba Šalys susitarė dėl trumpesnių įspėjimo terminų. Jeigu Užsakovas vėluoja pranešti apie atsisakomus Darbus, Rangovas turi teisę užbaigti Darbus, kuriuos jis pradėjo vykdyti, taip pat pareikalauti Užsakovo atlyginti Rangovo protingas ir dokumentais pagrįstas išlaidas, kurias Rangovas patyrė rengdamasis atlikti atsisakomus Darbus ir kurių nebūtų patyręs, jeigu Užsakovas apie atsisakomus Darbus būtų pranešęs per šiame punkte nustatytą terminą. Darbų atsisakymo atveju, Kaina yra mažinama atsisakytų Darbų verte, kuri yra apskaičiuojama pagal Pasiūlyme nurodytus atitinkamų Darbų įkainius. Jeigu nereikalingų atlikti Darbų vertė apskaičiuojama remiantis Rangovo kartu su Pasiūlymu pateiktomis objektinėmis sąmatomis, arba, jeigu nepakanka ir objektinių sąmatų – vadovaujantis Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – **SISTELA**), registruojamomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre (toliau – **Rekomendacijos**), kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

1.4. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartyje nurodytos medžiagos, įrenginiai, mechanizmai ir pan. nebegaminami arba jie išleisti nauju modeliu (laida), ir Rangovas pateikia tai įrodantį gamintojo patvirtinimą, Užsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrįstai neišduoti, Rangovas turi teisę pateikti kito modelio medžiagas, įrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra ne blogesnių charakteristikų, nei numatyta Sutartyje, nedidinant jų kainos, nekeičiant pristatymo terminų ir kitų Sutarties sąlygų.

1.5. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2. Sutarties kaina ir mokėjimo tvarka:

2.1. Sutarties kaina yra 588.040,00 Eur (penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturiasdešimt eurų ir 00 ct) (toliau – **Kaina**) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – **PVM**) ir PVM. PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2. Atskirai pagal Sutarties objekto dalis ir atskiras jų dedamąsias kainas yra išdėstytos šios Sutarties A priede.

2.3. Šalys susitaria, kad į Kainą be PVM (Sutarties A priede nurodytus įkainius be PVM) yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu, išskyrus PVM, ir dėl jokių priežasčių Kaina (įkainiai) be PVM negali būti didinama.

2.4. Už faktiškai ir kokybiškai per ataskaitinį mėnesį atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui 1 kartą Šalių pasirašyto tarpinio ir (ar) galutinio atliktų Darbų akto ir Rangovo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (toliau – **E. sąskaita priemonės**) pateiktos PVM sąskaitos faktūros pagrindu. Užsakovas mokėjimus Rangovui pagal jo pateiktas PVM sąskaitas faktūras atlieka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos išrašymo dienos. Paskutinis mokėjimas atliekamas tik po to, kai Rangovas įvykdo Sutarties 3.7 punkte įtvirtintas sąlygas.

2.5. Pasirašyti atliktų Darbų aktai turi būti pristatyti Užsakovui į Projektų valdymo skyrių. Atliktų Darbų aktai turi būti pristatyti ne vėliau, kaip 25 ataskaitinio mėnesio dieną. Pasirašytų atliktų Darbų aktų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros turi būti pateiktos informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

2.6. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais bankiniu pavedimu į Rangovo nurodytą Rangovo sąskaitą. PVM mokamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 96 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2.7. Draudžiama didinti Kainą (be PVM) per visą Sutarties galiojimo laiką ir keisti esmines pirkimo metu nustatytas sudarytos Sutarties sąlygas, išskyrus kainų pasikeitimą dėl Kainos perskaičiavimą praėjus 12 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos, taikant Lietuvos statistikos departamento pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 12 mėnesių inžinerinių tinklų (išskyrus nuotekų šalinimo) statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Kainų pakeitimas įforminamas abiemis sutarties Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Perskaičiavimas atliekamas statybos darbų kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto einamųjų metų atitinkamo mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų atitinkamo (Sutarties sudarymo mėnesio) kainų indekso. Perskaičiuojama tų statybos darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo, kaina. Kainos perskaičiavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaikė Grafike nustatytų Darbų atlikimo terminų ir jei terminų keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu, t. y. Kainos perskaičiavimas negalimas tų Darbų, kurių atlikimo terminų nebuvo laikomasi, o rašytinio suderinimo dėl Darbų vykdymo terminų pakeitimo nebuvo. Perskaičiuota kaina įsigalioja ir taikoma tik tai pristatytai Įrangai ir Darbams, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos.

2.8. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus Darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Užsakovo nurodytų Darbų defektų arba pažeidė dujotiekį ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą ar kitaip pažeidė Sutarties sąlygas bei šių pažeidimų nepašalina.

2.9. Jei Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

2.10. Atsiskaitant, priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigių) suma bus mažinama Rangovo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma. Užsakovas taip pat turi teisę į Rangovui mokėtinas sumas įskaityti visas ir bet kokiais Rangovo mokėtinas Užsakovo sumas, įskaitant pagal Sutartį mokėtinas nuostolių kompensacijas, kitas sumas, bei jų dydžiu susimažinti Užsakovo mokėtinas sumas Rangovui.

3. Darbų atlikimo trukmė, jų eiga ir atliktų Darbų priėmimas:

3.1. Darbų pradžia – Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai, galutinio Darbų atlikimo terminas – taip kaip numatyta Sutarties 3.2 punkte nurodytame Darbų atlikimo grafike (toliau – **Grafikas**), bet ne vėliau kaip iki **2019-10-31**.

3.2. Grafike, kurį Rangovas privalo parengti, suderinti su Užsakovu ir pateikti jį Užsakovui ne vėliau kaip 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo, įtvirtinti tarpiniai Darbų atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, gali būti keičiami raštu sudarytu susitarimu, jeigu tai nekeičia galutinio Darbų atlikimo termino. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prašymas pakeisti Grafike įtvirtintus tarpinius Darbų atlikimo terminus Užsakovui nėra privalomas. Grafiką taip pat būtina pakeisti, jeigu galutinis Darbų atlikimo terminas pratęsiamas Sutarties 3.3 punkte nustatytais atvejais, kartu su tokio pratęsimo įforminimu Šalių raštišku susitarimu.

3.3. Sutarties 3.1 punkte nurodytas galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas esant šioms aplinkybėms:

3.3.1. užsitęsiosios (trunkančios ilgiau nei 14 dienų) nepalankios oro sąlygos, dėl kurių neįmanoma vykdyti Darbų – intensyvios liūtys, potvyniai, tirštas rūkas, šqualiniai vėjai, gausus sniegas, pūga ar pan. Ši galimybė taikoma tik Darbams, kurių atlikimo kokybė ir atlikimas priklauso nuo gamtinių sąlygų;

3.3.2. nepravažiuojami ar sunkiai pravažiuojami (reikalinga speciali technika) privažiavimo prie inžinerinių statinių keliai;

3.3.3. Užsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant Užsakovo vėlavimą deleguoti specialistus, atsakingus už Sutartyje numatytą įsipareigojimų vykdymą, statybvietės neperdavimą Rangovui, Sutarties 4.2.3 punkte nurodyto sutikimo ar kitų Darbų vykdymui būtinų sutikimų, už kurių išdavimą yra atsakingas Užsakovas, neišdavimas, kitų Užsakovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;

3.3.4. bet kurių valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui teisės aktais priskirtų funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą) terminą;

3.3.5. užsitęsiosios viešojo pirkimo procedūros, dėl ko pradėti ir (ar) užbaigti Darbų per Sutarties 3.1 punkte nustatytą terminą tapo neįmanoma arba pernelyg sudėtinga (pvz., Sutartis pasirašyta vėliau nei buvo nurodyta Užsakovo (Perkančiojo subjekto) pranešime dėl sutarties su pirkimo laimėtoju sudarymo; Sutarties pasirašymo momentu, kai pagal pirkimo procedūrų vykdymo metu pateiktus duomenis tiekėjas (Rangovas) pagrįstai planavo vykdyti Darbus ar jų dalį ir pan.).

3.4. Rangovas, prašydamas galutinio Darbų įvykdymo termino pratęsimo pagal 3.3 punktą, privalo pagrįsti atitinkamų sąlygų egzistavimą ir jų įtaką Darbų atlikimo terminams. Sutarties 3.1 punkte nurodytas galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik tokiam laikui, kol egzistuoja Sutarties 3.3 punkte nurodytos aplinkybės. Dėl galutinio Darbų atlikimo termino pratęsimo Šalys sudaro papildomą susitarimą raštu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.5. Rangovo atliekamų Darbų eiga bus fiksuojama kas mėnesį pasirašant tarpinius atliktų Darbų aktus. Šalys susitaria, kad tarpiniai atliktų Darbų aktai pasirašomi išimtinai Kainos dalių mokėjimo Rangovui tikslais ir nereiškia Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui. Nuod tarpinio perdavimo Darbų akto pasirašymo momento Užsakovui pereina nuosavybė į visus tarpiniame Darbų perdavimo akte nurodytų Darbų rezultatus. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina, kad nepaisant nuosavybės perėjimo momento, už tinkamą tokių Darbų rezultatų apsaugą ir kitų Sutartyje nurodytų

įsipareigojimų vykdymą neužbaigtų Darbų atžvilgiu iki galutinio Darbų perdavimo akto (pagal kiekvieną Objektą atskirai) pasirašymo dienos atsako Rangovas.

3.6. Gavęs tarpinį ir (ar) galutinį atliktų Darbų aktą, Užsakovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas jį pasirašyti arba, jei nustatomi Darbų trūkumai ir (ar) defektai, grąžinti jį Rangovui kartu nurodant nustatytus Darbų trūkumus ir (ar) defektus ir nustatant protingą, bet ne ilgesnį nei 5 (penkių) darbo dienų terminą, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria kitaip, jiems pašalinti. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad tarpiniai ir (ar) galutinis atliktų Darbų aktai pasirašomi tik dėl tinkamai atliktų Darbų, kuriuos patvirtina Užsakovo techninis priežiūrėtojas. Rangovas įsipareigoja pasirašant tarpinius ir (ar) galutinį atliktų Darbų aktus, perduoti Užsakovui ir atliktų paslėptų Darbų aktus.

3.7. Rangovas perduota visus Darbus Užsakovui, Šalims pasirašant galutinį atliktų Darbų užbaigimo aktą. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas neturi teisės vienašališkai pasirašyti galutinio atliktų Darbų užbaigimo akto ir perduoti Užsakovui Darbų. Galutinis atliktų Darbų užbaigimo aktas pasirašomas tik esant žemiau nurodytoms sąlygoms:

3.7.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir ištaisė Darbų trūkumus, jei tokių buvo nustatyta.

3.7.2. Visų Sutarties B priede numatytų Darbų bandymų rezultatai yra teigiami.

3.7.3. Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui galutinį Darbų užbaigimo aktą (-us).

3.7.4. Rangovas surašė deklaraciją apie statybos užbaigimą (toliau – **Deklaracija**) ir šią patvirtintą (*jeigu taikoma*) ir įregistruotą (*jeigu taikoma*) Deklaraciją perdavė (kartu su visais priedais) Užsakovui.

3.7.5. Rangovas perduoda Užsakovui visą dokumentaciją, nurodytą šios Sutarties 8.5 punkte.

3.7.6. Rangovas įvykdė Sutarties 4.2.32 punkte nustatytus reikalavimus.

3.7.7. Rangovas priėmimo-perdavimo aktu perdavė Užsakovui Projektus.

3.7.8. Rangovas pateikė statybines atliekas tvarkančių įmonių išduotus dokumentus apie pridurtas statybines atliekas (dokumentuose, pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte, turi būti nurodyta: perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data) (taikoma, jeigu B priede nenustatyta kitaip).

3.8. Pasirašius galutinį Darbų perdavimo aktą, laikoma, kad Darbų rezultatai perduoti Užsakovui. Tačiau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos ištaisyti visus likusius Darbų trūkumus ir laikyti Sutarties 7.4 punkte numatytų garantinių įsipareigojimų.

3.9. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria ir patvirtina, kad atsitiktinė Darbų rezultatų žuvimo rizika iš Rangovo pereina Užsakovui tik abiemis Šalims pasirašius galutinį Darbų perdavimo aktą.

3.10. Užsakovas turi Darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus Sutartyje numatytų Darbų atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu. Raštu pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrintų Rangovo atliekamų Darbų kokybę, o Rangovas įsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas sąlygas, įskaitant (bet neapsiribojant) patekimą į statybietę, kurioje vykdomi Darbai, bei visų reikiamų dokumentų patekimą, kad būtų galima patikrinti Rangovo atliekamų Darbų kokybę.

3.11. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra galimai prieštaraujantys teisės aktų reikalavimams arba galintys sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas turi teisę raštu apie tai pranešti Užsakovui per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas raštu per šiame punkte nurodytą terminą nepareiškia Užsakovui, kad Užsakovo duoti nurodymai galimai prieštarauja teisės aktų reikalavimams arba gali sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas tampa visiškai atsakingas už tokių nurodymų įgyvendinimo galimas pasekmes.

3.12. Jeigu Šalys nesutaria dėl atliktų Darbų tinkamumo, apie atliktų Darbų tinkamumą sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą, kuri yra privaloma Šalims. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų Darbų kokybės Šalių rašytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Šaliai pastarosios visas išlaidas eksperto darbui apmokėti. Jei Šalys nesutaria dėl eksperto kandidatūros per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai tarp Šalių sprendžiami Sutarties 12.3 punkte nustatyta

tvarka. Užsakovo teisė sustabdyti apmokėjimą už netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darbų galioja iki eksperto išvados Užsakovo nenaudai priėmimo.

3.13. Rangovas privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose Darbų vykdymo pasitarimuose Užsakovo nurodytu metu. Darbų vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Darbų vykdymo pasitarimo parengti ir pateikti Užsakovui patvirtinti Darbų vykdymo protokolą. Jei Rangovas pažeidė šiame punkte įtvirtintą įsipareigojimą ir pasitarime nedalyvavo, jam taikoma 200 Eur bauda už kiekvieną nedalyvautą pasitarimą.

4. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai:

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus, išduoti raštišką sutikimą dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje (toliau – **Sutikimas**).

4.1.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal šios Sutarties 2.4 punkte nurodytą mokėjimo tvarką.

4.1.3. Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą bei raštu informuoti Rangovą apie paskirtą techninį priežiūrėtoją.

4.1.4. Perduoti Rangovui statybvietę.

4.2. Rangovas įsipareigoja:

4.2.1. Atlikti šios Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus kokybiškai, vadovaujantis Sutartimi, Pirkimo sąlygomis, Pasiūlymu, Grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

4.2.2. Apsirūpinti visomis reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui.

4.2.3. Iki Darbų atlikimo pradžios gauti Sutikimą ir neatlikti jokių Darbų be šio Sutikimo. Užsakovo išduotas Sutikimas turi galioti visų Darbų atlikimo metu. Rangovas privalo užtikrinti kad visi Darbus vykdančys subrangovai, sudarę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, gautų Sutikimą.

4.2.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti statinio statybos vadovą ir specialių statybos darbų vadovą bei raštu pranešti Užsakovui statinio statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovo pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros metu, jeigu tokie duomenys Užsakovui dar nebuvo pateikti anksčiau, bei bet kokius šių duomenų pasikeitimus.

4.2.5. Atsakyti ir padengti Užsakovo patirtus nuostolius dėl sutrikdyto magistralinio dujotiekio darbo ir (ar) jo pažeidimų, taip pat bet kokius nuostolius, patirtus dėl magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimų, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovų, vykdant Darbus, kaltės ar bet kokio kitokio šios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

4.2.6. Darbų metu užtikrinti patekimą ir, jei taikoma, privažiavimą į žemės savininkų ir (ar) valdytojų sklypus, tol, kol įprastą patekimą ar privažiavimą apsunkina vykdomi Darbai.

4.2.7. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomų Darbų pradžios raštu informuoti apie planuojamus atlikti Darbus žemės savininkus, patikėtinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus trečiuosius asmenis. Atlikti žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas ir (ar) įrengti naujas melioracijos, drenažo ir kitas inžinerines sistemas, taip pat savo lėšomis žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims išmokėti kompensacijas už Darbų vykdymo metu Darbais padarytą žalą ir pateikti Užsakovui pažymas apie tai, kad šie asmenys pretenzijų neturi. Užsakovas neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas gavo ir Užsakovui pateikė šiame punkte nurodytas pažymas, patvirtinančias, jog jie pretenzijų neturi. Neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs šiame punkte įtvirtintą pareigą pateikti pažymas, Rangovas veikia išimtinai tik savo rizika.

4.2.8. Užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. Rangovas užtikrina, kad jo ar subrangovų samdomi darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebus apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ir (ar) psichotropinių medžiagų. Rangovas yra atsakingas už savo, subrangovų ir Užsakovo (jų darbuotojų) ir trečiųjų asmenų turto, įskaitant darbo priemonių, įrenginių, mechanizmų saugojimą nuo sugadinimo, vagystės, meteorologinių sąlygų poveikio iki visų Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui dienos. Rangovui tenka visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos, sveikatos saugos, gaisrinės saugos, dujų ūkio, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi.

4.2.9. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nepriklausomai nuo to, ar Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo darbuotojai ir (ar) jo pasamdyti subrangovai, jų darbuotojai atitiktų Pirkimo sąlygose, Sutartyje ir (ar) galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turėtų teisę vykdyti Darbus, Darbus vykdytų kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojančius kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti Darbus patvirtinančius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys. Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti kitais specialistais tik dėl objektyvių priežasčių (specialisto mirtis, liga, darbo santykių su Rangovu ar jo subtiekiu nutraukimas ir pan.), ne žemesnės kvalifikacijos ir patirties nei nustatyta Pirkimo sąlygose ir (ar) reikalaujama galiojančiuose teisės aktuose, specialistus tik šioje Sutartyje nustatyta tvarka gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą tokiam pakeitimui. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytą specialistą ar pasitelkti naują specialistą bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisės aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą. Užsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ketinamas pasitelkti specialistas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą.

4.2.10. Visiškai atsakyti už savo ir subrangovų darbuotojų saugą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų Darbų vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų Rangovo, subrangovų, Užsakovo darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą statybvietėje, bei užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietėje būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvietė atitiktų kitus jai teisės aktų nustatytus reikalavimus.

4.2.11. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovas ir (ar) jo pasamdyti subrangovai būtų apsidraudę statybos darbų ir (ar) civilinės atsakomybės draudimu (*taikoma, jeigu tokių pareigų nustato Sutartis ar teisės aktai*).

4.2.12. Įsigyti statybos darbų žurnalą ir užtikrinti, kad jis būtų kasdien tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovo atstovams tikrinti statybos darbų žurnalą.

4.2.13. Gauti visus Darbų vykdymui reikalingus sutikimus.

4.2.14. Vykdamas Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant:

(i) Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-169 redakcija);

(ii) Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128;

(iii) Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1-213;

(iv) Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biudujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 1-191 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1-128 redakcija), ir kt.

4.2.15. Įforminti Darbų atlikimą tarpiniais ir (ar) galutiniu atliktų Darbų aktais pagal raštu Užsakovo patvirtintas formas.

4.2.16. Nekokybiškai atliktus Darbus perdaryti savo sąskaita per Sutarties 7.6 punkte nurodytomis sąlygomis nustatytą terminą.

4.2.17. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, prižiūrinčiomis statybos darbų vykdymo procesus, dalyvauti šių institucijų atliekamuose tikrinimuose ir savo sąskaita ištaisyti tikrinimų metu nustatytus trūkumus.

4.2.18. Vykdyti reikalavimus, kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, reikalinguose Darbų vykdymui, bei suteikti galimybę juos išdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims kontroliuoti ir tikrinti, kaip laikomasi tokių reikalavimų.

4.2.19. Suteikti galimybę Užsakovo nurodytiems asmenims ar kontroliuojančioms institucijoms dalyvauti Sutartyje arba teisės aktuose numatytuose Darbų bandymuose ir tikrinimų procedūrose, neatleidžiant Rangovo nuo atsakomybės už Darbus pagal šią Sutartį.

4.2.20. Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar žmonių saugos reikalavimus pažeidžiančius incidentus.

4.2.21. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietėje, kviesti juose dalyvauti Užsakovo atstovus, darbų techninius prižiūrėtojus ir projekto vykdymo priežiūros atstovus, sudaryti jiems reikiamas sąlygas bei suteikti reikalingas darbo priemones. Sudaryti saugias sąlygas Užsakovo darbuotojui, dalyvaujančiam Rangovui vykdant Darbus, ir, esant poreikiui, įtraukti šį Užsakovo darbuotoją į forminamą gamtinių dujų aplinkoje atliekamų darbų dokumentaciją bei instruktuoti jį darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

4.2.22. Suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir techninio projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas, darbo eigą ir kokybę, taip pat Darbų atlikimo metu ar juos atlikus per Užsakovo nurodytą protingą terminą teikti bet kokią Užsakovo teisėtai prašomą informaciją ir dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus Darbus (jų dalį) bei atlyginti visą Užsakovo žalą, kurią jis patyrė dėl to, kad Rangovas nepateikė, atsisakė pateikti, pateikė netinkamą informaciją ir/ar dokumentus.

4.2.23. Užbaigus Darbus ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raštu pranešti Užsakovui apie Darbų pabaigą.

4.2.24. Perduoti tinkamai atliktus Darbus Užsakovui, Darbų užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus.

4.2.25. Organizuoti Užsakovo tvarkomuoju dokumentu paskirtos Darbų užbaigimo komisijos darbą bei pateikti komisijai visą reikiamą atliktų Darbų dokumentaciją.

4.2.26. Parengti ir sukomplektuoti visus pagal teisės aktų reikalavimus privalomus dokumentus dėl Deklaracijos surašymo, tvirtinimo (*jeigu taikoma*) ir registravimo (*jeigu taikoma*), atlikti visus šiam tikslui įgyvendinti reikalingus veiksmus.

4.2.27. Nedelsiant, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, pašalinti komisijos narių nustatytus ir nurodytus Darbų trūkumus.

4.2.28. Rangovas prisiima riziką atlikti visus Darbus ir suteikti su jais susijusias paslaugas, kad įgyvendintų Projektuose ir Darbo projektuose numatytus sprendinius. Rangovas patvirtina, kad Pirkimo vykdymo metu išsamiai išanalizavo Pirkimo sąlygas ir technines specifikacijas ir įsitikino, kad sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus, jie yra ekonomiškai racionalūs ir saugūs. Rangovas prisiima riziką dėl galimų techninių sprendinių pakeitimų, taip pat dėl darbų, kurie juose nenumatyti, bet reikalingi atlikti, siekiant užbaigti Darbus.

4.2.29. Užbaigus Darbus Objekte, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų pristatyti į Užsakovo nurodytą vietą medžiagų likučius bei demontuotą įrangą.

4.2.30. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, vykdyti statybinių atliekų apskaitą ir tvarkymą statybvietėje laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, nustatytų reikalavimų, užtikrinti tinkamą Darbų vykdymo metu susidariusių statybinių atliekų perdavimą atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei.

4.2.31. Statybos įstatyme bei aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka įrengti stendą su informacija apie statomą statinį.

5. Draudimas:

5.1. Su Užsakovu suderintomis sąlygomis ir Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje Rangovas turi apsidrausti:

5.1.1. **Statinio statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.** Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šis draudimas:

5.1.1.1. būtų sudarytas pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207;

5.1.1.2. apdraustų Rangovo atliekamus Objekto statybos darbus (Darbus) privalomuoju draudimu ne mažesnei draudimo sumai nei Darbų vertė, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 0,1 procento Darbų draudimo sumos, bet ne mažesnei nei 500 Eur (penki šimtai eurų) besąlygine išskaita; Darbų draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas iki Rangovas perduos visų Darbų rezultatą Užsakovui (galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo dienos);

5.1.1.3. apdraustų Rangovo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu ne mažesnei nei 200.000 Eur draudimo sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2.900 Eur besąlygine išskaita; civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimas turi būti užtikrintas ne trumpiau, kaip 2 metus nuo visų Darbų rezultato atidavimo naudoti (galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo) dienos;

5.1.1.4. Darbus ir civilinę atsakomybę apdraustų atskirai dėl šioje Sutartyje numatyto Objekto statybos darbų;

5.1.1.5. apimtų ir Rangovo pasirinktų subrangovų vykdomus Darbus ir jų civilinę atsakomybę, jei Darbai vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis;

5.1.1.6. įsigaliotų ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo statybvietės perdavimo Rangovui dienos ir ne vėliau nei iki Darbų pradžios.

5.1.2. **Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.** Draudimas turi būti sudarytas pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Projektų rengėjo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas:

5.1.2.1. apdraustų Projektų rengėjo civilinę atsakomybę vienu iš šių būdų:

a) atsižvelgiant į statinio projektuotojo statinių projektavimo darbų mastą per metus – ne mažesnei nei 289.600 Eur sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2.900 Eur besąlygine išskaita vienam draudimui įvykiui;

b) sudarytu atskirai šiai Sutarčiai (atskirai dėl Projektų) ne mažesnei nei 43.400 Eur sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2.900 Eur besąlygine išskaita vienam draudimui įvykiui;

5.1.2.2. apimtų subrangovų, sudariusių subrangos sutartis su Rangovu dėl Projektų parengimo, civilinę atsakomybę;

5.1.2.3. įsigaliotų per 15 dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos bei draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas ne trumpiau nei iki Lietuvos Respublikos [civilinio kodekso](#) 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.

5.2. Rangovas sudarytas 5.1 punkte nurodytas draudimo sutartis (polisus) bei įrodymus apie pirmųjų draudimo įmokų sumokėjimą privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.3. Nepateikus laiku bet kurios iš Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties ir (ar) įrodymų apie pirmųjų draudimo įmokų sumokėjimą, Užsakovas turi teisę: a) įspėjęs Rangovą prieš 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti draudimo sutartį Rangovo vardu bei patirtas išlaidas išskačiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, taip pat reikalauti sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 3.000 Eur, ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda; arba b) nutraukti šią Sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti Rangovo sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos, ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.

5.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui įrodymus apie 5.1 punkte numatytų draudimo sutarčių kiekvienos draudimo įmokos sumokėjimą ne vėliau kaip per 10 dienų po atitinkamos įmokos sumokėjimo.

5.5. Jei bet kurios iš Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtųsi anksčiau nei nurodyta šioje Sutartyje, Rangovas įsipareigoja sudaryti naują draudimo sutartį tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis sąlygomis nei nustatyta šioje Sutartyje, likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos. Užsitęsęs Sutarties vykdymui, atitinkamam laikotarpiui turi būti pratęsiamas draudimo sutarčių galiojimas tokiomis pačiomis ar ne blogesnėmis sąlygomis nei nustatyta šioje Sutartyje.

5.6. Rangovo nemokėjimas laiku draudimo įmokų bei šios ar bet kokių kitokių priežasčių sąlygotas bet kurios iš Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties nutrūkimas ar tapimas neatitinkančia šios Sutarties sąlygų yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir yra pagrindas Užsakovui vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jei Rangovas per šį įspėjimo terminą nepateikia naujos draudimo sutarties su tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis nei nustatytos šioje Sutartyje sąlygomis, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti dėl to patirtų nuostolių atlyginimo, kurių minimalus dydis Šalių susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos.

6. Sutarties įvykdymo ir garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimai:

6.1. **Prievolių pagal šią Sutartį įvykdymui užtikrinti** Rangovas per 5 darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui priimtina **sutarties įvykdymo užtikrinimą** – besąlyginę ir neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko garantiją, išduotą bent vienos tarptautinės reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą (ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – BBB-, Fitch – BBB- ar Moody's – Baa3) turinčio banko (reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai jis priklauso) (toliau – **Sutarties įvykdymo užtikrinimas**). Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 10 (dešimt) procentų Kainos.

6.2. Jeigu Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo 6 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis, yra laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti šią Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **PI**) 94 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis kviešti sudaryti Sutartį kitą tiekėją ir sumokėti baudą, lygią 10 proc. Kainos, taip pat pareikalauti Rangovo atlyginti dėl Sutarties neįsigaliojimo patirtus nuostolius, įskaitant naujo Sutartį pasirašyti kviečiamo tiekėjo ir Rangovo pasiūlytų kainų skirtumą, kiek tokių nuostolių nepadengia šiame punkte numatyta bauda.

6.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas neblogesnėmis negu tos, kurios nustatytos 6 punkte, sąlygomis turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį, t.y. iki Sutarties 3.1 nurodyto galutinio Darbų atlikimo termino ir 45 (keturiasdešimt penkias) dienas po to. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas pasibaigs anksčiau ar dėl bet kokių priežasčių taps neatitinkančiais 6 punkte nustatytų

sąlygų, Rangovas ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šio užtikrinimo galiojimo terminą (sudarant naują arba pratęsiant besibaigiančią galioti sutartį su banku ar draudimo kompanija) bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus Užsakovui.

6.4. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo ne vėliau kaip per 5 dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties 6 punkte nustatytas sąlygas. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis Rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdymo.

6.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimu turi būti garantuojama, kad Rangovas:

6.5.1. atliks Darbus pagal šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus;

6.5.2. atliks Darbus nepažeisdamas šioje Sutartyje nustatytų terminų;

6.5.3. neteisėtai neatsisakys vykdyti arba tęsti jau pradėtų Darbų pagal šią Sutartį;

6.5.4. sumokės Sutartyje numatytas netesybas bei pagal šios Sutarties nuostatas atlygins visus Užsakovo patirtus nuostolius, neturtinę žalą dėl netinkamo Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo arba jų nevykdymo;

6.5.5. Sutarties 6.4 punkte nustatytais terminais sudarys naują ar pratęs galiojančią sutartį su banku ar draudimo bendrove dėl naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimo, jei anksčiau pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas pasibaigtų anksčiau nei numatyta šios Sutarties 6.3 punkte.

6.6. Rangovas, nepateikęs laiku naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar nepratęsęs Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 0,1 procento nuo Kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki prievolės įvykdymo dienos.

6.7. **Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui** Rangovas privalo pateikti neatšaukiamą ir besąlyginę pirmo pareikalavimo banko garantiją ar draudimo kompanijos laidavimo raštą. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinių įsipareigojimų užtikrinimo laidavimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo raštu turi pateikti mokėjimo nurodymo kopiją, patvirtinančią, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo raštą yra sumokėta.

6.8. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti ne mažesnio kaip 5 procentų nuo Kainos dydžio;

6.9. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti formos, kuri iš anksto suderinta su Užsakovu, tačiau visais atvejais ji turi apimti iš esmės tokias sąlygas:

6.9.1. bankas / draudimo bendrovė turi sumokėti Užsakovui pagal šio pirmą raštišką pareikalavimą ne didesnę nei garantijoje ar laidavime nurodytą sumą;

6.9.2. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių pasinaudoja jam pateiktu užtikrinimu;

6.9.3. galioti ne trumpiau nei 3 metus nuo galutinio Darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos;

6.9.4. Užtikrinimui netaikomi jokie kiti papildomi banko/draudimo kompanijos reikalavimai ir/ar apribojimai.

6.9.5. užtikrinime nurodyta suma gali būti mažinama kiekviena atitinkamai Užsakovui išmokėta suma;

6.9.6. būti išduotas banko / draudimo bendrovės, kurie garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažiau kaip vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą (ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – BBB-, Fitch – BBB- ar Moody's – Baa3 arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas / draudimo bendrovė, kurie išdavė garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso).

6.10. Tuo atveju, jeigu bet kuriuo Pirkimo procedūrų ar Sutarties vykdymo metu būtų priimtos garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo privalomojo draudimo taisyklės ar kitas teisės aktas, Rangovas privalės pateikti šias taisykles (ar kitą teisės aktą) atitinkantį draudimą (nesumažinant Sutarties 6.8-6.9 punktuose nustatytų reikalavimų).

7. Garantijos:

7.1. Rangovas garantuoja, kad atliktų Darbų aktų pasirašymo metu Darbai atitiks Pirkimo sąlygose ir Sutartyje išdėstytus reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

7.2. Darbai, atlikti su trūkumais, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmesti Užsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostatų, turi būti perdaromi Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Jei minėtas terminas viršija Grafike nustatytus terminus, tai Rangovas moka Užsakovui šios Sutarties 10.4 punkte nustatytus delspinigius.

7.3. Jei Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų, tarp jų nurodytų Sutarties 7.2 punkte, nepašalina per Užsakovo nurodytą terminą, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi Šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

7.4. Rangovas Darbams (įskaitant, bet neapsiribojant statybos produktus bei Sutarties 4.2.7 punkte nurodytus darbus) suteikia 5 metų, paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) – 10 metų, tyčia paslėptiems Objekto defektams – 20 metų garantiją. Rangovas tiekiamoms medžiagoms, gaminiams ir įrangai suteikia gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne trumpesnį kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo dienos.

7.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali būti naudojama pagal paskirtį dėl Darbų defektų ir (ar) trūkumų, arba jeigu Rangovas nepradeda šalinti nustatytų trūkumų arba jų nepašalina, garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratęsimi.

7.6. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darbų defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita pašalinti ne ilgiau kaip per 10 dienų, išskyrus atvejus, kai Rangovas įrodo, kad nustatytiems trūkumams ir (ar) defektams pašalinti būtinas ilgesnis terminas, ir atlyginti visus dėl tokių defektų ir (ar) trūkumų Užsakovo patirtus nuostolius.

7.7. Užsakovas, garantiniu laikotarpiu nustatęs Darbų trūkumus ir (ar) defektus, turi teisę reikalauti:

- i) neatlygintinai pašalinti defektus ir (ar) trūkumus per protingą terminą;
- ii) atitinkamai sumažinti Darbų kainą;
- iii) savo jėgomis arba pasitelkus trečiuosius asmenis Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti defektus ir (ar) trūkumus ir reikalauti, kad Rangovas atlygintų defektų ir trūkumų šalinimo išlaidas.

7.8. Rangovas sutinka su Kaina ir už ją įsipareigoja įvykdyti visus šios Sutarties 1 dalyje nustatytus Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kurių būtinybė išaiškėjo Sutarties vykdymo eigoje, jei jie susiję su Objekto statyba, ištaisyti Darbų defektus ir (ar) trūkumus bei atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų defektų ir (ar) trūkumų patirtus nuostolius.

7.9. Rangovas garantuoja, kad Darbų rezultate sukurtas bet koks autorinių teisių produktas negali būti, nėra ir nebus apsunkintas jokiomis Rangovo ar trečiųjų asmenų turutinėmis teisėmis, reikalavimais ar pretenzijomis j juos. Tokios autorinės teisės įeina į Kainą ir yra laikomos perleistomis Užsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatšaukiamai ir besąlygiškai nuo Užsakovo sumokėjimo Rangovui už Darbų dalį, kurios rezultate atsirado bet koks autorinių teisių produktas, nuo Užsakovo Darbų priėmimo dienos. Rangovas įsipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius Užsakovo nuostolius, patirtus dėl Rangovo įsipareigojimų pagal šį punktą nesilaikymo.

8. Įranga, medžiagos, darbų kokybė ir statybos techninė dokumentacija:

8.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medžiagas, įrangą, gaminius ir įrenginius, kurie atitinka Pirkimo sąlygose, Projektuose ir Sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo sąlygos nenustato reikalavimų tam tikros medžiagoms, gaminiams ar įrenginiams – Rangovas

turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darbų atlikimo metu naudojamo tipo medžiagas, gaminius ir įrenginius, suderintus su Užsakovu.

8.2. Jei Rangovas naudoja Sutarties 8.1 punkte nustatytų reikalavimų neatitinkančius medžiagas, įrangą, gaminius ir įrenginius, Užsakovas ar jį atstovaujantis techninis prižiūrėtojas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo juos Rangovo sąskaita pakeisti atitinkančiais 8.1 punkte nustatytus reikalavimus.

8.3. Sumontuota įranga, atskiros dujotiekio dalys turi būti pažymėti tinkamais identifikaciniais ženklais ir nudažytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvus.

8.4. Rangovas užtikrina, kad Darbų kokybė atitiks Pirkimo sąlygose, Sutartyje ir (ar) tokios rūšies darbams teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

8.5. Prieš surašant galutinį Darbų užbaigimo aktą, Rangovas turi pateikti Užsakovui žemiau nurodytą techninę ir kitą dokumentaciją (1 egz.):

8.5.1. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų tikrinimų, bandymų ir tikrinimų rezultatų protokolus, ataskaitas ir (ar) kitus dokumentus;

8.5.2. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų gamyklinius kokybės sertifikatus, saugos atitikties dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;

8.5.3. įrangos, matavimo prietaisų techninius pasus;

8.5.4. naudojimo ir gamintojų techninės priežiūros (aptarnavimo) instrukcijas įrangai, gaminiams, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms (lietuvių kalba);

8.5.5. Sutarties 4.2.7 punkte nurodytas pažymas;

8.5.5. protokolus ir aktus (Užsakovo patvirtintos formos) (jeigu jų rengimas numatytas Pirkimo sąlygose);

8.5.6. tinkamai užpildytą statybos darbų žurnalą;

8.5.7. geodezinę nuotrauką, kadastro bylas (jeigu jų rengimas numatytas Pirkimo sąlygose);

8.5.8. Rangovas taip pat turi pateikti Užsakovui tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, fakais, elektroninio pašto adresais.

8.6. Pateikiama dokumentacija turi būti sukomplektuota byloje ir sutvarkyta pagal turinį, o visos naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

9. Subrangovai:

9.1. Per 5 darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios Rangovas privalo raštu pranešti, jam žinomų ir su Užsakovu suderintų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus (taikoma tuo atveju, jeigu ir kiek tokia informacija nebuvo pateikta Pasiūlyme). Rangovas privalo iš anksto informuoti apie subrangovų ir jų kontaktinės informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.

9.2. Rangovas, laikydamasis Sutarties 9.6-9.7 punktuose nustatytų tvarkos ir sąlygų, privalo iš anksto informuoti ir su Užsakovu suderinti naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti Sutarties vykdymo eigoje.

9.3. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus Rangovo patirčiai, profesinei kvalifikacijai ar profesinei patirčiai, rėmėsi Pasiūlyme nurodytų subrangovų pajėgumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jų turimų pajėgumų, privalo vykdyti šie subrangovai.

9.4. Pasiūlyme nurodyti šie subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: UAB „Toporanga“, UAB „Hidroterra“.

9.5. Pasiūlyme nurodyti šie subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: UAB „Požeminės jungtys“, UAB „Dekra“, UAB „Šakių hidrotechnika“, VŠĮ Technikos priežiūros tarnyba, UAB „Vitrass“.

9.6. Norėdamas pakeisti esamą subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sąlygose nustatyti

kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimą kuriems Rangovas grindė savo turima kvalifikacija, Rangovas privalo tam iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti Užsakovo sutikimą raštu. Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius tai, kad:

(i) norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie nustatyti);

(ii) egzistuoja šiame punkte nurodytos objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą subrangovą arba pasitelkti naują subrangovą. Pakeisti esamą subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi dalyvaudamas Pirkime, kitu ir pasamdyti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose yra nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimą kuriems Rangovas grindė savo turima kvalifikacija, Rangovas gali tik, kai to reikia dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip: netinkamas subrangovo Darbų vykdymas, dėl ko Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali būti pritaikyta atsakomybė; atsisakymas vykdyti subrangovo įsipareigojimus, susijusius su Darbų vykdymu, arba netinkamas jų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus dėl Darbų kokybės ir (ar) atlikimo terminų; subrangovo nemokumas, bankrotas ar restruktūrizacija; pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams; siekiant išvengti Sutarties pratęsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (*jeigu tokia galimybė Sutartyje numatyta*), dėl valstybės ir savivaldybės institucijų įstaigų ar organizacijų, ar kitų subjektų privalomų reikalavimų, pateiktų Darbų vykdymo ir (ar) jų pridavimo metu, ir pan.;

(iii) nėra norimo pasitelkti subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu subrangovo, kurio pašalinimo pagrindų nebuvimas buvo tikrinamas, padėtis atitinka bent vieną Pirkimo sąlygose nustatytą (jeigu nustatyta) pašalinimo pagrindą, toks subrangovas per Užsakovo nustatytą terminą turi būti pakeistas reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Pašalinimo pagrindų nebuvimas tikrinamas tuo atveju, jeigu tai numatyta Pirkimo sąlygose.

9.7. Norėdamas pakeisti esamą subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, arba pasitelkti naują papildomą subrangovą, Rangovas privalo iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti jo išankstinį sutikimą raštu.

9.8. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą subrangovą ar pasitelkti naują subrangovą bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas (jo darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisės aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą. Užsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ketinamas pasitelkti subrangovas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą.

9.9. Jeigu nustatoma, kad subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną nustatytą (jeigu nustatyta) pašalinimo pagrindą, Užsakovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu taip pat turi teisę reikalauti, kad Rangovas tokį subrangovą pakeistų reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

9.10. Užsakovui davus raštišką sutikimą, subrangovų papildymas ar pakeitimas nėra forminami atskiru Šalių raštišku susitarimu.

9.11. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

10. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:

10.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

10.2. Vienai iš Šalių, nevykdant ar netinkamai vykdant šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, antroji Šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, prieš tai įspėjus Sutarties nevykdančią Šalį raštu ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų.

10.3. Užsakovui laiku neapmokėjus už tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali skaičiuoti delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokėtos sumos. Šalys susitaria, kad šiame punkte numatyta atsakomybė Užsakovui netaikoma tuo atveju, jeigu Užsakovas apmoka Rangovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dėl aplinkybių, susijusių su Rangovu (pvz. dėl Rangovui pritaikytų, tačiau vėliau perskaičiuotu delspinigių (juos sumažinant)).

10.4. Jei Rangovas nesavalaikiai vykdo šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį pagal Grafiką, Rangovas privalo mokėti Užsakovui po 0,05 procento nuo neatliktų Darbų dalies vertės (be PVM) už kiekvieną vėluojamą dieną iki prievolės įvykdymo dienos. Nesant galimybių nustatyti įsipareigojimų vertę, delspinigių dydis atitinkamai nustatomas po 400 Eur dienai.

10.5. Jeigu Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų (jų darbuotojai) atlieka Darbus neturėdamas tam reikalingos kvalifikacijos ir (ar) teisės vykdyti atitinkamą veiklą, arba jei Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų (jų darbuotojai) atliekant Darbus neturėjo 4.2.3 punkte nurodyto Užsakovo Sutikimo (jo negavus, pasibaigus Sutikimo galiojimui, Užsakovui panaikinus ar sustabdžius Sutikimo galiojimą ar pan.), ar jeigu Užsakovas panaikina ar sustabdo minimame punkte nurodyto Sutikimo galiojimą dėl to, kad Rangovas ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų nesilaikė Sutikime nurodytų sąlygų (Darbus atliko nekvalifikuoti, išduotame Sutikime nenurodyti darbuotojai, Darbus atliekantys darbuotojai nedėvėjo asmeninių apsaugos priemonių ir pan.), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 3.000 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės vykdyti Darbus neturint tam reikalingos kvalifikacijos ir (ar) teisės vykdyti atitinkamą veiklą, ir (ar) galiojančio Sutikimo.

10.6. Jei Rangovas pasamdo naują (papildomą) arba pakeičia savo paraiškoje ir/ar Pasiūlyme nurodytą specialistą be išankstinio Užsakovo raštiško sutikimo, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu specialistu ir Užsakovui sumokėti 3.000 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Sutarties 4.2.9 punkte įtvirtintos specialistų pakeitimo procedūros.

10.7. Jei Rangovas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytos subrangovų keitimo ir (ar) naujų samdymo (papildymo) tvarkos, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu subrangovu ir Užsakovui sumokėti 3.000 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus 9 punkte įtvirtintos subrangovų papildymo ar pakeitimo procedūros.

10.8. Šalys Sutartį gali nutraukti Šalių susitarimu, šioje Sutartyje arba įstatymų nustatytais atvejais.

10.9. Šalys susitaria, kad jei Sutartis vienašališkai Užsakovo nutraukiama dėl Rangovo padaryto esminio šios Sutarties pažeidimo, ar dėl bet kokių aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas, Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų Kainos dydžio baudą ir atlygina visus nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda.

10.10. Šalys patvirtina, kad Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai), neatsižvelgiant į tai, kuriame Sutarties punkte jos yra įtvirtintos, yra laikomos iš anksto aptartais minimaliais Užsakovo nuostoliais ir yra proporcingos Sutarties pažeidimams.

10.11. Šalis gali nutraukti Sutartį, jeigu iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos iš konkrečių aplinkybių matyti, kad kita Šalis pažeis Sutartį iš esmės. Tokiu atveju ji turi teisę iš pastarosios Šalies pareikalauti patvirtinimo, kad ši Sutartį įvykdys pilnutinai ir tinkamai. Šalis gali sustabdyti savo sutartinių prievolių vykdymą tol, kol kita Sutarties Šalis patvirtina, kad ji Sutartį tikrai įvykdys tinkamai.

10.12. Bet kuri Šalis turi teisę nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis padaro esminį Sutarties pažeidimą ir jo nepašalina per nukentėjusios (Sutartį nutraukiančios) Šalies raštiškame pranešime nurodytą protingą terminą, kuris

visais atvejais turi būti ne trumpesnis nei 30 (trisdešimt) dienų, skaičiuojamų nuo tos dienos, kurią kita (Sutartį pažeidžianti) Šalis gauna nukentėjusios Šalies raštišką pranešimą.

10.13. Laikoma, kad **Rangovas padarė esminį sutarties pažeidimą**, jeigu (neapsiribojant):

10.13.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neužtikrina jų kokybės ir per Užsakovo nurodytą protingą terminą neištaiso Darbų kokybės trūkumų;

10.13.2. Užsakovas dėl Sutartyje, įskaitant Grafiką, nustatytų Darbų atlikimo terminų nesilaikymo turi pagrįstą pagrindą manyti, kad Rangovas negalės užbaigti Darbų Sutartyje nustatytu laiku;

10.13.3. Rangovas pažeidė dujotiekį ir / ar sukėlė kitų nuostolių Užsakovui ir jų per Užsakovo nurodytą protingą terminą neatlygino;

10.13.4. pakartotinai nustatomi Sutarties 4.2.3, 4.2.9 ir (ar) 9 punktų pažeidimai, dėl kurių Rangovui buvo taikyta Sutarties 10.5-10.7 punktuose numatyta atsakomybė ir (ar) jis buvo įspėtas raštu;

10.13.5. Rangovas Sutarties 5 punkte nustatytu laiku nepateikia minimame punkte nurodytų draudimo sutarčių ir Užsakovas nepasinaudoja teise sudaryti Projektų rengėjo (projektuotojo) civilinės atsakomybės, Rangovo civilinės atsakomybės ir (ar) Darbų draudimo sutartis Rangovo vardu bei patirtas išlaidas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, bei pareikalauti Rangovo sumokėti Užsakovui 5.3 punkte nurodytą baudą bei nuostolius.

10.13.6. Laiku nemokamos draudimo įmokos pagal Sutarties 5 punkte numatytas draudimo sutartis, arba neužtikrinamas šių draudimo sutarčių nepertraukiamas galiojimas visu joms nustatytu laikotarpiu;

10.13.7. Rangovas pažeidžia kitus savo įsipareigojimus ir toks atitinkamas pažeidimas kitose Sutarties nuostatose aiškiai įvardijamas kaip Rangovo esminis Sutarties pažeidimas;

10.13.8. Rangovas padarė kitą esminį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo pažeidimą, dėl kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis arba negalimas.

10.14. Užsakovas turi teisę nesikreipdamas į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai bet kuriuo metu raštu įspėjęs Rangovą ir nesuteikdamas Rangovui jokių papildomų terminų Sutarties nutraukimo pagrindą sudarančių aplinkybių pašalinimui, jeigu yra nors vienas iš žemiau nurodytų pagrindų:

10.14.1. Rangovas tampa nemokus;

10.14.2. Rangovui iškelta bankroto byla arba pradedamas Rangovo bankroto procesas ne teismo tvarka;

10.14.3. Rangovui iškeliama restruktūrizavimo byla;

10.14.4. yra priimtas sprendimas likviduoti Rangovą (tiek savanoriškai, tiek priverstine tvarka);

10.14.5. Rangovas raštu pripažįsta Užsakovui ir/ar kitiems asmenims ar kitaip viešai paskelbia (i) apie negalėjimą padengti savo esamų įsiskolinimų arba susimokėti būsimų mokėjimų arba (ii) apie Rangovo nemokumą;

10.14.6. paaiškėja aplinkybės, leidžiančios Užsakovui pagrįstai manyti, kad Rangovas tinkamai nevykdys Sutartyje numatytų įsipareigojimų (kaip antai, Rangovas nevykdo savo finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko Rangovo atžvilgiu atitinkamas poveikio priemones, kuriomis atimamos arba iš esmės suvaržomos Rangovo teisės, susijusios su Darbų vykdymu).

10.15. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol Darbai yra nebaigti, prieš 14 dienų raštiškai įspėjęs Rangovą, atsisakyti Sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už iki pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos atliktų Darbų dalį ir atlygindamas tiesioginius ir objektyviais įrodymais pagrįstus nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo.

10.16. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Rangovą ne vėliau nei prieš 30 kalendorinių dienų PJ 98 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

10.17. Laikoma, kad Užsakovas padarė esminį Sutarties pažeidimą, jeigu (neapsiribojant), jis vėluoja atlikti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus už Darbus daugiau nei 90 dienų. Šalys

susitaria, kad šio punkto nuostatos netaikomos tuo atveju, jeigu Užsakovas apmoka Rangovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras nesilaikydamos Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dėl aplinkybių, susijusių su Rangovu (pvz. dėl Rangovui pritaikytų, tačiau vėliau perskaičiuotų delspinigių (juos sumažinant));

10.18. Jei Užsakovas Sutarties galiojimo metu, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliama bankroto byla, Rangovas gali, prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštiškai pranešęs Užsakovui, nutraukti šią Sutartį bei reikalauti iš Užsakovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

10.19. Sutarties nutraukimas atleidžia abi Šalis nuo Sutarties vykdymo, tačiau nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.

10.20. Šalis, vengianti mokėti pagal šią Sutartį (įskaitant delspinigių ir/ar baudų mokėjimą), privalo atlyginti kitai Šaliai visas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) išlaidas teisei pagalbai (advokatams) apmokėti ir teismo išlaidas.

10.21. Atskiri atsakomybės už Sutarties pažeidimą atvejai taip pat yra numatyti ir kituose Sutarties punktuose.

10.22. Šioje Sutartyje numatyta atsakomybė už Sutarties pažeidimus Rangovui gali būti netaikoma, jeigu Rangovas nėra atsakingas už šiuos pažeidimus nulėmusias priežastis ir jų negalėjo kontroliuoti (pvz., dėl Užsakovo veiksmų, trečiojo asmens veiksmų, valstybės veiksmų ir kt.).

10.23. Be šios Sutarties 10.22 punkte nurodytų atvejų Sutartyje numatyta atsakomybė Rangovui taip pat gali būti netaikoma atsižvelgiant į Rangovo pastangas siekiant šių pažeidimų išvengti, juos ištaisyti kaip įmanoma greičiau, laiku įvykdytų įsipareigojimų dalį, pažeidimus sukėlusias priežastis, Rangovo elgesį (Sutarties pažeidimų skaičių Sutarties vykdymo metu, jų kartotinumą), pažeidimų sukeltas ar potencialiai galinčias kilti teises pasekmes ir pan.

11. Nenugalima jėga:

11.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

11.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiama nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviejų) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

12. Bendrosios sąlygos:

12.1. Ši Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys ją pasirašo bei Rangovas pateikia Užsakovui šios Sutarties sąlygas atitinkantį sutarties įvykdymo užtikrinimą (*jeigu reikalaujama*). Sutartis galioja iki pilno Šalių įsipareigojimų įvykdymo. Pasibaigus Sutarties terminui lieka galioti Šalių įsipareigojimai, kurių galiojimas pagal savo esmę turi tęstis (konfidencialumo pareigos, intelektinės nuosavybės teisės ir pan.).

12.2. Vienos iš Sutarties sąlygų negaliojimo nedaro negaliojančios visos Sutarties, išskyrus atvejus, kuriais Šalys be tos sąlygos nebūtų sudariusios Sutarties.

12.3. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų Šalių pasirašyti.

12.4. Iškilusius nesutarimus ir ginčus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties sudarymui, galiojimui, aiškinimui, vykdymui, nevykdymo padariniams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių ir anglų (*anglų kalba, jei reikalinga*) kalbomis ir yra saugoma ją pasirašiusių Šalių. Jei Sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalba, angliškas šios Sutarties variantas parengtas remiantis lietuvišku variantu. Jei lietuviškas ir angliškas variantai nesutaptų, pirmenybė būtų teikiama lietuviškam tekstui.

12.6. Šalys paskiria savo atstovus, atsakingus už Sutarties vykdymą, kurie neturi teisės keisti ir (ar) pildyti Sutarties sąlygų, Užsakovo atstovas taip pat atsakingas už tai, kad Sutarties ir jos pakeitimai būtų paskelbti PJ nustatyta tvarka:

Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas):	
Rangovo paskirtas atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas):	

Šalys turi teisę pakeisti Sutartį dalyje dėl atstovų, atsakingų už Sutarties vykdymą, pakeitimą kitais atstovais informuodamos vieną kitą Sutarties 12.7 punkte nustatyta tvarka.

12.7. Šalys įsipareigoja pasikeitus Šalies pavadinimui, registracijos ar buveinės adresams, pranešimų siuntimo adresui, elektroninio pašto adresui, telefono ir fakso numeriams, banko rekvizitams bei teisinės registracijos duomenims, apie tai nedelsiant raštu informuoti kitą šalį. Nesant tokio pranešimo, visi dokumentai ar pranešimai vykdant šią Sutartį siunčiami (arba pristatomi) paskutiniu žinomu Šalies adresu ir laikomi įteiktai tinkamai.

12.8. Visi vykdant šią Sutartį Užsakovo Rangovui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip pat šios Sutarties pagrindu Rangovo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra konfidencialūs (toliau – konfidenciali informacija). Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja laikyti konfidencialią informaciją paslapyje ir be išankstinio rašytinio atitinkamo Užsakovo sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims jokia forma ir būdu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus privalomo informacijos teikimo atvejus. Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja nenaudoti konfidencialios informacijos bet koku būdu, dėl kurio Užsakovas gali būti padaryta žala / atsirasti nuostolių. Šiame punkte įtvirtintos pareigos Rangovas privalo laikytis 10 metų pradedamus skaičiuoti nuo Darbų perdavimo Užsakovui dienos.

12.9. Užsakovui pageidaujant, Šalys pasirašo atskirą rašytinį susitarimą dėl konfidencialios informacijos pagal Užsakovo pateiktą formą (taikoma, jeigu tai numatyta Pirkimo sąlygose).

12.10. Šalys sutaria ir patvirtina, kad Šalys, vykdant šią Sutartį, bendradarbiaus lietuvių kalba. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Užsakovui būtų lietuvių kalba, o komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas.

12.11. Šalys susitaria, kad be PJ 97 straipsnyje įtvirtintų atvejų, Rangovas gali būti pakeistas nauja Sutarties šalimi teisės aktų nustatyta tvarka pasikeitus Rangovo (pradinės Sutarties Šalies) juridiniam statusui ir (ar) atskyrus dalį jo funkcijų ir jas perleidus trečiajam asmeniui, jeigu naujai Sutarties šaliai pereina visos iš Sutarties kylančios Rangovo teisės ir pareigos ir, jeigu toks Rangovo (pradinės Sutarties Šalies) pakeitimas nelemia kitų esminių sutarties pakeitimų bei taip nesiekama išvengti PJ taikymo, taip pat jeigu su tokiu Sutarties Šalies pakeitimu sutinka Užsakovas. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki planuojamo teisių ir pareigų perėmimo momento apie tai raštu

informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo (naujos Sutarties šalies) profesinę kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą patvirtinančius dokumentus, taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų (tuo atveju, jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti Pirkimo sąlygose, Sutartyje ar teisės aktuose). Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas (nauja Sutarties šalis) privalo turėti ne mažesnę profesinę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją, ją vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo sąlygose (jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti). Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais būtiniais dokumentais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Rangovo pakeitimui nauja Sutarties šalimi. Susitarimas pakeisti Šalį įforminamas Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka.

13. Sutarties priedai:

13.1. A priedas, sutarties objekto ir jo dedamųjų kainos – 2 lapai.

13.2. B priedas, Techninė specifikacija – 10 lapų.

13.3. C priedas, Darbų vykdymo grafikas (po to, kai jis yra parengiamas Sutartyje nustatyta tvarka) – 1 lapas.

13.4. D priedas, subrangovų sąrašas (tuo atveju, jeigu jis yra pateikiamas pagal Sutarties 9.1 punkto nuostatas) – 1 lapas.

13.4. E priedas, Pasiūlymas – 6 lapai.

13.5. F priedas, Pirkimo sąlygos ir klausimai-atsakymai pateikti CVP IS pirkimo metu– 60 lapų.

14. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

14.1. Užsakovo: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. +370 5 236 0855, faks. +370 5 236 0850, el. p.: info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

14.2. Rangovo: Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius, tel. (8 5) 285 5236, el. p. info@ds-1.lt, www.ds-1.lt, įmonės kodas 181123848, PVM mokėtojo kodas LT811238412, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT49 7044 0600 0818 2330, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“


Technikos direktorius
Andrius Dagys



Rangovas:

UAB „DS-1“

Direktorius
Vyktas Belickas

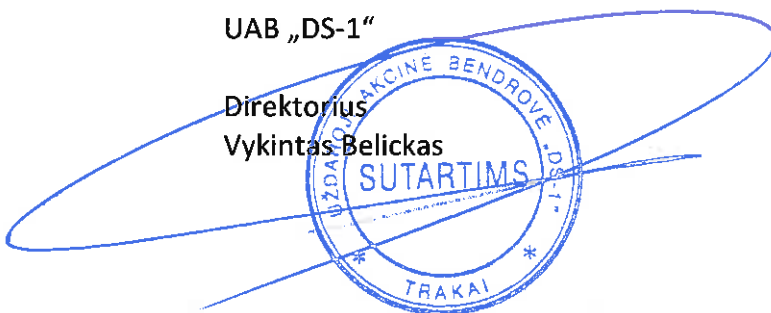

SUTARTIES OBJEKTO IR JO DEDAMŲJŲ KAINOS

Eil. Nr.	Darbu/išlaidų pavadinimas	Kaina (Eur be PVM)
	MD Vilnius – Kaunas, MD Kaunas - Šakiai ir MD atšakoje į Alytaus DSS antžeminių dujotiekio perėjų pakeitimo požeminėmis darbais, iš jų:	588.040,00
1	MD Vilnius – Kaunas DN700 antžeminės perėjos per geležinkelį PK 2+40 pakeitimo požemine darbais (viso), iš jų:	341.680,00
1.1	Kapitalinio remonto projekto (etapas - techninis darbo projektas) parengimas	31.000,00
1.2	Kapitalinio remonto darbai (viso), iš jų:	310.680,00
1.2.1	Medžiagų ir įrangos tiekimas	118.500,00
1.2.2	Bendrieji statybos darbai: žemės darbai - iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo sistemoms atstatyti/įrengti (jei reikia); kiti panašaus profilio darbai	63.500,00
1.2.3	Dujų technologinės įrangos, vamzdyno demontavimo-montavimo, bandymo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai	76.300,00
1.2.4	Dujotiekio perizoliavimas	17.000,00
1.2.5	Geodezinės nuotraukos parengimas	480,00
1.2.6	Kadastro paslaugos pagal Techninės specifikacijos p. 3.3.8 (atitinkamos MD kadastro bylos tikslinimas ir vertės perskaičiavimas)	2.000,00
1.2.7	Kadastro paslaugos pagal Techninės specifikacijos p. 1.8.1 (preliminarus sklypų skaičius – 6 vnt.)*	2.800,00
1.2.8	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai	30.100,00
1.2.9	Kiti darbai (juos nurodant)	0,00
2	MD Kaunas - Šakiai DN500 antžeminės perėjos per kanalą PK 1219+95 pakeitimo požemine darbais (viso), iš jų:	124.480,00
2.1	Kapitalinio remonto projekto (etapas - techninis darbo projektas) parengimas	17.300,00
2.2	Kapitalinio remonto darbai (viso), iš jų:	107.180,00
2.2.1	Medžiagų ir įrangos tiekimas	27.200,00
2.2.2	Bendrieji statybos darbai: žemės darbai - iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo sistemoms atstatyti/įrengti (jei reikia); kiti panašaus profilio darbai	28.700,00
2.2.3	Dujų technologinės įrangos, vamzdyno demontavimo-montavimo, bandymo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai	21.000,00
2.2.4	Dujotiekio perizoliavimas	9.000,00
2.2.5	Geodezinės nuotraukos parengimas	480,00
2.2.6	Kadastro paslaugos pagal Techninės specifikacijos p. 3.3.8 (MD kadastro bylos tikslinimas ir vertės perskaičiavimas)	1.800,00
2.2.7	Kadastro paslaugos pagal Techninės specifikacijos p. 1.8.1 (preliminarus sklypų skaičius – 2 vnt.)*	1.000,00
2.2.8	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai	18.000,00
2.2.9	Kiti darbai (juos nurodant)	0,00
3	MD atšakoje į Alytaus DSS DN400 antžeminės perėjos per kanalą PK 58+80 pakeitimo požemine darbais (viso), iš jų:	121.880,00
3.1	Kapitalinio remonto projekto (etapas - techninis darbo projektas) parengimas	17.300,00
3.2	Kapitalinio remonto darbai (viso), iš jų:	104.580,00
3.2.1	Medžiagų ir įrangos tiekimas	26.700,00

Eil. Nr.	Darbu/išlaidų pavadinimas	Kaina (Eur be PVM)
3.2.2	Bendrieji statybos darbai: žemės darbai - iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo sistemoms atstatyti/jrengti (jei reikia); kiti panašaus profilio darbai	28.500,00
3.2.3	Dujų technologinės įrangos, vamzdyno demontavimo-montavimo, bandymo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai	19.800,00
3.2.4	Dujotiekio perizoliavimas	8.500,00
3.2.5	Geodezinės nuotraukos parengimas	480,00
3.2.6	Kadastro paslaugos pagal Techninės specifikacijos p. 3.3.8 (MD kadastro bylos tikslinimas ir vertės perskaičiavimas)	1.800,00
3.2.7	Kadastro paslaugos pagal Techninės specifikacijos p. 1.8.1 (preliminarus sklypų skaičius – 2 vnt.)*	1.000,00
3.2.8	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai	17.800,00
3.2.9	Kiti darbai (juos nurodant)	0,00
Iš viso be PVM		588.040,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%		123.488,40
Iš viso su PVM		711.528,40

Užsakovas:

AB „Amber Grid“


Technikos direktorius
Andrius Dagys



Rangovas:

UAB „DS-1“

Direktorius
Vyktas Belickas

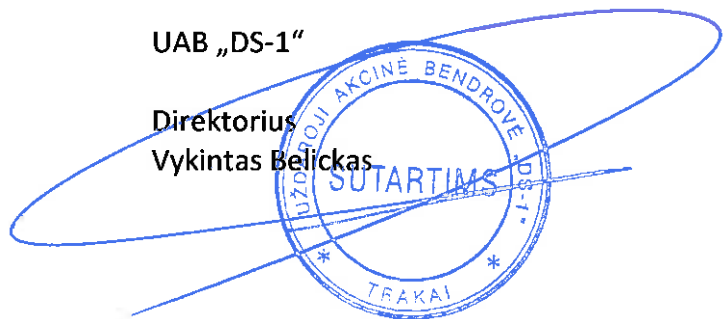

**ANTŽEMINIŲ MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO PERĖJŲ (3 VNT.) PAKEITIMO POŽEMINĖMIS DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms:

1.1. Magistralinio dujotiekio (toliau – **MD**) atšakos į Alytaus DSS DN400 orinio perėjimo per kanalą X:519398,32; Y:6075154,80; PK58+80, MD Kaunas - Šakiai DN500 orinio perėjimo per kanalą X:476137,01; Y:6091774,91; PK1219+95 ir MD Vilnius-Kaunas DN700 orinio perėjimo per geležinkelį X:572653,33; Y:6058853,79; PK2+40 (esamų orinių perėjimų foto fiksacijos pridedamos) perklojimo į požemines perėjas kapitalinio remonto projektai (etapas - techniniai darbo projektai) (toliau – **Projektai**) turi būti rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, statybos techninių reglamentų, Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 (2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-169 redakcija), Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1-213, Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 nuostatomis ir kitų teisės aktų reikalavimais. Visi Projektų sprendiniai privalo būti suderinti su Turto valdymo departamento atitinkamais padaliniais, Eksploatavimo departamento atitinkamais padaliniais, Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriumi, Informacinių technologijų skyriumi, bei kitais AB „Amber Grid“ padaliniais, jei yra reikalinga.

1.2. MD atšakos į Alytaus DSS DN400 orinio perėjimo per kanalą X:519398,32; Y:6075154,80; PK58+80, MD Kaunas - Šakiai DN500 orinio perėjimo per kanalą X:476137,01; Y:6091774,91; PK1219+95 ir MD Vilnius-Kaunas DN700 orinio perėjimo per geležinkelį X:572653,33; Y:6058853,79; PK2+40 perklojimo į požemines perėjas Projektų parengimo paslaugos (mažiausiai į atitinkamos MD atšakos Projekto sudėtį turi būti įtrauktos šios pagrindinės dalys: bendroji, dujotiekio, aktyviosios ir pasyviosios apsaugos nuo korozijos) taip pat visi papildomi darbai ir su jais susijusios paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja projektavimo ir (ar) darbų vykdymo eigoje.

1.3. Parengimas ir gavimas visų privalomų dokumentų Projektams rengti.

1.4. Parengimas ir organizavimas sutarčių pasirašymo su žemių savininkais, patikėtiniais ir kitais žemės valdytojais (jeigu reikalinga) dėl statybviečių laikino naudojimo darbų.

1.5. Parengimas, suderinimas su Užsakovu ir reikiamomis institucijomis bei pateikimas tvirtinimui Projektų lietuvių kalba (pilnos apimties, popierinė versija ne mažiau kaip 3 egz. ir elektroninė versija, įrašyta į informacijos laikmeną (CD arba USB atmintinę „doc“, „dwg“, „pdf“, „vsd“ su Projektų rengėjų ir kt. failų formatais)).

1.6. Reikiamų pakeitimų Projektuose atlikimas statybos darbų metu.

1.7. Visų reikalingų paslaugoms teikti ir tinkamai jas užbaigti sutikimų ar leidimų gavimas.

1.8. **Projektuose turi būti numatyta:**

1.8.1. Rangovas, su Užsakovu suderintų technologinių schemų pagrindu, ne vėliau kaip 30 dienų iki atitinkamo Projekto patvirtinimo, turi parengti žemės sklypų planus, skirtus nustatyti servitutus ir (ar) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, vienkartinės ar periodinės kompensacijos apskaičiavimo aktus, žemės sklypų kadastro duomenų formas.

1.8.2. Rangovas visas tiekiamos įrangos ir medžiagų pakuotes (medinius padėklus, polietileninės pakuotės, maišus ir t.t.) išveža į specialiai tam skirtas utilizavimo vietas pagal jo sudarytą sutartį su atliekas tvarkančia ir transportuojančia utilizavimo įmone.

1.8.3. MD atšakos į Alytaus DSS DN400 orinio perėjimo per kanalą PK58+80; MD Kaunas - Šakiai DN500 orinio perėjimo per kanalą PK1219+95; MD Vilnius-Kaunas DN700 orinio perėjimo per geležinkelį PK2+40 perklojimą į požeminius perėjimus, išlaikant minimalų LR teisės aktais reglamentuojamą dujotiekio įgilinimą.

1.8.4. Projektuose privalo būti išnagrinėti ir atlikti skaičiavimai dėl perklojimo būdo parinkimo, t. y. turi būti įvertintas ir parinktas labiausiai techniškai ir ekonomiškai pagrįstas būdas (MD Vilnius-Kaunas DN700 orinio perėjimo per geležinkelį PK2+40 perklojimo darbams prioritetą skirti uždaram būdui, MD atšakos į Alytaus DSS DN400 orinio perėjimo per kanalą PK58+80 ir MD Kaunas - Šakiai DN500 orinio perėjimo per kanalą PK1219+95 perklojimo darbams prioritetą skirti atviram būdui).

1.8.5. Minėtų MD kreivės turi būti suprojektuotos taip, kad būtų galimybė atlikti šių MD vidinę diagnostiką.

1.8.6. *Reikalavimai aktyviosios apsaugos nuo korozijos sistemos įrenginių projektavimui:*

1.8.6.1. Kontrolės matavimo kolonėlę (toliau – KMK) projektuoti abejose geležinkelio pusėse. Projektuojamos KMK stulpelis plastikinis, RAL 1021 su greito aptarnavimo langeliu.

1.8.6.2. KMK (T23 tipo) suprojektuoti dirbamose žemėse turi būti apsaugoti nuo mechaninio agrotechnikos poveikio.

1.8.6.3. suprojektuotose KMK numatyti sprendinius, kurie leistų atlikti matavimus ir šaltuoju metų sezonu (numatyti aplinkos poveikiui atsparius vamzdžius, įrengiant juos įšalo zonos gylyje).

1.8.6.4. kabelių izoliacija turi atitikti reikalavimus keliamus kabeliams klojamiems grunte. Atskirais atvejais turi būti įvertintas aplinkos agresyvumas.

1.8.6.5. parenkant kabelių laidininkų skersmenį turi būti vertinamas galimas įtampos kritimas, mechaninis atsparumas.

1.8.6.6. katodinės apsaugos kabelių laidininkų skersmuo turi būti ne mažesnis: $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ arba $4 \times 2.5 \text{ mm}^2$ (nuo KMK iki dujotiekio).

1.8.6.7. kabelių prijungimas prie konstrukcijos projektuojamas neardomuoju būdu.

1.8.6.8. visi kabeliai ir jų laidininkai brėžiniuose turi turėti adresinę numeraciją ir žymenis. Įrenginių numeracija ir žymenų sudarymo principas turi atitikti UAB „Ardynas“ parengto projekto 2011.47 „Katodinės apsaugos sistemos rekonstrukcijos projektas“ (ištrauka pridedama) sprendinius.


1.8.7. *Reikalavimai pasyviosios apsaugos nuo korozijos sistemos projektavimui:*

1.8.7.1. Katodinės apsaugos kabelių įrengimui suprojektuoti atskirą dėklą (taikoma tik MD Vilnius-Kaunas DN700 oriniam perėjimui).


1.8.7.2. Klojamų vamzdžių išorinė danga turi atitikti standarto LST EN ISO 21809-1:2011 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Požeminių ar povandeninių vamzdžių, naudojamų transportavimo vamzdžiais sistemos, išorinės dangos, 1 dalis. Poliolefino dangos (PE 3 sluoksniai ir PP 3 sluoksniai)“ 3 sluoksnių užliejama didelio tankio (HDPE) sistema, pilnai tinkama naudoti, esant projektinei temperatūrai ir kitoms eksploatavimo sąlygoms pagal dangos klasę B3. Dangos storis parenkamas pagal vamzdžio svorį kg/m. Virintinių siūlių izoliavimui projektuojamos dangos pagal LST EN 10290:2003 „Pakrantės ir povandeninių vamzdžių plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninėmis ir modifikuotomis poliuretaninėmis dervomis“ arba LST EN 10289:2003 „Pakrantės ir povandeninių vamzdžių plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis epoksidinėmis ir modifikuotomis epoksidinėmis dervomis“ standartų aukščiausios mechaninės atsparumo klasės reikalavimus. Atviru būdu klojamų vamzdžių virintinių siūlių izoliavimui gali būti projektuojama temosuslūgstančios izoliacinės dangos sistema, kuri atitinka LST EN 12068 C 50 klasės reikalavimus.

1.8.7.3. Suprojektuoti naujai įrengto ir esamo dujotiekio izoliacinių dangų sujungimui suderinamas dangas. Suprojektuoti šio projekto apimtyje dujotiekio izoliacinės dangos remontą, t. y. suprojektuoti dujotiekio perizoliavimą nuo garantinių siūlių iki flanšinių atvamzdžių, skirtų laikinojo sandarinimo

balionams sumontuoti, ir 2-3 m už flanšinių atvamzdžių. Jei Rangovas, dėl darbų paprastesnio atlikimo (pvz. vamzdžio „suvedimo“), atkas daugiau nei nurodytas perizoliuojamas atstumas, turės perizoliuoti visą atkastą vamzdyno ilgį. Principinė perizoliavimo schema:

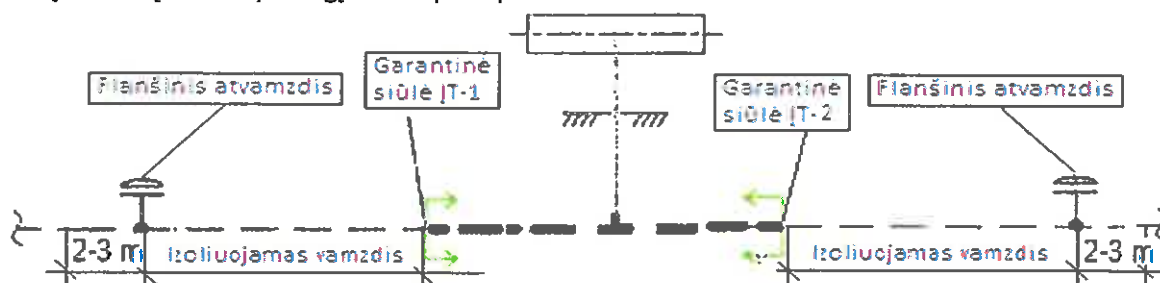

1.8.7.4. Specialių flanšinių atvamzdžių, laikiniams sandarinimo balionams, izoliavimas. Privirinto atvamzdžio izoliavimui projektuoti PUR dangą pagal standarto LST EN 10290:2003 B3 klasės arba lygiavėčio standarto reikalavimus. Pageidaujama izoliavimo schema:

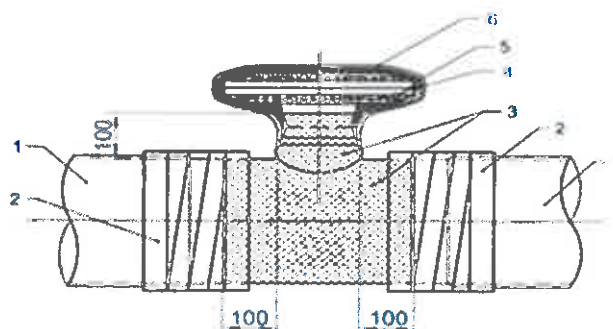

Pastaba:

1. Izoliacinių juostų sistema turi persidengti ne mažiau 50 mm su PUR ir esama dujotiekio izoliacine danga.
2. Izoliavimo zonos nelygumai užpildomi padengiant butilo mastika.

Poz. Nr.	Pavadinimas
1	Magistralinis dujotiekis padengtas esama izoliacine danga
2	Izoliacinės dangos sistema pagal LST EN 12068:2001 C 50 klasės arba lygiavėčio standarto reikalavimus
3	PUR danga pagal LST EN 10290:2003 B3 klasės arba lygiavėčio standarto reikalavimus
4	Mastika petrolatum
5	Juosta petrolatum (1 sluoksnis)
6	Juosta PE (2 sluoksnis)

1.8.7.5. Suprojektuoti visą dujotiekio atkarpą užpilti vietiniu buriu gruntu. Detalizuoti užpilamo grunto charakteristikas, nurodant leistinas maksimalias kietųjų dalelių frakcijas. Numatyti priemonės riedulių atskyrimui iš vietinio grunto.

1.8.8. Parengti darbui skirtus dokumentus, sprendinius išskiriant į dvi dalis: Aktyvioji ir Pasyvioji apsauga nuo korozijos. Projektų apimtyje turi būti:

- 1.8.8.1. Aiškinamasis raštas;
- 1.8.8.2. Medžiagų techninės specifikacijos;
- 1.8.8.3. Projektuojamų darbų techninės specifikacijos;
- 1.8.8.4. Sąnaudų žiniaraščiai ir preliminaros sąmatos;
- 1.8.8.5. Sistemos principinės schemas;
- 1.8.8.6. Detalūs darbų brėžiniai apimantys kiekvieną aktyviosios ir pasyviosios apsaugos nuo korozijos sistemos elemento įrengimą;
- 1.8.8.7. Atliktų darbų kokybės tikrinimo procedūros, vertinimo kriterijai;
- 1.8.8.8. Statybos paso formos;

1.8.8.9. Saugos nuo korozijos sistemos įrenginių situacijos planai (mastelis 1:500).

1.8.9. Visi Projektuose pateikti sprendiniai turi būti logiški, techniškai ir ekonomiškai pagrįsti.

2. Techniniai reikalavimai medžiagoms:

2.1. Techniniai reikalavimai plieniniams izoliuotiems vamzdžiams:

2.1.1. Požeminiam klojimui skirti vamzdžiai turi būti padengti antikorozyne danga, maksimalus darbinis slėgis – 54 barai.

2.1.2. Vamzdžio galai negali būti padengti klijų sluoksniu. Neizoliuoti vamzdžių galai turi būti ne ilgesni kaip 150 mm. Vamzdžio galuose PE danga nusklembta kampu neviršijančiu 30 laipsnių matuojant vamzdžio ašies kryptimi. Papildomai, kartu su bandymais, kurių reikalauja DIN 30670, turi būti patikrintas kiekvieno vamzdžio dangos porėtumas. Dangos gamintojas turi pateikti dangos taisymo ir pataisytos dangos bandymų procedūrų aprašą.

2.1.3. Plieninių vamzdžių techninės charakteristikos, turi atitikti arba viršyti norminio dokumento ISO 3183 reikalavimus. Vamzdžiai turi būti tinkami gamtinių dujų transportavimui. Vamzdžiai turi būti tinkami naudojimui esant žemiausiai projektinei temperatūrai -20 °C. Vamzdžiai turi būti tokie, kad juos būtų galima suvirinti lankiniu būdu, naudojant įprastinius elektrodus ir įrenginius, tinkamus virinti lauko sąlygomis. Vamzdžiai turi būti tinkami alkūnių formavimui lenkiant vamzdį šaltu būdu specialių įrenginių pagalba.

2.1.4. Vamzdžių gamintojas turi būti įdiegęs savo įmonėje kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO 9001.

2.1.5. Turi būti naudojamas ramaus stingimo pagerintos struktūros plienas. Elektra suvirintas vamzdis turi būti pagamintas iš termomechanškai arba karštai valcuotos juostos šalto formavimo būdu. Suvirinimo sritis turi būti termiškai apdorota po suvirinimo. Elektra suvirintas tiesiasišulės vamzdis turi būti su viena siūle. Vamzdžio vidinis ir išorinis paviršius turi būti glotnus, atitinkantis vamzdžių gamybos būdą. Tiekiami vamzdžiai turi būti be defektų.

2.1.6. Turi būti atlikti plieno stiprumo, smūginio tūsumo, lenkimo ir suplojimo bandymai kaip reikalaujama ISO 3183. Bandinių paruošimo ir išpjovimo metu bandiniai negali būti pakaitinami daugiau negu 100°C. Gamykloje atlikus kiekvieno vamzdžio hidraulinį bandymą, atliekama regimoji patikra bei neardomoji kontrolė. Turi būti apžiūrėtas kiekvieno vamzdžio išorinis paviršius ir vidinis paviršius taip, kaip reikalaujama LST EN 10208-2 9.4.9 skyriuje. Vamzdžio paviršiuje esantys netikslumai ir defektai turi būti suklasifikuoti ir atitinkamai ištaisyti.

2.1.7. Ant kiekvieno vamzdžio galo turi būti šie žymenys:

- a) gamintojo pavadinimas arba žymuo (X);
- b) vamzdžio skersmuo ir sienelės storis milimetrais;
- c) vamzdžių gamybos standarto numeris - ISO 3183;
- d) plieno pavadinimas – L;
- e) vamzdžio tipas (W - siūlinis)/(S - besiūlis);
- f) kokybės inspektoriaus žymuo (Y);
- g) identifikavimo numeris, kuris leidžia daryti sąsają tarp vamzdžio ir atitinkamo tikrinimo dokumento (Z).

2.1.8. Vamzdžiai turi būti pažymėti ilgai išliekančiais dažais pagal ISO 3183.

2.2. Techniniai reikalavimai plieninių vamzdžių polimerinei izoliacijai:

2.2.1. Plieninių vamzdžių polimerinės izoliacijos gamintojas turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus. Vamzdžių izoliacija turi užtikrinti reikiamą apsaugą nuo mechaninio, terminio ir cheminio poveikio, atsirandančio vamzdžių eksploatavimo, pervežimo, saugojimo ir montavimo metu.

3. Techniniai reikalavimai darbams:

3.1. Pagrindiniai projekto įgyvendinimo terminai:

3.1.1. **MD vamzdyno atjungimas ir prijungimas prie esamo veikiančio dujotiekio planuojamas*:**

- 1) **MD Vilnius – Kaunas – 2019.07.18-25** (dujų atjungimas numatytas tik paskutines dvi paras (48 val.), pirmas penkias paras bus vykdomas sistemos išdujinimas);
- 2) **MD Kaunas - Šakiai – 2019.08.01-08** (dujų atjungimas numatytas tik paskutines dvi paras (48 val.), pirmas penkias paras bus vykdomas sistemos išdujinimas);
- 3) **MD į Alytaus DSS – 2019.08.19-23** (dujų atjungimas numatytas tik paskutines dvi paras (48 val.), pirmas dvi paras bus vykdomas sistemos išdujinimas).

* - pasikeitus planuojamam dujų suvartojimui, nurodytas planuojamas MD vamzdyno atjungimo laikas Perkančiojo subjekto vienašališku pranešimu, pateiktu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, gali būti koreguojamas.

3.1.2. Darbų užbaigimo terminas - 2019.10.31.

3.2. Atliekami pagrindiniai darbai:

3.2.1. Bendrastatybiniai darbai.

3.2.2. Žemės darbai.

3.2.3. Augalinio dirvožemio sluoksnio nustūmimo (nesumaišant dirvožemio sluoksnių) ir sandėliavimo darbai.

3.2.4. Žemės iš tranšėjų kasimo ir sandėliavimo darbai.

3.2.5. Medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietyje (jei reikalinga).

3.2.6. Suvirinimo siūlių švietimas, kontrolė ir jų izoliavimo darbai.

3.2.7. Rangovo suvirintų siūlių kokybės tikrinimo negali vykdyti jam pavaldi laboratorija, t. y. siūlių švietimą, tikrinimą gali atlikti tik Rangovui nuosavybės teise nepriklausanti laboratorija.

3.2.8. Dėl nustatytų defektų suvirinimo siūlė negali būti taisoma daugiau kaip du kartus. Tokia siūlė privalo būti išpjauta ir suvirinta iš naujo. Užsakovui nustačius, kad siūlė buvo taisyta daugiau kaip 2 kartus, suvirintojų grandis, virinusi tą siūlę privalo būti nušalinta nuo suvirinimo darbų, visam statybos darbų laikotarpiui. Rangovas privalo užtikrinti, kad nušalinti suvirintojai nebetęstų suvirinimo darbų ir pasitelkti kitus suvirintojus, turinčius reikiamą kvalifikaciją.

3.2.9. Suvirintų ir izoliuotų vamzdynų užpylimo žemėmis darbai.

3.2.10. Specialių flanšinių atvamzdžių, laikiniams sandarinimo balionams, izoliavimas.

3.2.11. Dujotiekio stiprumo ir sandarumo bandymai.

3.2.12. Aplinkos tvarkymo darbai, dujotiekio trasos ženklavimas.

3.2.13. Paskleidžiant augalinį dirvožemio sluoksnį nesumaišyti su kitais dirvožemio sluoksniais.

3.2.14. Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo nufotografuoti ir užfiksuoti esamą privažiavimo kelių, kuriais statybos metu planuojama, kad važinės Rangovo transportas, būklę. Baigęs darbus Rangovas privalo atstatyti privažiavimo kelių būklę, užfiksuotą iki darbų pradžios, iškviešti atstatyto kelio ruožo savininką ir su juo pasirašyti kelio atstatymo į pradinę padėtį aktą.

3.2.15. Laikinus privažiavimus įrengti suderinus su sklypų savininkais, užtikrinant jiems galimybę privažiuoti prie sklypo dalies už iškastos tranšėjos, privažiuoti prie sodybos, praginti gyvulius.

3.2.16. Pažeistų melioracijos ir drenažo sistemų atstatymas (jei taikoma) ir už statybvietyės ribų kompensacijų žemės savininkams išmokėjimas.

3.2.17. Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo nufotografuoti ir užfiksuoti esamus apsemtus (jei tokių yra), drėgnus žemės plotus, kad būtų nustatyta esamos melioracijos-drenažo sistemos būklė.

3.2.18. Rangovas privalo pilnai atsakyti ir padengti nuostolius už sutrikdytą magistralinio dujotiekio darbą ir jo pažeidimus, taip pat magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimus, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovų kaltės.

3.2.19. Mechaniniu būdu dirvos rekultivacijos darbai.

3.3. Visų medžiagų ir įrangos reikalingų darbams atlikti tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas, sandėliavimas, saugojimas ir kt.

3.3.1. Rangovas privalo pašalinti dujų likutį iš vamzdyno po dujų išleidimo, prapučiant dujotiekį inertinėmis dujomis iki pilno dujų išvairo, prižiūrint AB „Amber Grid“ specialistams (dujų išleidimo iki 0 bar operaciją iš dujotiekio prieš vykdant darbus atliks Užsakovas - AB „Amber Grid“). Atlikti dujotiekio vamzdyno atjungimo ir prijungimo prie esamo veikiančio dujotiekio darbus.

3.3.2. Dujotiekio vamzdyno prijungimai prie esamo veikiančio dujotiekio. Prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbus gali vykdyti tik Rangovas (ar jo pasirinktas subrangovas), turintis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatą, leidžiantį vykdyti tokius darbus.

3.3.3. Trasoje demontuojamas senas dujotiekis ir išvežamas į Užsakovo nurodytą vietą.

3.3.4. Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įrengimas.

3.3.5. Geodezinių nuotraukų atlikimas. Dujotiekio išpildomosios geodezinės nuotraukos turi būti atliktos įprastu ir skaitmeniniu variantais, iš kurių pastarasis turi atitikti geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimams arba lygiaverčio. Ne dujotiekio objektų duomenis pateikti skaitmeninėje formoje pagal InGIS specifikaciją (Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacija. II redakcija, patvirtinta Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro bei Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos direktoriaus 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 46/32) ESRI Personal Geodatabase arba ESRI SHP formatu. Esant poreikiui duomenų bazių šablonus užsakovas pateiks atskirai projekto vykdytojui. Užsakovui pateikti skaitmenines bylas iš kurių spausdinami brėžiniai.

3.3.6. Geodezinėje nuotraukoje užkoordinuoti perklo to dujotiekio atkarpos, nurodant izoliuotos atkarpos pradžios ir pabaigos koordinatas.

3.3.7. Projektuose nurodyti, kad esamas magistralinio dujotiekio ryšio kabelis yra neveikiantis. Kabelio geodezinių matavimų nedaryti. Pažeidus kabelį, pažeistą ruožą demontuoti, aklių arba movų nemontuoti.

3.3.8. Rangovas ar jo pasirinktas subrangovas privalo patikslinti remontuojamų dujotiekių kadastrinių matavimų bylas ir pateikti jas Užsakovui popierinėje (2 vnt.) ir skaitmeninėje formoje.

3.3.9. Naudotis (samdyti) įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos paslaugomis, siekiant įvertinti statinio ir jo įrenginių techninę būklę ir pateikti išvadas dėl įrenginių tinkamumo pradėti eksploatuoti.

3.3.10. Rangovas apmoka už visų trečiųjų šalių samdymo paslaugas, kurios reikalingos statybos metu bei statybos užbaigimui.

3.3.11. Rangovas pagal technines specifikacijas užsako, su Užsakovu suderina gamybos brėžinius ir schemas bei **pristato reikalingas pagrindines medžiagas ir įrangą ne vėliau kaip iki 2019-04-30.** Apsirūpinimas visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais (įskaitant statybos žurnalą), sutikimais ir/ar leidimais.

3.3.12. Statinių statybos užbaigimo procedūrų organizavimas:

3.3.12.1. Rangovas privalo užpildyti, sukomplektuoti visus privalomus dokumentus dėl darbų užbaigimo akto gavimo.

3.3.12.2. Parengti ir su Užsakovu suderinti magistralinio dujotiekio vamzdyno techninius pasus.

3.3.12.3. Organizuoti komisijų darbą, operatyviai ištaisyti nustatytus trūkumus.

3.3.12.4. Komplektavimas statybos dokumentų (popierinė ir skaitmeninė versijos), įskaitant:

- * išsamias dujotiekio linijinės dalies ir kitos pagrindinės įrangos eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba;

- * statybos produktų sertifikatus ir atitikties deklaracijas lietuvių kalba;

- * statybos ir išpildomąją dokumentaciją;

- * prekių gamintojų gamybos kokybės užtikrinimo ISO sertifikatų kopijas, prekių kokybės sertifikatų kopijas, išsamius prekių aprašymus, technines charakteristikas.

3.3.13. Statybos vamzdžių ir medžiagų likučių pristatymas į Užsakovo sandėlį Vilniuje (Gudelių g. 49). Rangovas turi užtikrinti racionalų vamzdžių ir kitų medžiagų ir įrangos naudojimą statybos metu. Statybos darbams nepanaudotus vamzdžius Rangovas privalo grąžinti Užsakovui nepažeistus, nesupjaustytus.

3.3.14. Reikiamo vertimo paslaugos. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Užsakovui būtų lietuvių kalba, o komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas.

Priedai:

1. Antžeminių perėjų foto fiksacijos, 2 lapai;
2. UAB „Ardynas“ projekto 2011.47 „Katodinės apsaugos sistemos rekonstrukcijos projektas“ ištrauka, 1 lapas.

Pastaba: Jei šiose sąlygose bei prieduose yra nuoroda į konkretų standartą, gamintoją ar gaminį ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“

Technikos direktorius
Andrius Dagys



Rangovas:

UAB „DS-1“

Direktorius
Vyktintas Belickas



*Pav. 1 ir 2. MD Kaunas - Šakiai DN500 antžeminė perėja per kanalą:
X:476137,01; Y:6091774,91; PK1219+95*



*Pav. 3. MD Vilnius-Kaunas DN700 antžeminė perėja per geležinkelį:
X:572653,33; Y:6058853,79; PK2+40*




*Pav. 4. MD atšakoje į Alytaus DSS DN400 antžeminė perėja per kanalą:
X:519398,32; Y:6075154,80; PK58+80*




**Techninės specifikacijos Priedas 2. UAB „Ardynas“ projekto 2011.47
„Katodinės apsaugos sistemos rekonstrukcijos projektas“ ištrauka**

stoties eilės numeris yra tame ruože, pvz: KAS 10.3 yra dešimto ruožo trečia katodinės apsaugos stotis, esanti Rekčių k., Šiaulių raj. (žymėjimo principą žiūrėti apačioje pateiktoje scheme).



2.6.2. Kontrolės matavimo punktų tipų kodinis žymėjimas

Kontrolės matavimo punkto tipas žymimas kodiniu žymėjimu (žr. apačioje pateiktoje scheme). Pirmas simbolis „T“ raidė yra žodžio tipas santrumpa, sekantys raidiniai ir skaitiniai simboliai nurodo matavimo punkto sudėtį. Skaitinių ir raidinių ženklų reikšmės pateiktos 4 lentelėje.




4 lentelė. Kontrolės matavimo punktų tipų koduotė

Žymuo(kodas)	Reikšmė
1	Potencialo matavimas
2	Apsauginis dėklas
3	Linijinės srovės matavimas
4	Stacionarus palyginamasis elektrodas
5	Polarizacinis daviklis
6	Izoliuojanti jungtis
7	Korozijos greičio daviklis
A1...n	Anodas
D	Drenažas
N	Nuotolinis ryšys
J	Jungė
K	Apsauga nuo klaidžiojančios srovės
P1...n	Protektorius
Z	Apsauga nuo žaibo

2.7 Kontrolės matavimo punktų numeravimas

Kontrolės matavimo punktai numeruojami sudėtinio dviejų dalių skaičiumi. Pirmą ir antrą skaičiaus dalį atskirtos skiriamuoju taško ženklu. Pirmas skaičius yra dujotiekio linijos, kurioje įrengtas punktas, numeris, antrasis punkto eilės numeris nurodo kelintą kontrolės matavimo punktą yra dujotiekio linijoje, pvz: 8.1 aštuntos dujotiekio linijos pirmas kontrolės matavimo punktas



	Lapas	Lapų	Laida
2011-47 10.1-00-TP-BD.AR	5	25	0

Darbų vykdymo grafikas

(pridedamas atskiru dokumentu, kai jis yra parengiamas Sutartyje nustatyta tvarka)

Subrangovų sąrašas

(pridedamas atskiru dokumentu, kai jis yra parengiamas Sutartyje nustatyta tvarka)

PASIŪLYMAS¹
ANTŽEMINIŲ MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO PERĖJŲ (3 VNT.) PAKEITIMO POŽEMINĖMIS DARBŲ
PIRKIMO

2018-10-24

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės ir PVM kodai	UAB „DS-1“, 181123848, LT811238412
Tiekėjo adresas	Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vykintas Belickas
Telefono numeris	+37069828995
El. pašto adresas	vykintas@ds-1.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame/ nesutinkame (jei nesutinkame, nurodyti su kokiomis sąlygomis ir kodėl) su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbiamų derybų skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 396723;
- 2) skelbiamų derybų sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, kuriame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį, darbų ir paslaugų kainas ir kitą derybų sąlygose nurodytą informaciją.

3. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, esame pasirengę kokybiškai ir derybų sąlygose nustatytu laiku bei apimtimis atlikti MD Vilnius – Kaunas, MD Kaunas - Šakiai ir MD atšakoje į Alytaus DSS antžeminių dujotiekio perėjų pakeitimo į požemines perėjas darbus, kurių apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos pirkimo sąlygose ir jų prieduose, taip pat visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje, už toliau nurodytą kainą:

3.1. Bendra pirkimo objekto pasiūlymo kaina be PVM	588.040,00 (penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturiasdešimt) EUR <i>skaičiais ir žodžiais</i>
3.2. 21 % PVM	123.488,40 EUR <i>Skaičiais</i>

¹ Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 7.2 ir 8 punktus. 7.2 ir 8 punktų Tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti, tuo atveju, jeigu Tiekėjas sutarties vykdymui neketina pasitelkti subtiekiejų (tiek ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atlikti derybų sąlygų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (arba) profesinės patirties, tiek subtiekiejų, kurių pajėgumais nesiremiamasi siekiant atlikti reikalavimus) ir (ar) pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

3.3. Bendra pasiūlymo kaina su PVM	711.528,40 (septyni šimtai vienuolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt aštuoni EUR 40 centų) <i>skaičiais ir žodžiais</i>
------------------------------------	---

4. Pirkimo objekto antžeminių MD perėjų (3 vnt.) pakeitimo požeminėmis MD Vilnius – Kaunas, MD Kaunas - Šakiai ir MD atšakoje į Alytaus DSS darbų, visų papildomų darbų ir su jais susijusių paslaugų, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje, dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Darbų/išlaidų pavadinimas	Kaina (Eur be PVM)
	MD Vilnius – Kaunas, MD Kaunas - Šakiai ir MD atšakoje į Alytaus DSS antžeminių dujotiekio perėjų pakeitimo požeminėmis darbais, iš jų:	588.040,00
1	MD Vilnius – Kaunas DN700 antžeminės perėjos per geležinkelį PK 2+40 pakeitimo požemine darbai (viso), iš jų:	341.680,00
1.1	Kapitalinio remonto projekto (etapas - techninis darbo projektas) parengimas	31.000,00
1.2	Kapitalinio remonto darbai (viso), iš jų:	310.680,00
1.2.1	Medžiagų ir įrangos tiekimas	118.500,00
1.2.2	Bendrieji statybos darbai: žemės darbai - iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo sistemoms atstatyti/įrengti (jei reikia); kiti panašaus profilio darbai	63.500,00
1.2.3	Dujų technologinės įrangos, vamzdyno demontavimo-montavimo, bandymo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai	76.300,00
1.2.4	Dujotiekio perizoliavimas	17.000,00
1.2.5	Geodezinės nuotraukos parengimas	480,00
1.2.6	Kadastro paslaugos pagal Techninės specifikacijos p. 3.3.8 (atitinkamos MD kadastro bylos tikslinimas ir vertės perskaičiavimas)	2.000,00
1.2.7	Kadastro paslaugos pagal Techninės specifikacijos p. 1.8.1 (preliminarus sklypų skaičius – 6 vnt.)*	2.800,00
1.2.8	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai	30.100,00
1.2.9	Kiti darbai (juos nurodant)	0,00
2	MD Kaunas - Šakiai DN500 antžeminės perėjos per kanalą PK 1219+95 pakeitimo požemine darbai (viso), iš jų:	124.480,00
2.1	Kapitalinio remonto projekto (etapas - techninis darbo projektas) parengimas	17.300,00
2.2	Kapitalinio remonto darbai (viso), iš jų:	107.180,00
2.2.1	Medžiagų ir įrangos tiekimas	27.200,00
2.2.2	Bendrieji statybos darbai: žemės darbai - iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo sistemoms atstatyti/įrengti (jei reikia); kiti panašaus profilio darbai	28.700,00
2.2.3	Dujų technologinės įrangos, vamzdyno demontavimo-montavimo, bandymo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai	21.000,00
2.2.4	Dujotiekio perizoliavimas	9.000,00
2.2.5	Geodezinės nuotraukos parengimas	480,00
2.2.6	Kadastro paslaugos pagal Techninės specifikacijos p. 3.3.8 (MD kadastro bylos tikslinimas ir vertės perskaičiavimas)	1.800,00
2.2.7	Kadastro paslaugos pagal Techninės specifikacijos p. 1.8.1 (preliminarus sklypų skaičius – 2 vnt.)*	1.000,00
2.2.8	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai	18.000,00
2.2.9	Kiti darbai (juos nurodant)	0,00

Eil. Nr.	Darbu/išlaidų pavadinimas	Kaina (Eur be PVM)
3	MD atšakoje į Alytaus DSS DN400 antžeminės perėjos per kanalą PK 58+80 pakeitimo požemine darbai (viso), iš jų:	121.880,00
3.1	Kapitalinio remonto projekto (etapas - techninis darbo projektas) parengimas	17.300,00
3.2	Kapitalinio remonto darbai (viso), iš jų:	104.580,00
3.2.1	Medžiagų ir įrangos tiekimas	26.700,00
3.2.2	Bendrieji statybos darbai: žemės darbai - iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo sistemoms atstatyti/įrengti (jei reikia); kiti panašaus profilio darbai	28.500,00
3.2.3	Dujų technologinės įrangos, vamzdyno demontavimo-montavimo, bandymo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai	19.800,00
3.2.4	Dujotiekio perizoliavimas	8.500,00
3.2.5	Geodezinės nuotraukos parengimas	480,00
3.2.6	Kadastro paslaugos pagal Techninės specifikacijos p. 3.3.8 (MD kadastro bylos tikslinimas ir vertės perskaičiavimas)	1.800,00
3.2.7	Kadastro paslaugos pagal Techninės specifikacijos p. 1.8.1 (preliminarus sklypų skaičius – 2 vnt.)*	1.000,00
3.2.8	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai	17.800,00
3.2.9	Kiti darbai (juos nurodant)	0,00

*paslaugos perkamos ir už jas atsiskaitoma pagal poreikį.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo PVM netaikymo nuorodą;

5. Siūlomi Darbai *visiškai atitinka* / *neatitinka* pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (jei *neatitinka*, nurodomi neatitikimai, pateikiamas paaiškinimas).

Siūlome šias medžiagas - vamzdžius Izostal, Lenkija arba analogiškus (nurodomas gaminio gamintojas, kilmės šalis).

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
6.1	UAB „DS-1“ pažyma „Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją“	2
6.2	UAB „DS-1“ VEI Atestatas „Eksplatuoti gamtinių dujų įrenginius“	2
6.3	UAB „DS-1“ SPSC Kvalifikacijos atestatas Nr. 149	1
6.4	MB „Toporanga“ juridinių asmenų registro išrašas	2
6.5	UAB „Toporanga“ pažyma „Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją“	2
6.6	MB „Toporanga“ pažyma apie atsakingą už buhalterinės apskaitos vedimą	1

6.7	MB „Toporanga“ kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 1GKV -1335, Renaldas Balsevičius	1
6.8	UAB „Hidroterra“ pažyma „Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją“	2
6.9	Marius Milaševičius, UAB „DS-1“ projektų vadovas, SPSC Kvalifikacijos atestatas Nr. 16262	1
6.10	Tomas Jankauskas, UAB „DS-1“ darbų vadovas, SPSC Kvalifikacijos atestatas Nr. 34524; Tomas Jankauskas, UAB „DS-1“ darbų vadovas, EMC Nr. EDSS-2015-171-06	2
6.11	Aurimas Norkus, UAB „DS-1“, šaltkalvis; EMC Nr. EDSS-2015-193-14	1
6.12	Gediminas Pielikys UAB „DS-1“, šaltkalvis; EMC Nr. ED-17-41-12	1
6.13	Gintaras Jančauskas, UAB „DS-1“, šaltkalvis; EMC Nr. EDSS-2015-171-40	1
6.14	Tomas Zalieckas, UAB „DS-1“, suvirintojas; suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo sertifikatas Nr. 18SB/007	1
6.15	Saulius Kanapickas, UAB „DS-1“, suvirintojas; suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo sertifikatas Nr. 18SB/010	1
6.16	Darius Kalesnykas, Kvalifikacijos atestatas Nr.: 18306	1
6.17	Giedrius Kupčiūnas, Kvalifikacijos atestato Nr. 23020	1
6.18	Algimantas Kabišaitis, Kvalifikacijos atestato Nr. 3357	1
6.19	ISO sertifikatas	1
6.20	Atliktų darbų sąrašą	1
6.21	Specialistų sąrašas	1
6.22	Sąmatos	3

7. Dalyvaudamas Pirkime ir vykdant sutartį remiuosi šių ūkio subjektų pajėgumais ir (ar) pasitelksiu šiuos subtiekiėjus²:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Ūkio subjekto pavadinimas ir jo turimas specialus leidimas, buvimas tam tikrų organizacijų nariu, arba turimi finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimai ³
7.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti derybų sąlygų reikalavimus		
7.1.1.	UAB „Toporanga“	Kvalifikacijos pažymėjimas Nr.:1GKV-1335, Renaldas Balsevičius
7.1.2	UAB „Hidroterra“	Kvalifikacijos atestatas Nr.: 18306, Darius Kalesnykas; Kvalifikacijos atestato Nr. 23020, Giedrius Kupčiūnas; Kvalifikacijos atestato Nr. 3357, Algimantas Kabišaitis.

² Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekiėjai (subrangovai, subteikėjai).

³ Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (arba) profesinės patirties (jeigu tokius reikalavimus kelia Perkantysis subjektas) tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys atliks darbus, suteiks paslaugas, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.

7.2. Pasiūlymo pateikimo metu žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui (tiek ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti derybų sąlygų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (arba) profesinės patirties, tiek subtiekejai, kurių pajėgumais nesiremiamą siekiant atitikti reikalavimus)⁴

	Subtiekejo pavadinimas	Subtiekejo atliekamų darbų, teikiamų paslaugų, tiekiamų prekių pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
7.2.1.	UAB „Toporanga“	Geodezijos, kadastro paslaugos	2
7.2.2.	UAB „Hidroterra“	Projektavimo paslaugos	5
7.2.3.	UAB „Požeminės jungtys“	Betranšėjis vamzdžių tiesimas	10
7.2.4.	UAB „Dekra“	Siūlių švietimas ir su tuo susijusios paslaugos	2
7.2.5.	UAB „Šakių hidrotechnika“	Melioracijos atstatymo darbai, sklypų sutvarkymas	5
7.2.6.	VšĮ Technikos priežiūros tarnyba	Techninė priežiūra, siūlių švietimas ir kitos dujotiekio statybos užbaigimui reikiamos paslaugos	1
7.2.7.	UAB „Vitras-S“	Geležinkelio vėžės ardymas, atstatymas	1

8. Patvirtindami, kad mums yra žinoma, jog Perkantysis subjektas turi užtikrinti, kad pasiūlyme esančios informacijos atskleidimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, informuojame, jog šiame punkte nurodyta informacija yra konfidenciali (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)⁵:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Įsegti dokumentai“
8.1.	~	~
...		

9. Sutinkame su mokėjimo sąlygomis, išdėstytomis derybų sąlygų 4 priedo 2.4 punkte.

⁴ Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us), privalo būti nurodyta, o subtiekejai turi būti nurodyti, jeigu jie pasiūlymo pateikimo metu yra žinomi.

⁵ Lentelėje pateikiama informacija apie pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas Tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.

Tuo atveju, jei lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Perkantysis subjektas laikys, kad ta pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, o Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl Tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

10. Siūlomi garantiniai terminai:

10.1. atliktiems Darbams, įskaitant statybos produktus, - 5 (turi būti siūlomas ne trumpesnis, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimai, tai yra - 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) - 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų - 20 metų);

10.2. tiekiamoms medžiagoms, gaminiams ir įrangai - 24 (turi būti siūlomas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai po to, kai pasirašomas galutinis atliktų darbų aktas);

11. Siūlomas gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas - 10 d. (turi būti siūlomas ne ilgesnis, kaip 10 dienų, išskyrus atvejus, kai per šį laikotarpį gedimų ir defektų ištaisyti objektyviai neįmanoma ir Tiekėjas pateikė tai patvirtinančius įrodymus (pvz., šalinant defektą, turi būti pagaminama tam tikra įranga, kurios pagaminimas trunka ilgiau nei šiame punkte nustatytas gedimų ir trūkumų pašalinimo terminas).

12. Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

Direktorius Vyckintas Belickas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
