

**RANGOS DARBŲ PAGAL PROJEKTĄ
„POTVYNIŲ RIZIKOS MAŽINIMAS KĖDAINIŲ MIESTE“
SUTARTIS**

2019 m. sausio 24 d. Nr. VP- 23
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama direktoriaus Ovidijaus Kačiulio (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Babėnų transportas“ (įmonės kodas 161645714), atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaičio (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos darbų sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

**I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaudamasis Veiklos sąrašu, kuris yra šios Sutarties 2 priedas ir technine specifikacija, kuri yra šios Sutarties 1 priedas, parengti projekto „Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste“ techninį darbo projektą; paaukštinti pylimą esantį sodininkų bendrijoje „Užuovėja“; įrengti naują pylimą ir sutvarkyti polderio pralaidos reguliatorių (atbulinį vožtuvą) sodininkų bendrijoje „Justinava“; parengti išpildomąją naujo pylimo dokumentaciją: geodezinę nuotrauką ir kadastrinių matavimų bylą (toliau – Darbai), apsidrausti statinio statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir apmokėti už Darbus.

**II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA**


2.1. Bendra Sutarties kaina, nustatyta vykdant mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu, yra 114 501,21 Eur (vienas šimtas keturiolika tūkstančių penki šimtai vienas Eur 21 ct) su PVM, bendra Sutarties kaina be PVM – 94 629,10 Eur ir PVM (21 proc) - 19 872,11 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina. Užsakovas už atliktus Darbus sumoka Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo 2.1. punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės (bendros sutarties kainos).

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina su PVM perskaičiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas bus taikomas atliktų Darbų, tačiau dar neapmokėtų ir Darbų, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo nustatymo kainai perskaičiuoti. PVM perskaičiavimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.



SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius



2.4. Sutarties kaina peržiūrima kas 12 mėnesių po Sutarties pasirašymo, jei, vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamais duomenimis, statybos sąnaudų elementų (hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti) kainų pokytis, skelbiamas (<http://www.stat.gov.lt>), per vienerius kalendorinius metus nuo Sutarties pasirašymo bus didesnis kaip 5 proc.

Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti sutartyje numatytais terminais, kainą.

Perskaičiuojama tų Darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos pakeitimo įforminimo. Kainų pakeitimas įforminamas Šalių susitarimu po Lietuvos statistikos departamento statybos kainų indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainų indeksai pagal statinių tipus skelbiami Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, adresas – <http://www.stat.gov.lt>. Indeksuota kaina įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo pasirašymo dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik Užsakovo mokėjimams pagal sutartį už atliktus Darbus atitinkamai po kainų pakeitimo įforminimo Šalių susitarimu. Kainos keitimas į didesnę pusę negalimas, jeigu Rangovo pasiūlyme ir pasirašytoje sutartyje nustatytų konkrečių Darbų atlikimo ir privalomų Užsakovui terminų nebuvo laikytasi ir jei atlikimo terminų keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu.

2.5. Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina perskaičiuojama pakeitus teisės aktus, dėl kurių padidėja arba sumažėja PVM tarifas. Dėl to sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina nebus perskaičiuojama.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Suteiktų paslaugų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

2.6. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-006 priemonę „Potvynių rizikos valdymas“.

III SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, SUSTABDYMAS, SUTARTIES GALIOJIMAS IR PRATĖSIMAS

3.1. Rangovas „Potvynių rizikos mažinimo Kėdainių mieste“ Darbus pradeda įsigaliojus sutarčiai ir baigia per 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius, Rangovui pateikus Sutarties IX skyriuje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei Užsakovui pateikus Rangovui rašytinį nurodymą pradėti Darbus. Sutartis galioja 20 mėnesių.

3.2. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, juos priduoti, ištaisyti galimus defektus ir pateikti visus dokumentus užbaigimo procedūrai įvykdyti.

3.3. Darbų įvykdymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip 30 dienų

SUDERINTA
Taisės ir personalo skyrius

laikotarpiui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

3.3.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

3.3.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų X skyriaus nuostatomis;

3.3.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

3.4. Darbų atlikimo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas bei Užsakovui perduoti visi užbaigimo dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

3.6. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsimas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas.

3.7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklos sąraše (Sutarties 2 priedas).

3.8. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

IV SKYRIUS **ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA**

4.1. Už atliktus Darbus atsiskaitoma per 5 darbo dienas nuo paramos lėšų gavimo į atskirą projekto finansavimo lėšoms atidarytą banko sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų, po to, kai pasirašytus atliktų Darbų aktus, pažymą (forma F-3) ir sąskaitą faktūrą Rangovas pateikia Užsakovui. Už atliktus darbus atsiskaitoma, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai.

4.2. Rangovas, per kalendorinį mėnesį atlikęs Darbus, pateikia Atliktų darbų aktus techniniam prižiūrėtojui. Jam priėmus Darbus pasirašomi atliktų Darbų aktai.

4.3. Rangovas techninio prižiūrėtojo priimtus ir pasirašytus atliktų Darbų aktus, pažymą forma (F-3) pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 22 dienos.

4.4. Tik Užsakovui pasirašius atliktų Darbų aktus ir pažymą (forma F-3) Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra pateikiama informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.5. Techniniam prižiūrėtojui Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių pasus bei sertifikatus.

4.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

4.6.1. nepašalinti Darbų trūkumai;

4.6.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

4.6.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.7. Kilus ginčui dėl atliktų Darbų (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną Darbų dalį.

4.8. Užsakovas pasilieka teisę sulaikyti 10 proc. Sutarties sumos iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui suremontuotų Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos aktą, pateikus atsiskaitymo dokumentus, įskaitant medžiagų pasus, sertifikatus ir pranešimo apie defektus laikotarpiui įsipareigojimų įvykdymo garantiją. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (Užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio

SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius

garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos (LR Statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalis).

4.9. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

5.1. Darbų garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir yra:

- 5.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
- 5.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);
- 5.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

5.2. Rangovas garantuoja, kad užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame projekte numatytas savybes, normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaikšėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.


5.4. Pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme (41 straipsnio 2 dalis).

VI SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

- 6.1.1. pranešti, kas vykdys Darbų techninę priežiūrą;
- 6.1.2. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti 4.1. punkte nustatyta tvarka;
- 6.1.3. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą Darbą arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko normų ir taisyklių;
- 6.1.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį.

6.2. Rangovas įsipareigoja:



SUPERINTA
visas ir personalo skyrius



- 6.2.1. laiku pradėti, tinkamai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti Darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.
- 6.2.2. patiekti į Darbų atlikimo vietas reikalingas medžiagas, gaminius bei reikalingą techniką;
- 6.2.3. prieš paslepiant ar uždengiant kurias nors konstrukcijas, informuoti techninį prižiūrėtoją, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas apie tai raštu nepranešęs techniniam prižiūrėtojui, tai, techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tas konstrukcijas atidengti patikrinimui;
- 6.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
- 6.2.5. vykdyti Darbus, įrengti laikinus aptvėrimus, pastatyti reikiamus laikinus kelio ženklus, o baigus Darbus juos išardyti;
- 6.2.6. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminių dokumentų reikalavimus;
- 6.2.7. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų vykdymo;
- 6.2.8. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus Darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus Darbus;
- 6.2.9. įforminti rangos Darbų atlikimo dokumentus;
- 6.2.10. savo sąskaita atkurti prarastus Darbų atlikimo dokumentus;
- 6.2.11. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių bei konstrukcijų bandymus, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų Darbų kokybės;
- 6.2.12. keisti Užsakovo patvirtintus Darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą. Pakeitimus derinti su Užsakovu;
- 6.2.13. vykdyti Darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;
- 6.2.14. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei;
- 6.2.15. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias Darbų kokybei, atlikimo terminui.

VII SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS

- 7.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Rangovui:
- 7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas;
- 7.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl Darbų vykdymo ateityje;
- 7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui;
- 7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai Darbų vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos.
- 7.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę.
- 7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų ir/ar sutarties vykdymo užtikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.
- 7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.
- 7.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu:



SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius



- 7.5.1. ilgiau nei 10 darbo dienų nuo sutartos dienos nepradedama vykdyti Darbų;
- 7.5.2. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14 kalendorinių dienų;
- 7.5.3. nesilaiko Veiklos sąraše nustatytų terminų ir tai Užsakovui suteikia pagrindą manyti, jog Darbai nebus užbaigti laiku;
- 7.5.4. nevykdo pagrįstų Užsakovo ar Užsakovo paskirto techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius reglamentuojančių teisės aktų;
- 7.5.5. nepateikia Rangovo darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo galiojančios sutarties ar nepratęsiamų nurodytų dokumentų;
- 7.5.6. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo ar jo paskirto techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;
- 7.5.7. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.
- 7.6. **Rangovas** turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teisimą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui:
- 7.6.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;
- 7.6.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui.
- 7.7. Užsakovui nutraukus Sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų kokybiškai atliktus Darbus ir už juos atsiskaitytų.

VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas:


- 8.1.1. nutraukęs Sutartį, apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus;
- 8.1.2. Sutarties 4.1. punkte nustatytu terminu neatsiskaitęs už atliktus Darbus, moka Rangovui 0,05 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;
- 8.1.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;
- 8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui baudą, lygią 20 proc. Sutarties vertės su PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2. Rangovas:

- 8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų per garantinį laikotarpį, moka Užsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;
- 8.2.2. nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1. punktą ir Sutarties 2 priedą „Veiklos sąrašas“, moka Užsakovui 0,05 proc. uždelstų Darbų kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;
- 8.2.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;
- 8.2.4. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 20 proc. Sutarties vertės su PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.



SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius



IX SKYRIUS

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo užstatą. Užstato vertė – 5 procentai Sutarties kainos, nurodytos 2.1. punkte su PVM. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

9.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – užstatas pervedamas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (įm. kodas 188768545) sąskaitą LT50 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440.

9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

9.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas kartu su galutiniu mokėjimu.

X SKYRIUS

SUTARTIES PAKEITIMAS

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

10.2. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms, aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų Darbų (ar jų dalies) ar mažinama Darbų apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jų dalį) galima keisti kitais Darbais, reikalingais Darbams tinkamai užtikrinti.

10.3. Šie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:

10.3.1. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas galimas, Rangovo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą įforminant Šalių susitarimu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą.


10.3.2. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas Šalių aktu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaičiavimo atvejui, Sutarties pradinė vertė negali būti didinama.

10.4. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų apimties, viršijančios pradinę sutarties vertę daugiau 15 proc. (sutarties 2.2. punktas).

10.5. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus



SUDERINTA
Tiesės ir personalo skyrius



Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

10.6. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.2 punkte nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi.

XI SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, derybų būdu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, Šalys ginčą sprendžia šioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis į teismą.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl Darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XII SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

12.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

12.3. **Užsakovas** turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu:

12.3.1. neskiriamas Europos Sąjungos finansavimas projekto „Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste“ įgyvendinimui.

12.3.2. Rangovas nevykdo Sutarties 6.2. punkto papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų arba, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo.

12.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklos sąrašą (Sutarties 2 priedas) pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą. Tokiu atveju Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 20 proc. Sutarties vertės su PVM, bei atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

XIII SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

13.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus UAB „Matininkas“ (įmonės kodas 161294642, Janušavos g. 16, LT-57301 Kėdainiai, atstovaujama direktoriaus Žydrūno Rugieniaus. Statinio projekto vadovas Valerijus Gasiūnas.

SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius

Jei pasiūlymo pateikimo metu subrangovai nebuvo žinomi, tačiau vykdant sutartį jie bus pasitelkiami, ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Rangovas privalo pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, ir pateikti kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Sutarties vykdymo laikotarpiu Užsakovas numato galimybę keisti subrangovus lygiavertės kvalifikacijos subrangovais rašytiniu Šalių susitarimu.

13.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

13.3. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtims pašalinti.

13.4. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, Veiklos sąrašu (Sutarties 2 priedas), technine specifikacija (Sutarties 1 priedas), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose, Veiklos sąraše (Sutarties 2 priedas), techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), nustatytais sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

13.3. Už Sutarties vykdymą atsakingas Algimantas Žvikas, Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas, tel. (8 347) 69 594, el. p. algimantas.zvikas@kedainiai.lt, kai jo nėra, Ieva Matyžiūtė, Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 347) 69 571, el. p. ieva.matyziute@kedainiai.lt.

13.6. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

13.5. SUTARTIES PRIEDAI:

1. Techninė specifikacija (4 lapai).
2. Veiklos sąrašas (1 lapas).
3. Atliktų darbų akto forma (1 lapas).

XIV SKYRIUS SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
a.s. LT 137044060006197000
AB SEB bankas, b.k. 70440

Rangovas:

UAB „Babėnų transportas“
S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, LT-57149 Kėdainiai
Kodas 161645714
a.s. LT 537300010039967564
AB „Swedbank“, b.k. 73000

Kėdainių rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
pavarduojantis administracijos direktorius
Viačeslavas Čerenkovas



Žemės ūkio ir aplinkosaugos
skyriaus vedėjas

Algimantas Žvikas

UAB „Babėnų transportas“
direktorius Eugenijus Antanaitis



Žemės ūkio ir aplinkosaugos
skyriaus vyr. specialistė

Ieva Matyžiūtė

Biudžeto ir finansų skyriaus
vedėja

Jolanta Sakavienė

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Tėisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Marius Stasiukonis

TVIRTINU:

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Ovidijus Kačiulis
2018 m. spalio 3 d.

**PROJEKTO „POTVYNIŲ RIZIKOS MAŽINIMAS KĖDAINIŲ MIESTE“,
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Objektas: rangos darbai pagal projektą „Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste“.

Objekto adresas: Sodininkų bendrija „Užuovėja“, sodininkų bendrija „Justinava“, Kėdainių miesto seniūnija, Kėdainiai.

Užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

Esama situacija: Norint minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir išvengti Nevėžio upės potvynio grėsmės, reikia paaukštinti pylimą, esantį sodininkų bendrijoje „Užuovėja“. Sodininkų bendrijoje „Justinava“ reikia įrengti naują pylimą tarp Nevėžio upės ir Ilgosios gatvės, bei sutvarkyti „Justinavos“ polderio pralaidos reguliatorių (atbulinį vožtuvą), kuris šiuo metu yra sugedęs ir neveikiantis.

Darbų sudėtis:

1. Parengti projekto „Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste“ esamo pylimo paaukštinimo, naujo pylimo įrengimo ir pralaidos reguliatoriaus (atbulinio vožtuvo) remonto techninį darbo projektą su teigiamomis projekto ekspertizės išvadomis vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ bei melioracijos techniniais reglamentais MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ ir MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė“ bei kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais, taisyklėmis ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti statybos leidimą darbams vykdyti.
2. Rengiant techninį darbo projektą ir vykdant rangos darbus vadovautis Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos „Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste“ poveikio aplinkai vertinimo.
3. Vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu atlikti pylimo, esančio sodininkų bendrijoje „Užuovėja“, paaukštinimo darbus. Sodininkų bendrijoje „Justinava“ atlikti naujo pylimo įrengimo ir „Justinavos“ polderio pralaidos reguliatoriaus (atbulinio vožtuvo) sutvarkymo darbus.
4. Atlikti šlaitų padengimą juodžemiu bei apsėjimą žole.
5. Darbų atlikimo vietoje turi būti užtikrinta: saugus darbas, aplinkos ekologinė apsauga, įrankių, įrenginių ir technikos apsauga, tinkamos darbo higienos sąlygos, greta esančių žmonių apsauga nuo darbų keliamo pavojaus, nepažeistos trečiųjų asmenų veiklos sąlygos.
6. Atliekant rangos darbus turi būti derinama su žemės sklypų savininkais ar nuomotojais ir kitais asmenimis ar institucijomis, jei yra susiję su jų interesais.

PRIEDAI:

1. Vietovės schemos, 3 lapai.

Užduotį parengė:

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas

Algimantas Žvikas

KOPIJA TIKRA

2019 -01- 24

Bendrojo skyriaus sekretorė - referantė
Saida Svobaitė



Vietovių schemas

Projektas „Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste“ skirtas įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones Kėdainių miesto apgyvendintose potvynio grėsmės teritorijose (jos yra Kėdainių miesto šiaurės rytų dalyje ir apima sodininkų bendrijas: „Užuovėja“ ir „Justinava“).



Kopija tikra

Planuojama atlikti 0,19 m aukščio paaukštinimo darbus 360 m ruože. Planuojamos pylimo viršaus altitudės apie 32,2 m. Planuojamame paaukštinti pylimo ruože turi būti iškasama (demontuojama) esama žvyro danga. Jos vietoje iš molio, priemolio, akmenų turi būti suformuotas paaukštinimas, apdengtas geotekstile, skalda.

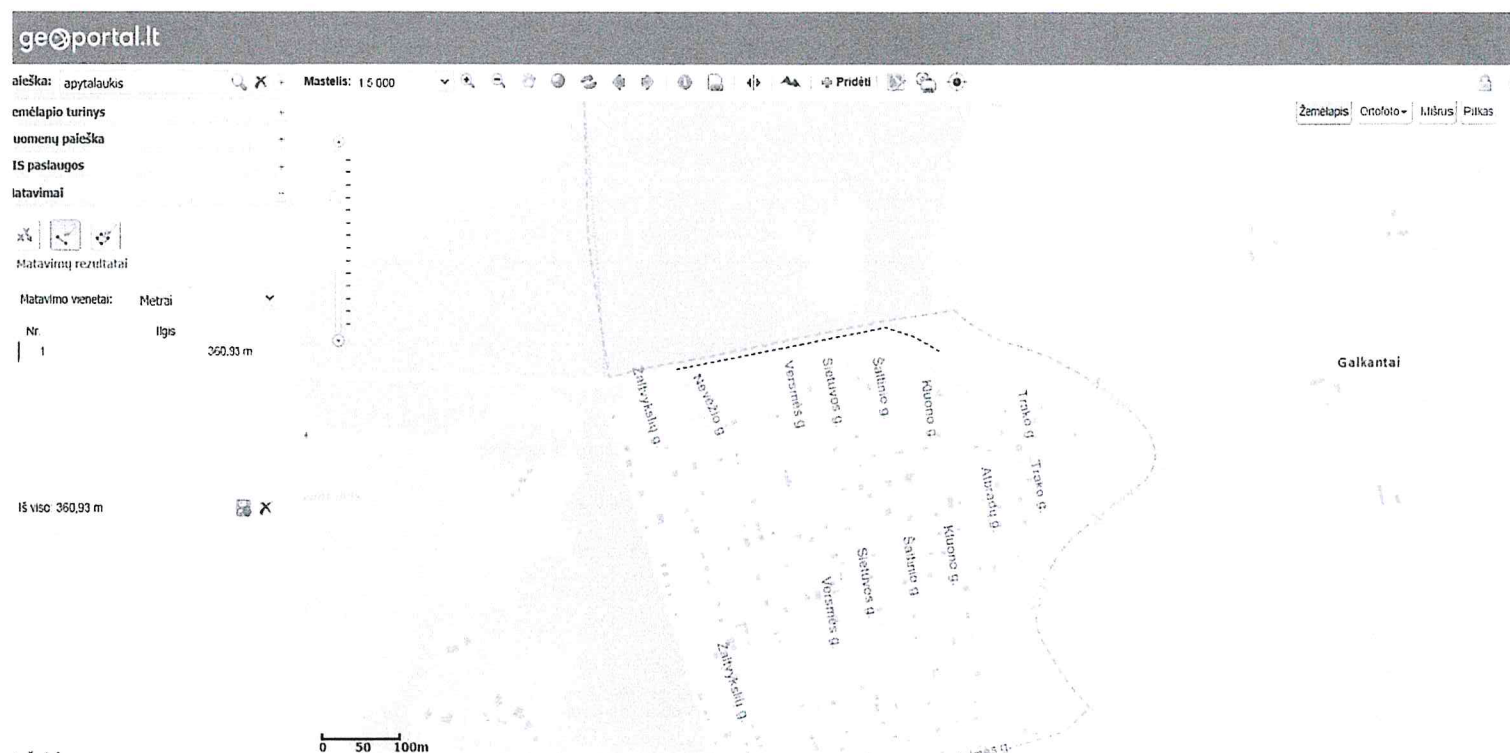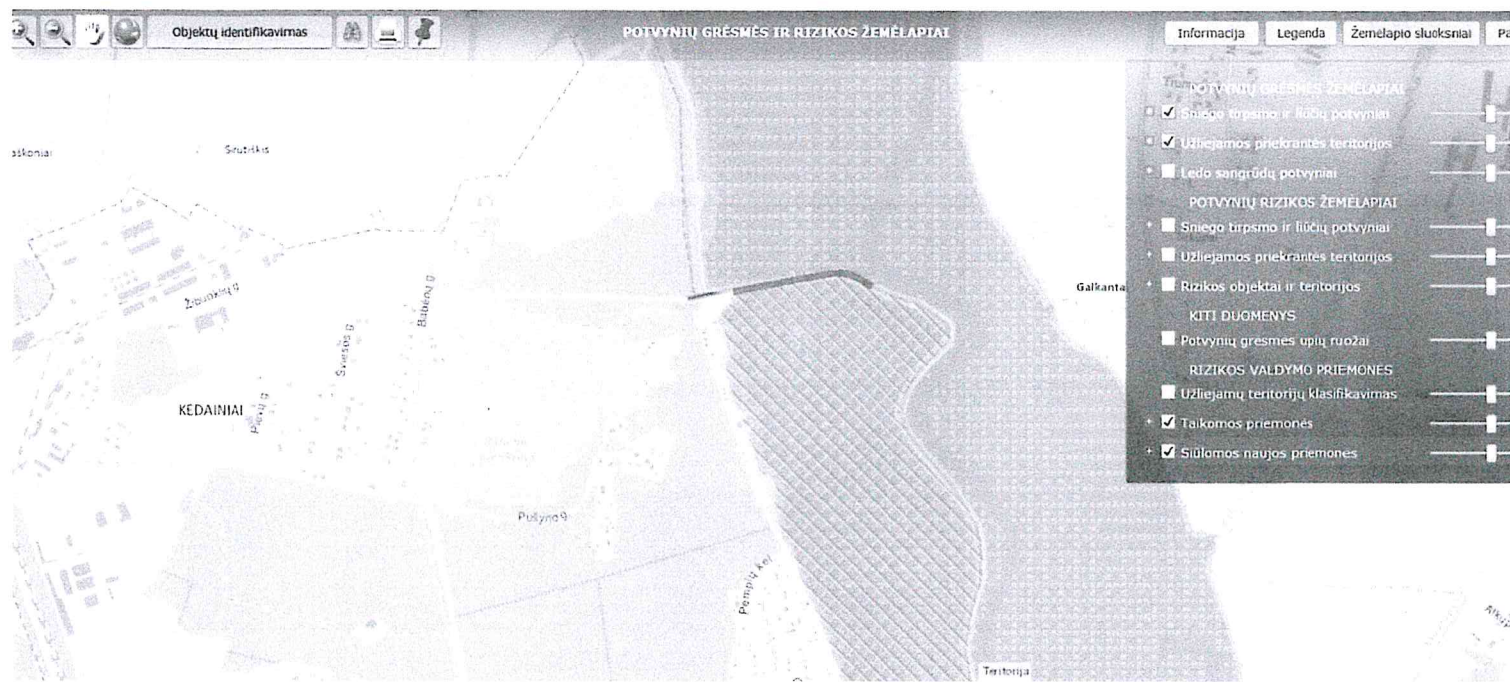




Kopija tikra

Vietovių schemos_3 Naujo pylimo įrengimas sodininkų bendrijoje „Justinava“ ir „Justinavos“ polderio pralaidos regulatoriaus (atbulinio vožtuvo) remonto darbai.

Planuojama įrengti naują pylimą (290 m ilgio, 1,48 m aukščio) jį sujungiant su esamu Nevėžio pylimu šalia Ilgosios g. bei rekonstruoti „Justinavos“ polderio atbulinį vožtuvą (1 vnt.)

Statant naują pylimą ir jį sujungiant su esamu Nevėžio pylimu, darbai bus vykdomi naudojant vietinį gruntą – molį, priemolį ir t.t. Taip pat, bus naudojama geotekstilė, spraustasienės, atliekami apšėjimo žole darbai. Planuojamos pylimo viršaus altitudės apie 32,2 m.

Rekonstruojant „Justinavos“ polderio atbulinį vožtuvą būtų atliekami žemės kasimo darbai, susidėvėjusios dalys turi būti keičiamos naujomis. Turi būti naudojamos tokios medžiagos kaip žvyras, metalas, plastikas, geotekstilė.

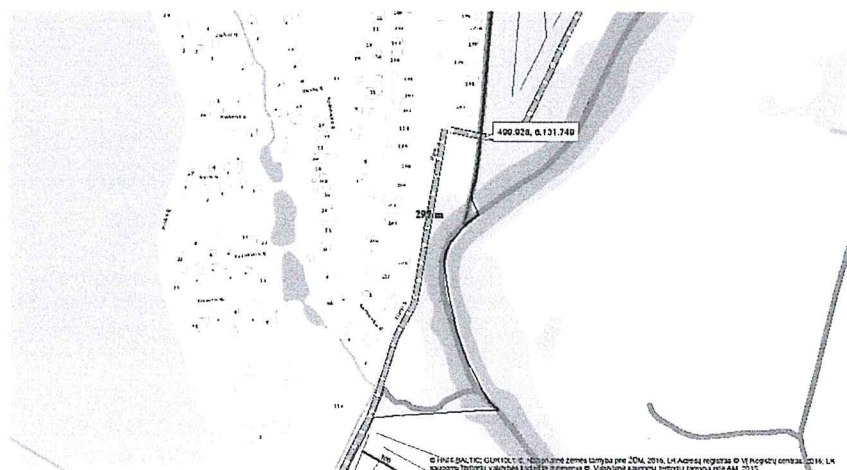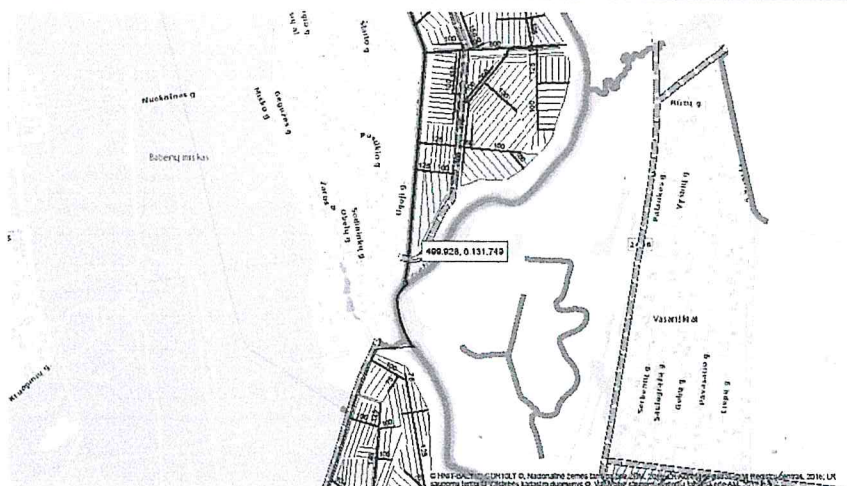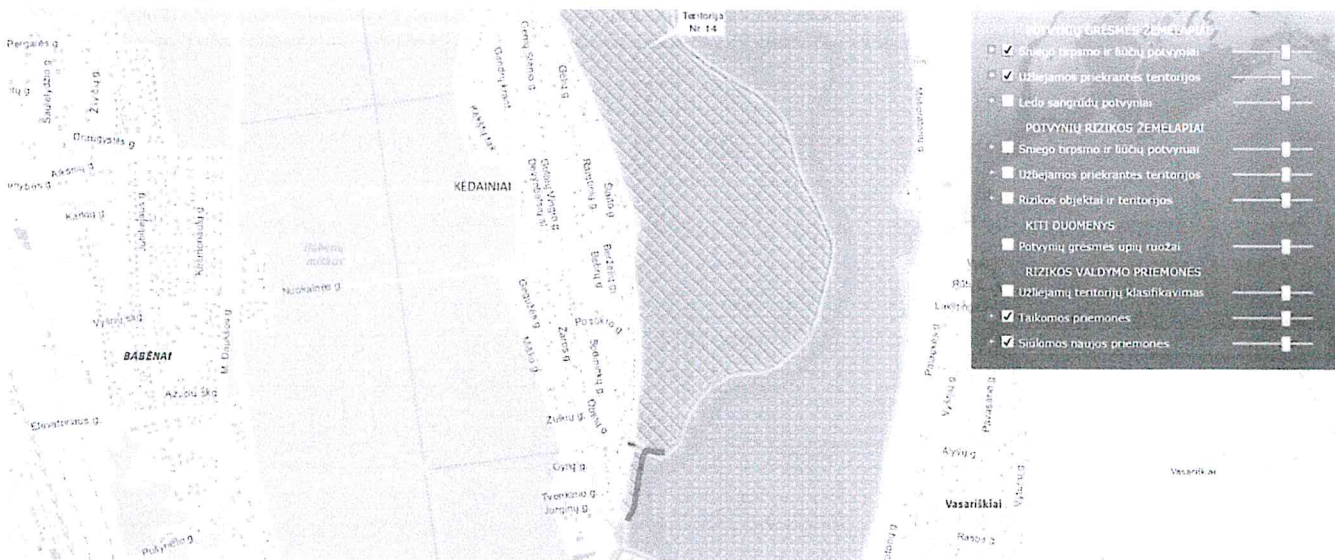

Kopija tikra

VEIKLOS SĄRAŠAS
RANGOS DARBAI PAGAL PROJEKTĄ „POTVYNIŲ RIZIKOS MAŽINIMAS KĖDAINIŲ MIESTE“

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM [pildo rangovas]														Darbo (etapo) kaina Eur be PVM [pildo rangovas]
			1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.	13 mėn.	14 mėn.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	4 ir 17 stulpelių suma
1.	Techninio darbo projekto parengimas	100	1150	1150	1150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3450,00
2.	Pylimo, esančio sodininkų bendrijoje „Užuovėja“, paaugštinimas	100	X	X	X	14000	14000	14000	14127,42	X	X	X	X	X	X	X	56127,42
3.	Naujo pylimo įrengimas sodininkų bendrijoje „Justinava“.	100	X	X	X	-	-	-	5343	5343	5343	5343	5343	5342,88	-	X	32057,88
4.	„Justinavos“ polderio pralaidos regulatoriaus (atbulinio vožtuvo) sutvarkymo darbai	100	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	1500	1493,80	-	X	2993,80
			Suma Eur be PVM:														94629,10
			PVM 21 proc. suma Eur:														19872,11
			BENDRA SUMA EUR SU PVM:														114501,21

Pastabos:

1. X – pažymėtų grafų tiekėjas nepildo.
2. Techninio darbo projekto parengimo paslaugų kaina neturi viršyti 5 proc. bendros pasiūlymo kainos su PVM.
3. Užsėjęs pirkimo procedūroms ar esant nepalankioms oro sąlygoms, pasirašius sutartį, Užsakovui neprieštaraujant darbų atlikimo grafikas, nurodytas Veiklos sąraše, gali būti koreguojamas keičiant darbų vykdymo seką ir darbų atlikimo terminus, bet nekeičiant nurodytos galutinės darbų apimtį ir termino. Darbų atlikimo grafiko keičimas įforminamas Šalių papildomu susitarimu ir detalizuotu Veiklos sąrašo priedu.


 Direktoriaus
 Eugenijus Aranauskas

Kopija tikra



Herbas arba prekių ženklas

UAB Babėnų transportas

(Teikėjo pavadinimas)

S.Dariaus ir S.Girėno g.23, Kėdainiai Im.kodas 161645714 PVM kodas LT616457113

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS**DĖL RANGOS DARBŲ PAGAL PROJEKTĄ „POTVYNIŲ RIZIKOS MAŽINIMAS****KĖDAINIŲ MIESTE“**2019.01.09

(Data)

Kėdainiai

(Sudarymo vieta)

1 lentelė.

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Babėnų transportas
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	S.Dariaus ir S.Girėno g.23, Kėdainiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Eugenijus Antanaitis
Telefono numeris	8 603 91949
Fakso numeris	8 347 31375
El. pašto adresas	babenutransportas@gmail.com

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų), subteikėjų (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti/

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų), subteikėjų (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB Matininkas V.Gasiūnas
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų), subteikėjų (-ų) adresas (-ai)	Janušavos g.16, Kėdainiai Rūtų g. 21, Kėdainiai
Įsipareigojimų dalis, nurodant konkrečius darbus, paslaugas, prekes, kuriems atlikti, teikti, tiekti bus subrangovas (-ai), subteikėjas (-ai) ar subteikėjas (-ai) pasitelkiami, jų atliekamų darbų, teikiamų paslaugų ar tiekiamų prekių vertę Eur arba dalį procentais	Geodeziniai matavimai, kadastrinės bylos parengimas Projekto parengimas 3,6%
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų), subteikėjų (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)	Statybos darbų vadovas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/>;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Bendrą pasiūlymo kainą su PVM 114 501.21 Eur

Vienas šimtas keturiolika tūkstančių penki šimtai vienas Eur 21ct.

(bendrą pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro 19 872,11 Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 94 629,10 Eur.

Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1	Lokalinė sąmata	3 lapai
2	Veiklos sąrašas	1 lapas
3	Tiekėjo deklaracija	1 lapas
4	Tiekėjo deklaracija dėl subrangovo	3 lapai
5	Atestatai	6 lapai

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

4 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	Lokalinė sąmata (konfidencialu)	
2	Veiklos sąrašas (konfidencialu)	
3	Tiekėjo deklaracija (konfidencialu)	
4	Tiekėjo deklaracija dėl subrangovo (konfidencialu)	
5	Atestatai (konfidencialu)	

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Eugenijus Antanaitis

(Vardas ir pavardė)
