

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ IŠPLĖTIMAS SURVILIŠKIO KAIME

SUTARTIS Nr. VP – 543

2019 m. birželio 28 d.

Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Babėnų transportas“ (įmonės kodas 161645714), atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaičio (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaudamasis technine specifikacija (Sutarties 2 priedas), Veiklos sąrašu (Sutarties 1 priedas), kurie yra šios Sutarties neatskiriamos dalys, parengti supaprastintą statybos projektą ir atlikti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų išplėtimo Surviliškio kaime, Kėdainių rajone rangos darbus, parengti kontrolinę geodezinę nuotrauką, kadastrinių matavimų bylą ir visus dokumentus, reikalingus statybos užbaigimui įforminti, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (aktualia redakcija) (toliau – Darbai), apsidrausti statinio statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir apmokėti už Darbus.

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA

2.1 Bendra Sutarties kaina nustatyta, vykdant mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu, ir yra **26 500,57 Eur** (dvidešimt šeši tūkstančiai penki šimtai Eur 57 ct.) su PVM, bendra Sutarties kaina be PVM 21 901,30 Eur ir PVM (21%) 4 599,27 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina. Užsakovas už atliktus Darbus sumoka Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo 2.1. punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės (bendros sutarties kainos).

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina su PVM perskaičiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas bus taikomas atliktų Darbų, tačiau dar neapmokėtų ir Darbų, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo nustatymo kainai perskaičiuoti. PVM perskaičiavimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

III SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus sutarčiai. Darbai atliekami per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir Rangovui pateikus Sutarties IX skyriuje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

3.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklos sąraše (Sutarties 1 priedas).

3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, Užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas. **Darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Rangovas, Užsakovo atstovas ir vandentiekio bei nuotekų tinklus eksploatuojančios įmonės atstovas.**

3.4. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsimas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas.

3.5. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

IV SKYRIUS

ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMŲ TVARKA

4.1. Už atliktus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų, po to, kai pasirašytus atliktų Darbų aktus, pažymą (forma F-3) ir sąskaitą faktūrą Rangovas pateikia Užsakovui.

4.2. **Atliktų darbų aktus pasirašo Rangovas, Surviliškio seniūnijos seniūnas ir Užsakovo atstovas.** Pažymą (forma F-3) pasirašo Rangovas ir Užsakovas.

4.3. Rangovas pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymą (forma F-3) pateikia Užsakovo atstovui iki einamojo mėnesio 25 dienos. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus darbus, šiame punkte nurodytus dokumentus Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per tris darbo dienas. Užsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo aktų apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktus aktus arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo.

4.4. Tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą (forma F-3) Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra pateikiama informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.5. Už atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

4.6. Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių pasus bei sertifikatus.

4.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

4.7.1. nepašalinti darbų trūkumai;

4.7.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

4.7.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.8. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį.

4.9. Užsakovas pasilieka teisę sulaikyti 10 proc. Sutarties sumos iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui statinio statybos užbaigimo įforminimui reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nurodytus reikalavimus.

4.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

5.1. Statinio garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir yra:

5.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems Darbams;

5.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);

5.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

5.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks supaprastintame statybos projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Darbų defektyne akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

5.4. Pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme (41 straipsnio 2 dalis).

VI SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. perduoti Rangovui statybą, pateikti statybą leidžiantį dokumentą, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams pradėti;

6.1.2. pranešti, kas vykdys statinio statybos techninę priežiūrą;

6.1.3. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti 4.5 punkte nustatyta tvarka;

6.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą Darbą arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių;

6.1.5. nurodyti statybinių šiukšlių, grunto ir kitų nereikalingų (netinkamų) medžiagų išpylimo vietas;

6.1.6. nedelsiant spręsti tarp Rangovo ir objekto naudotojų, kuriame atliekami Darbai, kylančias problemas, klausimus;

6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdam Sutartį.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

6.2.1. Užsakovui pateikti įsakymo kopiją apie darbų vadovo paskyrimą;

6.2.2. laiku pradėti, tinkamai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti Darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

6.2.3. patiekti į statybos aikštelę reikalingas medžiagas, gaminius bei statybos techniką;

6.2.4. prieš paslepiant ar uždengiant kurias nors konstrukcijas, informuoti statinio statybos techninį priežiūrėtoją, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techniniam priežiūrėtojui, tai, statinio statybos techniniam priežiūrėtojui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tas konstrukcijas atidengti patikrinimui;

6.2.5. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

6.2.6. vykdyti Darbus nesustabdytų eismo, įrengti laikinus aptvėrimus, pastatyti reikiamus laikinus kelio ženklus, o baigus Darbus juos išardyti;

6.2.7. naudoti statybos aikštelę tik pagal paskirtį;

6.2.8. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;

6.2.9. netinkamas ir nereikalingas statybines medžiagas, statybinius mechanizmus iš statybos aikštelės pašalinti iki Darbų perdavimo - priėmimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, Užsakovas gali pašalinti juos Rangovo sąskaitą;

6.2.10. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų vykdymo;

6.2.11. įforminti rangos Darbų atlikimo dokumentus;

6.2.12. keisti Užsakovo patvirtintus Darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą. Pakeitimus derinti su Užsakovu;

- 6.2.13. vykdyti Darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;
- 6.2.14. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei;
- 6.2.15. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias Darbų kokybei, atlikimo terminui;
- 6.2.16. Kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktu Užsakovui pateikti statinio statybos užbaigimo įforminimui reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nurodytus reikalavimus.

VII SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS

7.1. **Užsakovas** turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas ilgiau nei 10 darbo dienų nepradeda Darbų, arba dirba nekokybiškai, arba naudoja nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl Darbų vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai Darbų vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos.

7.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę.

7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų ir/ar sutarties vykdymo užtikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

7.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu jeigu:

7.5.1. nesilaiko Veiklos sąraše ir detalizuoto Veiklos sąrašo priede nustatytų terminų ir tai Užsakovui suteikia pagrindą manyti, jog Paslaugos ar Darbai nebus užbaigti laiku;

7.5.2. nevykdo pagrįstų Užsakovo atstovų ar Užsakovo paskirto statinio statybos techninio priežiūrėtojo nurodymų dėl Rangovo atliekamų darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės aktų;

7.5.3. nepateikia Rangovo darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo galiojančios sutarties ar nepratęsia nurodytų dokumentų;

7.5.4. nepildo statybos darbų žurnalo;

7.5.5. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo atstovų ar jo paskirto statinio statybos techninio priežiūrėtojo nurodymų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;

7.5.6. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

7.6. **Rangovas** turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui:

7.6.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

7.6.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui.

7.7. Užsakovui nutraukus Sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų kokybiškai atliktus Darbus ir už juos atsiskaitytų.

VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. **Užsakovas:**

8.1.1. nutraukęs Sutartį, apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus;

8.1.2. Sutarties 4.5 punkte nustatytu terminu neatsiskaitęs už atliktus Darbus, moka Rangovui 0,05 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui baudą, lygią 20 proc. Sutarties vertės su PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų per garantinį laikotarpį, moka Užsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1 ir 3.2. punktus ir Sutarties 1 priedą „Veiklos sąrašas“, moka Užsakovui 0,05 proc. uždelstų Darbų kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.2.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklos sąrašą (Sutarties 1 priedas) pateiktą vykdymo grafiką, detalizuotą Veiklos sąrašo priede nurodytą vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą. Tokiu atveju Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 20 proc. Sutarties vertės su PVM, bei atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

IX SKYRIUS

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo užstatą lygų 5 proc. Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 2.1 punkte su PVM. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

9.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – užstatas pervedamas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (įm. kodas 188768545) sąskaitą LT50 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440.

9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

9.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas kartu su galutiniu mokėjimu.

X SKYRIUS

SUTARTIES PAKEITIMAS

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

10.2. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms, aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų Darbų (ar jų dalies) ar mažinama Darbų apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jų dalį) galima keisti kitais Darbais, reikalingais Darbams tinkamai užtikrinti.

10.3. Šie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:

10.3.1. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas galimas, Rangovo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą įforminant Šalių susitarimu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą.

10.3.2. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas Šalių aktu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaičiavimo atvejui, Sutarties pradinė vertė negali būti didinama.

10.4. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų apimtys, viršijančios pradinę sutarties vertę daugiau 15 proc. (sutarties 2.1. punktas).

10.5. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

10.6. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.2 punkte nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi.

XI SKYRIUS

GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, derybų būdu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, Šalys ginčą sprendžia šioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis į teismą.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl Darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XII SKYRIUS

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

12.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

12.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo.

XIII SKYRIUS

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

13.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus – projekto dalies vadovė

Audronė Sirvdienė. Sutarties vykdymo laikotarpiu Užsakovas numato galimybę keisti subrangovus lygiavertės kvalifikacijos subrangovais rašytiniu Šalių susitarimu.

13.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

13.3. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtims pašalinti.

13.4. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, įskaitant Veiklos sąrašą (Sutarties 1 priedas), techninę specifikaciją (Sutarties 2 priedas), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

13.5. Už Sutarties vykdymą atsakingas Robertas Baltrimavičius, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 347) 69 520, el. p. robertas.baltrimavicius@kedainiai.lt.

13.6. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

PRIEDAI:

1. Veiklos sąrašas, 1 lapas;
2. Techninė specifikacija su priedais, 4 lapai;
3. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas;

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

**XIII SKYRIUS
SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI**

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai,
Tel. (+370 347) 69 550
Faksas (+370 347) 61 125
El. paštas: administracija@kedainiai.lt
Sąskaitos Nr. LT13 7044 0600 0619 7000
AB SEB bankas

Administracijos direktorius
Arūnas Kacevičius

(parašas)



Rangovas:

UAB „Babėnų transportas“
įmonės kodas 161645714
S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, Kėdainiai,
Tel. (+370 603) 91949

El. paštas: babenutransportas@gmail.com
a/s LT 53 7300 0100 3996 7564
AB Swedbank

Direktorius
Eugenijus Antanaitis

(parašas)



A.V.


Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistas
Robertas Baltrimavičius


SUDERINTA
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Statybos ir turto skyriaus vedėja
AUDRONĖ NAUJALIENĖ
_____ mėn. _____ d.

Biudžeto ir finansų skyriaus
vedėja

Jolanta Sakaviciene
Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Marius Stasiukonis

Pirkimo sąlygų
priedas

TVIRTINU:
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Arūnas Kacevičius

2019 m. gegužės 30 d.

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ IŠPLĖTIMAS SURVILIŠKIO KAIME

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objektas : Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų išplėtimas Surviliškio kaime.

Objekto adresas : Surviliškio k., Surviliškio sen., Kėdainių r. sav.

Užsakovas : Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g.36, Kėdainiai.

Esama situacija : Kėdainių gatvė, kurioje planuojama įrengti inžinerinius tinklus, yra rajoninio kelio Nr. 195 dalis. Liepupio gatvė, kurioje planuojama įrengti inžinerinius tinklus, yra rajoninio kelio Nr. 2005 dalis. Gatvių danga asfaltbetonis. Planuojama atlikti Liepupio ir Kėdainių gatvių inžinerinių tinklų sujungimą.

Darbų sudėtis:

1. Parengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų (ir atšakų į namų valdas iki žemės sklypų ribos) išplėtimo Surviliškyje supaprastintą statybos projektą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, UAB „Kėdainių vandenys“ išduotomis projektavimo techninėmis sąlygomis, orientacine tinklų schema:

1.1. Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai (nuo Liepupio g. namo Nr. 4– iki šulinio Nr. 45 Kėdainių g. Orientacinis tinklų kiekis 160 m.

1.2. Vandentiekio tinklai (nuo Kėdainių g. namo Nr. 38– iki šulinio Nr. 62 Liepupio g. Orientacinis tinklų kiekis 210 m.

3. Vadovaujantis parengtu supaprastintu statybos projektu atlikti rangos darbus.

4. Atlikti išpildomąją geodezinę nuotrauką.

5. Atlikti kadastrinių matavimų bylą (su VI Registrų centras patikra).

PRIEDAI:

1. UAB „Kėdainių vandenys“ projektavimo techninės sąlygos Nr. 8-108, 3 lapai.

2. Orientacinė vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų schema, 1 lapas.

Užduotį parengė :


Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistas

Suderinta:

Statybos ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojas

Robertas Baltrimavičius

Algimantas Gedgaudas



Lietuvos Respublika
Kėdainių rajono savivaldybė
UAB "KĖDAINIŲ VANDENYS"

Kėdainių rajono savivaldybės administracijai
Statybos ir komunalinio ūkio skyriui
J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai

2019 – 05 – 30 Nr. 8-108

**KĖDAINIŲ G., SURVILIŠKIO K., KĖDAINIŲ RAJ. VANDENTIEKIO IR
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMO
TECHNINĖS SĄLYGOS**

Projektuojamus Kėdainių g. vandentiekio tinklus jungti į Kėdainių g. vandentiekio tinklus d63 ir į Liepupio g. vandentiekio tinklus d110, į šulinį Nr. 62, (žr. situacijos planus).

Prijungimo vietoje įrengti vandentiekio atjungimui – priežiūros sklendes.

Projektuojamus Kėdainių g. buitinių nuotekų tinklus jungti į Kėdainių g. nuotekų tinklus d200, į šulinį Nr. 45, (pagal pridedamą situacijos planą).

Įrengiant gyventojams vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų atvadus.

Tinklų projektą derinti su UAB „Kėdainių vandenys“.

PRIDEDAMA: 1. Situacijos planai

GTS viršininkas

Marius Čepas

Parengė:

J. Buinevičius 8 647 61022

Dotnuvos g. 5, 57177 Kėdainiai

Tel. (8-347) 56405, 60157

Faksas (8-347) 53402

el. paštas: admin@kedainiuvandenys.lt


A.s. LT937300010002518830

AB bankas „Swedbankas“


Banko kodas 73000

Bendrovės kodas 161186428


PVM kodas LT611864219



Vandentiekio tinklų prisijungimo vieta

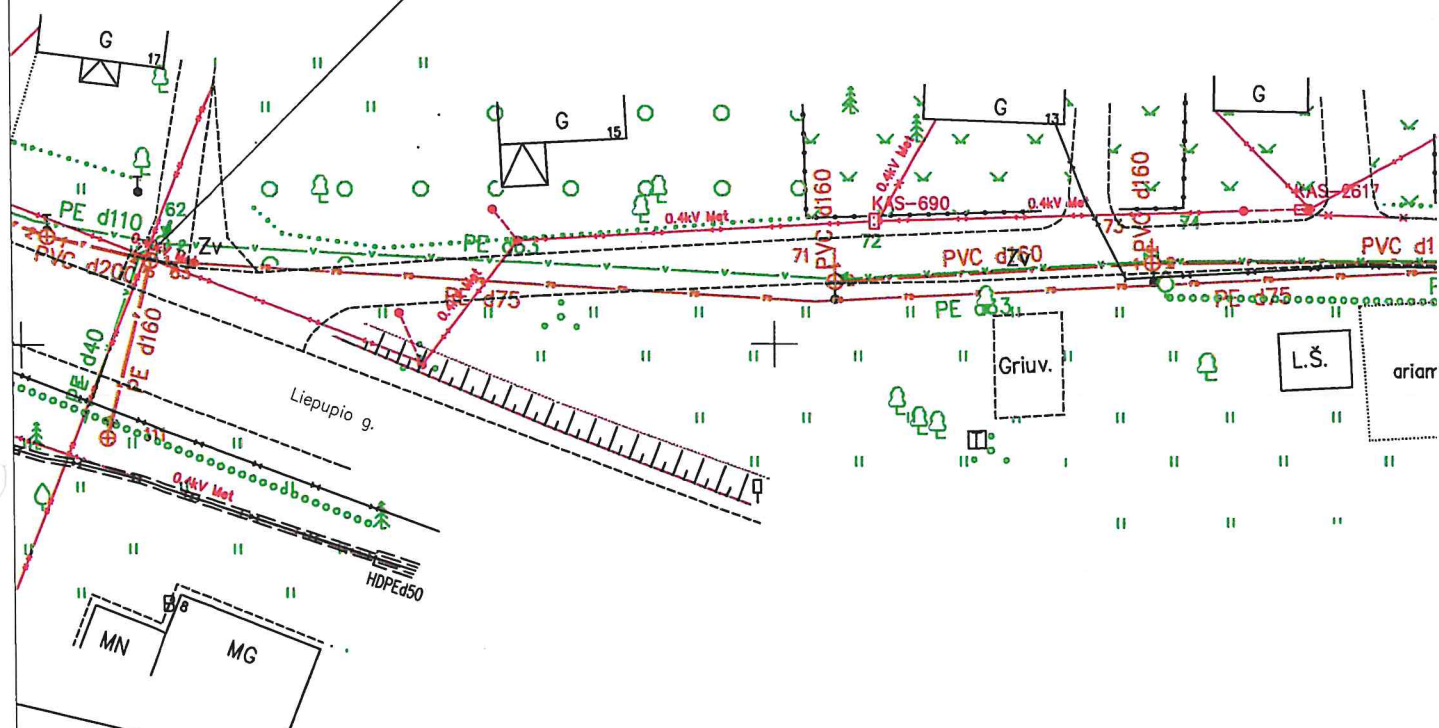

ORIENTACINĖ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SCHEMA

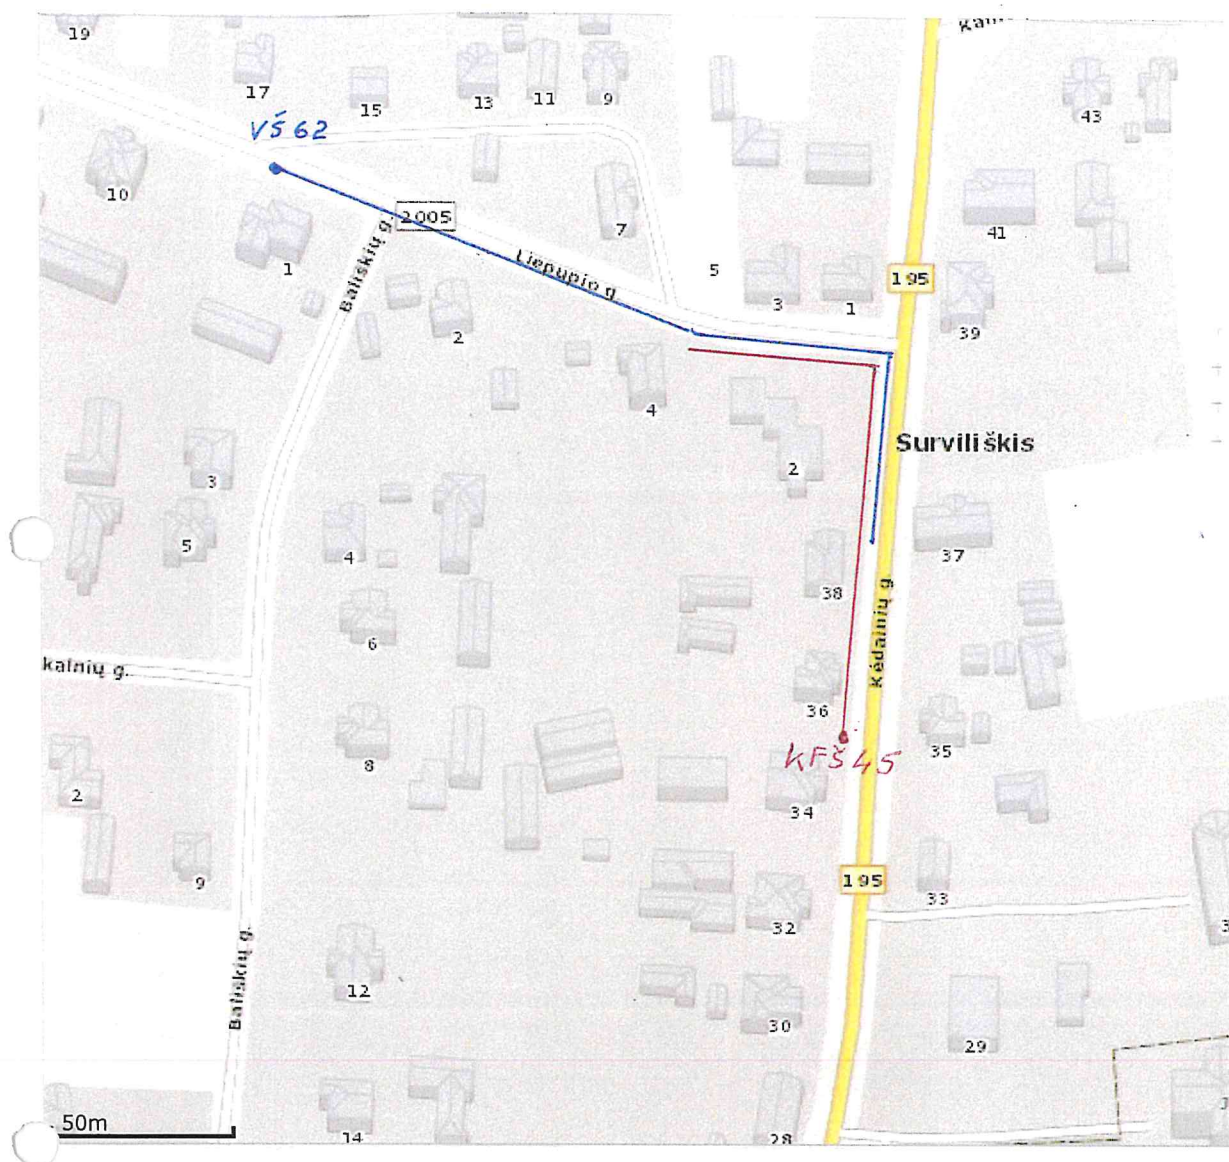

VANDENTIEKIO TINKLAI —————

BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI —————

Herbas arba prekių ženklas

UAB Babėnų transportas

(Teikėjo pavadinimas)

S.Dariaus ir S.Girėno g.23.Kėdainiai Įm.kodas 161645714 PVM kodas LT616457113

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS**DĖL VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ IŠPLĖTIMO
SURVILIŠKIO KAIME**2019.06.19

(Data)

Kėdainiai

(Sudarymo vieta)

1 lentelė.

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Babėnų transportas
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	S.Dariaus ir S.Girėno g.23 Kėdainiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Eugenijus Antanaitis
Telefono numeris	8-347-31375
Fakso numeris	8-347-31375
El. pašto adresas	babenutransportas@gmail.com

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų), subteikėjų (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti/

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	Audronė Sirvidienė
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	J.Basanavičiaus g.27-17, Kėdainiai
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius darbus, kuriems atlikti subrangovas (-ai) bus pasitelkiamas, tų darbų vertę Eur arba dalį procentais)	Projekto parengimas 2,76 %
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų) pavadinimas (ai)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/>;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Bendrą pasiūlymo kainą su PVM 26500,57 Eur
Dvidešimt šeši tūkstančiai penki šimtai Eur 57ct.
(bendrą pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro 4599,27 Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 21901,30 Eur.

Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomi darbai (paslaugos) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	Lokalinė sąmata	3 lapai
2.	Veiklos sąrašas	1 lapas
3.	Tiekėjo deklaracija	1 lapas
4.	Tiekėjo deklaracija dėl subrangovo	1 lapas
5.	Sutikimai	2 lapai
6.	Atestatai	4 lapai
7.	JAR išplėstinis išrašas	4 lapai

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

4 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Lokalinė sąmata (Konfidencialu)	
2.	Veiklos sąrašas (Konfidencialu)	
3.	Tiekėjo deklaracija (Konfidencialu)	
4.	Tiekėjo deklaracija dėl subrangovo (Konfidencialu)	
5.	Sutikimai (Konfidencialu)	
6.	Atestatai (Konfidencialu)	
7.	JAR išplėstinis išrašas (Konfidencialu)	

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Eugenijus Antanaitis

(Vardas ir pavardė)

VEIKLOS SĄRAŠAS


VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ IŠPLĖTIMAS SURVILIŠKIO KAIME

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM [pildo rangovas]				Darbo (etapo) kaina Eur be PVM [pildo rangovas]
			1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	
1.	2.	3.	4.				5.
1.	Supaprastinto statybos projekto parengimas	100	300,00	306,00	x	x	606,00
2.	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas	100	x	6500,00	6500,00	7045,06	20045,06
3.	Žaliųjų vejų, gatvės pagrindų ir dangos atstatymas	100	x	x	x	240,24	240,24
4.	Geodezinės nuotraukos parengimas ir kadastrinės bylos sudarymas	100	x	x	x	1010,00	1010,00
			Suma Eur be PVM:				21901,30
			PVM 21 proc. suma Eur:				4599,27
			BENDRA SUMA EUR SU PVM:				26500,57

Pastabos:

1. X - pažymėtų grafų tiekėjas nepildo.
2. Supaprastinto projekto parengimo paslaugų kainą neturi viršyti 5 proc. bendros pasiūlymo kainos su PVM.

Direktorius
Eugenijus Antanaitis





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.5566

UAB "BABĖNŲ TRANSPORTAS"

Įmonės kodas: 161645714

S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, LT-57149 Kėdainiai

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), geležinkelio kelias; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

03589

Išduotas 2016 m. gruodžio 23 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. rugsėjo 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.25472

Audronė Sirvidienė

A.k. 

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.


Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (išskyrus magistralinį dujotiekį), vandentiekio, nuotekų šalinimo.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, dujotiekio.

Trasa
Audronė Sirvidienė


L. e. p. direktorius




Edmundas Endriukaitis

12453

Išduotas 2015 m. vasario 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2009 m. gruodžio 22 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.21120

Gintautas Sirvidas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 1,5 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

03484

Išduotas 2013 m. sausio 15 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. kovo 14 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



Kompleksas: Kėdainių rajono savivaldybė
 Objektas: Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų
 išplėtimas Surviliškio k. Kėdainių r.

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Statybos darbai VN


Iš viso: **26500,57 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Projektavimo darbai						
1	R1	Projektavimo darbai	vnt	1	606,00	606,00
Iš viso už skyrių Projektavimo darbai						606,00
Skyrius Vandentiekio tinklai						
2	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje daugiau 1,5 iki 2,0m gylio, kai vamzdžio d iki 600mm, neišvežant grunto	1000m	0,02	11081,95	221,64
3	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	1,5	28,00	42,01
4	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	4	19,18	76,73
5	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,43	119,52	51,39
6	N22-479	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 75-110 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis)	m	280	16,33	4572,96
7	PRN22-476	Polietileningiai vamzdžiai d110 PN10	prvnt	280	4,79	1342,45
8	N24-301	Vandent. vamzdynų iš d 20-63mm poliet. vamzdžių klojimas paruoštose tranšėjose (be sandūrų jungimo)	m	15	3,73	55,96
9	PRN24-301	Polietileningiai vamzdžiai d 32 PN10	prvnt	15	0,82	12,24
10	N25-252	Pe-hd įpjovos balno montavimas polietilėninio dujotiekio linijoje, kai d/d=110/32	vnt	4	61,93	247,74
11	N22-268	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 50mm pastatymas	vnt	4	12,42	49,67
12	PRN22-268	Pagrindiniai resursai: Ketinė sklendė įvad. DN 32	prvnt	4	44,44	177,76
13	N22P-0309	Sklendžių prailginimo velenų montavimas, kai veleno ilgis 1,6m	vnt	4	5,83	23,34
14	PRN22P-0309	Pagrindiniai resursai: Velenas sklendžių vairo prailginimo	vnt	4	28,28	113,12
15	N24-354	Kapų be apsauginio gelžbetonio žiedo įrengimas	vnt	4	12,00	48,01
16	PRN24-354	Pagrindiniai resursai: Plast. pokapis	prvnt	4	5,25	21,01
17	N25-209	Pe-hd vamzdžių d110mm sujungimas el. suvirinimo movomis	vnt	3	27,50	82,51
18	N25-366	Pe-hd alknių 90% montavimas polietilėninio vand. linijoje, kai d=110mm	vnt	1	49,50	49,50
19	N25-318	Pe-hd vamzdžių sujungimas el. suvirinimo movomis-perėjimais d/d=110/63mm	vnt	1	38,92	38,92

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
20	N22-339	Apvalūs surenkami gelžbetonio vandentiekio šuliniai sausuose gruntuose	m3	1,45	189,58	274,90
21	PRN22-339	Pagrindiniai resursai: Surenkamos g/b konstrukcijos vandentiekio šuliniai	prvnt	1,45	250,76	363,60
22	R1	Liukas sunkaus tipo	vnt	1	138,88	138,88
23	N7P-0107	Surenkamų gelžbetoninių šulinių teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	13	4,73	61,43
24	N22-270	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 100mm pastatymas	vnt	3	22,71	68,13
25	PRN22-270	Fl. ketinė sklendė DN 100 F4	prvnt	3	82,47	247,40
26	N22-539	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	3	5,62	16,87
27	PRN22-539	Fl. ketinis tempimui astarus adapteris PE d110/DN100	vnt	3	41,01	123,02
28	N22-547	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas	vnt	1	6,45	6,45
29	PRN22-539	Pagrindiniai resursai: Flanšinės fasoninės dalys kaliojo ketaus su tarpinėmis ir varžtais	vnt	1	50,50	50,50
30	N22-555	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių keturšakių montavimas	vnt	1	8,68	8,68
31	PRN22-539	Pagrindiniai resursai: Flanšinės fasoninės dalys kaliojo ketaus su tarpinėmis ir varžtais	vnt	1	65,65	65,65
32	N22-214	Vamzdynų d 100mm praplovimas su dezinfekcija	1000 m	0,317	482,14	152,84
33	N22P-0701	Vamzdynų 110mm skersmens hidraulinis bandymas	100m	3,17	140,46	445,25
34	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklai su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	1	11,89	11,89
35	PRN22-484	Pagrindiniai resursai: Ženklos (numeriai), Metaliniai stulpeliai ženklos	vnt	1	19,79	19,79
Iš viso už skyrių Vandentiekio tinklai						9282,21
Skyrius Nuotekų tinklai						
36	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje daugiau 1,5 iki 2,0m gylio, kai vamzdžio d iki 600mm, neišvežant grunto	1000m	0,018	11081,95	199,48
37	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	1	28,00	28,00
38	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	4	19,18	76,73
39	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,27	119,52	32,27
40	N24-311	Polietileninių vamzdžių d180-225mm sandūrų jungimas sandūriniu suvirinimu	vnt	14	38,42	537,83
41	N22-480	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 125-200 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis)	m	160	38,44	6150,74
42	PRN22-476	Polietileniniai vamzdžiai d200 PN10	prvnt	160	14,76	2361,74
43	N23-151	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100m	0,09	91,46	8,23

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
44	PRN23-151	Pagrindiniai resursai: Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	prvnt	0,09	326,43	29,38
45	N23P-0301	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,0m skersmens įrengimas sausuose gruntuose (surenkamos g/b konstrukcijos)	m3	0,75	317,37	238,03
46	PRN23P-0301	Pagrindiniai resursai: Surenkamos g/b konstrukcijos šuliniai, Liukai ketiniai lietaus kanalizacijos, Betonai	m3	0,75	437,89	328,42
47	N7P-0107	Surenkamų gelžbetoninių šulinių teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	7,5	4,73	35,44
48	N23-196	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas	vnt	3	37,64	112,92
49	PRN23-196	Pagrindiniai resursai: Plastmasiniai kanalizacijos valymo ir inspektavimo šuliniai (komplekte) d425	prvnt	3	165,64	496,92
50	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	4	11,89	47,56
51	PRN22-484	Pagrindiniai resursai: Ženklo (numeriai), Metaliniai stulpeliai ženklo	vnt	4	19,79	79,17
Iš viso už skyrių Nuotekų tinklai						10762,84
Skyrius Žaliųjų vejų ir gatvių dangos atstatymas						
52	N27-20	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	0,02	1711,11	34,22
53	N27-100	15 cm storio dvisl. dangos viršutinio sluoksnio iš dolomit. skaldos 40-70 mm iki 68.6 MPA atsparumo įrengimas	100 m2	0,1	714,79	71,48
54	N27P-17-1	0/16-Vn asfaltbetonio 6cm storio viensluoksnės dangos įrengimas klotuvų iki 200t/h	100m2	0,1	1131,80	113,18
55	N48-261	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m2	0,1	176,33	17,63
56	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	0,1	37,31	3,73
Iš viso už skyrių Žaliųjų vejų ir gatvių dangos atstatymas						240,24
Skyrius Geodeziniai darbai						
57	CALC1-1	Geodezinės nuotraukos parengimas ir kadastrinės bylos sudarymas	vnt	1	1010,00	1010,00
Iš viso už skyrių Geodeziniai darbai						1010,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						21901,30
Bendra vertė be PVM						21901,30
PVM						4599,27
Bendra vertė su PVM						26500,57

Sudarė: @Sudarytojas

Direktorius
Eugenijus Antanaitis


TIEKĖJO DEKLARACIJA

2019 m. birželio 19 d.

Aš direktorius Eugenijus Antanaitis,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Babėnų transportas“,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujančio Kėdainių rajono savivaldybės administracija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų išplėtimas Surviliškio kaime pirkime
(Pirkimo pavadinimas)
kvalifikacijos duomenys yra tokie (Tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos
reikalavimams, pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Taip	Ne
1.	Tiekėjas turi teisę atlikti statybos darbus.	Taip	
2.	Tiekėjas turi bent vieną inžinerinį statybos išsilavinimą turintį specialistą projekto dalies vadovo ir statybos vadovo pareigoms atlikti.	Taip	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu, pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Eugenijus Antanaitis
(Vardas, pavardė)

**TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL SUBRANGOVO AR PASITELKIAMO KITO ASMENS
ATITIKTIES KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS**

2019 m. birželio 19 d.


Aš direktorius Eugenijus Antanaitis
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)
tvirtinu, kad subrangovo (subteikėjo ar kito asmens) Audronė Sirvidienė
(Pavadinimas/vardas, pavardė)
mano pasitelkiamo dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės administracija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų išplėtimas Surviliškio kaime pirkime
(Pirkimo pavadinimas)
kvalifikacijos duomenys yra tokie (Tiekėjas nurodo subrangovo (subteikėjo ar kito asmens) atitikimą
nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams, pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai (nurodo tiekėjas dėl kokių pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų jis remsis subrangovo, subteikėjo ar kito asmens pajėgumais)	Taip	Ne
1.	Specialistas projekto dalies vadovo pareigoms atlikti	Taip	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu, pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Eugenijus Antanaitis
(Vardas, pavardė)
