

DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. 1-SU-668

2019 m. lapkričio 20 d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės **Ligitos Kuliešaitės**, veikiančios vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. TS-348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2019 m. balandžio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“, toliau vadinama UŽSAKOVU ir **AB „Anykščių melioracija“**, atstovaujama direktoriaus **Gintaro Pauliukevičiaus**, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama RANGOVU, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“. Sutartyje RANGOVAS ir UŽSAKOVAS kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatytą terminą ir Sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti ir perduoti **Anykščių seniūnijos Vėjeliškio kaimo vietinės reikšmės kelio Nr.A311 privažiuojamojo kelio nuo kelio Nr. 112 iki kelio Nr.120 kapitalinio remonto papildomus darbus** (toliau – Darbai) ir ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbai turi būti atliekami pagal techninį darbo projektą: **Anykščių seniūnijos Vėjeliškio kaimo vietinės reikšmės kelio Nr.A311 privažiuojamojo kelio nuo kelio Nr. 112 iki kelio Nr.120 kapitalinis remontas**“ ir kabelio perkėlimo bei pralaidų įrengimo schemas.

1.3. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 (aktuali redakcija) nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus.

1.4. Darbų atlikimo vieta – Anykščių rajonas, Vėjeliškio kaimas.

2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. **Sutartyje numatytų atliekamų papildomų darbų kaina – 6 688,41 Eur** (šeši tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 41 euro centas) su PVM. Tame skaičiuje PVM sudaro: **1 160,80 Eur** (vieną tūkstantį vieną šimtą šešiasdešimt eurų 80 euro centų).

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų atlikimui. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas techninio darbo projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.3. Sutarties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutartyje numatytus kainų koregavimus. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymų lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties

kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo numatyti arba yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

2.5.1. pagal Sutarties 14 skyriaus nuostatas įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

2.5.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

2.5.1.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statybviėtės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą.

3.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras ir atlikus Sutarties 3.1 papunktyje nurodytus veiksmus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų pateikimo dienos Užsakovui. Atskirais atvejais atsiskaitymo laikas gali būti prailgintas iki 60 dienų.

3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.

3.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 4.1. Darbų atlikimo terminas: **1 mėnuo** nuo sutarties pasirašymo dienos.
- 4.2. Sutarties pratęsimo galimybė nenumatyta.
- 4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir priimti pagal šios Sutarties 8 skyrių.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- 5.1. Užsakovas įsipareigoja:
 - 5.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;
 - 5.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą;
 - 5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti;
 - 5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.
- 5.2. Rangovas įsipareigoja:
 - 5.2.1. ne vėliau nei 10 kalendorių dienų nuo sutarties pasirašymo pateikti darbų atlikimo grafiką pagal su Užsakovu suderintą formą.
 - 5.2.2. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas;
 - 5.2.3. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;
 - 5.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
 - 5.2.5. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;
 - 5.2.6. pašalinti iš statyb vietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.2.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statyb vietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Statyb vietė turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
 - 5.2.8. užtikrinti, kad Rangovo personalas būtų kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose;
 - 5.2.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;
 - 5.2.10. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai, subsubrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartinių įsipareigojimų dalis;
 - 5.2.11. būti atsakingu už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;
 - 5.2.12. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;
 - 5.2.13. turėti visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus

Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos:

5.2.14. priimti atsakomybei ir rizikai Darbų faktinių kiekių neatitikimą orientaciniams (projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau **kaip 15 procentų, skaičiuojant** nuo Pradinės sutarties vertės. Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys **15 procentų ribą**, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 14 skyriuje.

5.2.15. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;

5.2.16. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;

5.2.17. įforminti priežiūros darbų atlikimo dokumentus;

5.2.18. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės;

5.2.19. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;

5.2.20. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;

5.2.21. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;

5.2.22. pateikti eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas (jei taikoma), kurios turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

6. ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Užsakovo teisės:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

6.1.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus;

6.1.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;

6.1.4. tikrinti Rangovo naudojamą techniką. Nustačius, kad naudojama ne visa technika, ir jeigu dėl to vėluojama atlikti bet kuriuos darbus, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų su nurodyta arba lygiaverte technika. Jeigu Rangovas per protingą terminą neįvykdo šio reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.1.5. paskirtą baudą Rangovui išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, o jei tokių sumų nepakanka, kreiptis dėl baudos sumos sumokėjimo į Rangovą, o jam neatsiskaičius per 30 dienų kreiptis į garantiją suteikusią organizaciją dėl mokėtinų sumų išmokėjimo.

6.2. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo atlikti Darbus iš naujo.

7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFJEKTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priežiūros darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.

7.3. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

7.4. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

8. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.

8.2. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Rangovas turi pateikti detalų atliktų darbų aktą, kuriame atsispindėtų faktiškai atlikti darbai. Aktuose turi būti nurodomi panaudotų medžiagų kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas įvardijamas atskirai. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

10.2. Rangovas uždelsęs darbų įvykdymą pagal su Užsakovu suderintą darbų grafiką ir nepateikęs Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų atlikimo vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02% (dvi šimtosios procento) nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo šiai sutarčiai nėra reikalaujama.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

12.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Rangovui pateikus reikalaujamą pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki Užsakovas ir Rangovas įvykdys šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

14. SUTARTIES PAKEITIMAS

14.1. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

14.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, jeigu jie viršija 15 procentų sutarties vertės.

14.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

14.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.2 punkte nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

14.5. Sutarties Šalys gali, bet kurio atskiuro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtį sumažinti vadovaujantis tokia tvarka:

14.5.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiuro Darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų

kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

14.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

14.6. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

15. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 15 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

15.1.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti;

15.1.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

15.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

15.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

15.1.6. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu ar pasibaigus jo galiojimo terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

15.2. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.

15.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.3.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

15.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

15.5. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

15.6. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu šalių susitarimu.

16. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

16.1. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas subrangovų nepasitelks. Sutarties vykdymo metu subrangovai negalės būti įtraukiami, jei jie nebuvo pasitelkti teikiant pasiūlymą.

17. GINČŲ SPRENDIMAS

17.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti

derybomis. Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėjama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

18. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

18.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

18.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.

18.3. Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyr. specialistas A. Balaišis. Asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:

18.3.1. Užsakovo: **Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas Gediminas Maigys.**

18.3.2. Rangovo: **Statybos darbų vadovas Juozas Puzonas.**

18.4. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

18.5. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

18.6. Sutarties priedai:

18.6.1. Darbų kainos skaičiavimas. Priedai Nr. 1., Nr. 2.

18.6.2. Kabelių perkėlimo schema, priedas Nr. 3.

18.6.3. Pralaidų įrengimo schema, priedas Nr. 4.

19. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188774637

Ne PVM mokėtoja

J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

Tel. (8 381) 58 035, 4 23 15;

a. s. LT 04 7182 1000 0013 0670

AB Šiaulių bankas

banko kodas 71821

Administracijos direktorė

Ligita Kuliešaitė



Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus vedėja
Audronė Savickienė

Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė
Ieva Katinienė

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Algirdas Balaišis

Rangovas

AB „Anykščių melioracija“

Įmonės kodas 154110362

PVM kodas LT 541103610

Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai

Tel. (8 381) 5 81 66


a. s. LT45 7182 1000 1046 7416

AB Šiaulių bankas

banko kodas 71821

Direktorius

Gintaras Pauliukevičius



Viešųjų pirkimų ir apskaitos skyriaus
vedėja

Statybos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Valentinas Vitkūnas

Lokalinė sąmata Nr. 1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu

Kompleksas: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Objektas: Anykščių sen. Vėjališkio kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. A311 privaž-uojamojo kelio nuo kelio Nr.112 iki kelio Nr.120 kapitalinis remontas

Žiniaraštis: Papildomi darbai

5.362,26 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	K31-4	0.6m diam. vandens pralaidos vamzdžių įrengimas	m	22	138,52	3047,44
2	K31-3	0.4m diam. vandens pralaidos vamzdžių įrengimas	m	14	98,87	1384,18
Iš viso #1						4.431,62 €
PVM			21%			938,64 €
Iš viso #2						5.362,26 €

Sudarė:

Inžinierė
Irmona Būvalienė

Lokalinė sąmata Nr.2
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu

Kompleksas: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Objektas: Anykščių sen. Vėjališkio kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. A311 privaž-uojamojo kelio nuo kelio Nr.112 iki kelio Nr.120 kapitalinis remontas

Žiniaraštis: Skydo KS1016 išKV-901 iškėlimas

1.326,15 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	R33-282	Kabelių (tranzitinių) spintų demontavimas	vnt.	1	26,64	26,64
2	N21-614	Tranzitinės apskaitos dviejų skaitiklių spintos montavimas išorėje	vnt.	1	60,28	60,28
3	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,02	5240,28	104,81
4	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,02	2135,12	42,70
5	N34-89	Polietilenui 100 mm skersmens vamzdelių paklojimas	100 m	0,2	397,45	79,49
6	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,02	241,60	4,83
7	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdeliuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3 kg	100 m	0,2	276,02	55,20
8	88001001	Kabelis AL 4x120	m	10	6,82	68,22
9	88001002	Kabelis AL 4x35	m	5	2,45	12,27
10	88001003	Kabelis AL 5x16	m	5	1,70	8,52
11	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70 mm ² skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2	12,48	24,97
12	N21-602	Iki 1000 V įtampos iki 70 mm ² skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2	36,85	73,70
13	N21-595	Iki 1000 V įtampos iki 120 mm ² skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2	58,73	117,45
14	N21-594	Iki 1000 V įtampos iki 120 mm ² skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2	96,21	192,42
15	N33-66	Ižeminimo kontūro įrengimas iš 1 elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia ižeminimo šyna iki 1 m ilgio	kompl.	1	52,50	52,50

El. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Matavimai	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
16	N33-67	Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti	vnt.	1	32,37	32,37
17	N33-69	Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	2	8,49	16,97
18	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	1	21,22	21,22
19	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	4	12,06	48,22
20	M01	Operatyviniai perjungimai	vnt.	1	53,21	53,21
Iš viso #1						1.095,99 €
PVM					21%	230,16 €
Iš viso #2						1.326,15 €

Sudarė:

Inžinierė
Ermantas Baranavičius

- Elektro spinta KS-1016, PK 8+5,2
- Elektro bolcheq mto
- Perbolonni elektro bolcheq (1000)

3,00

R2,0

34.56R2,0


3,00

0,60

8+60

AS 10

08+80

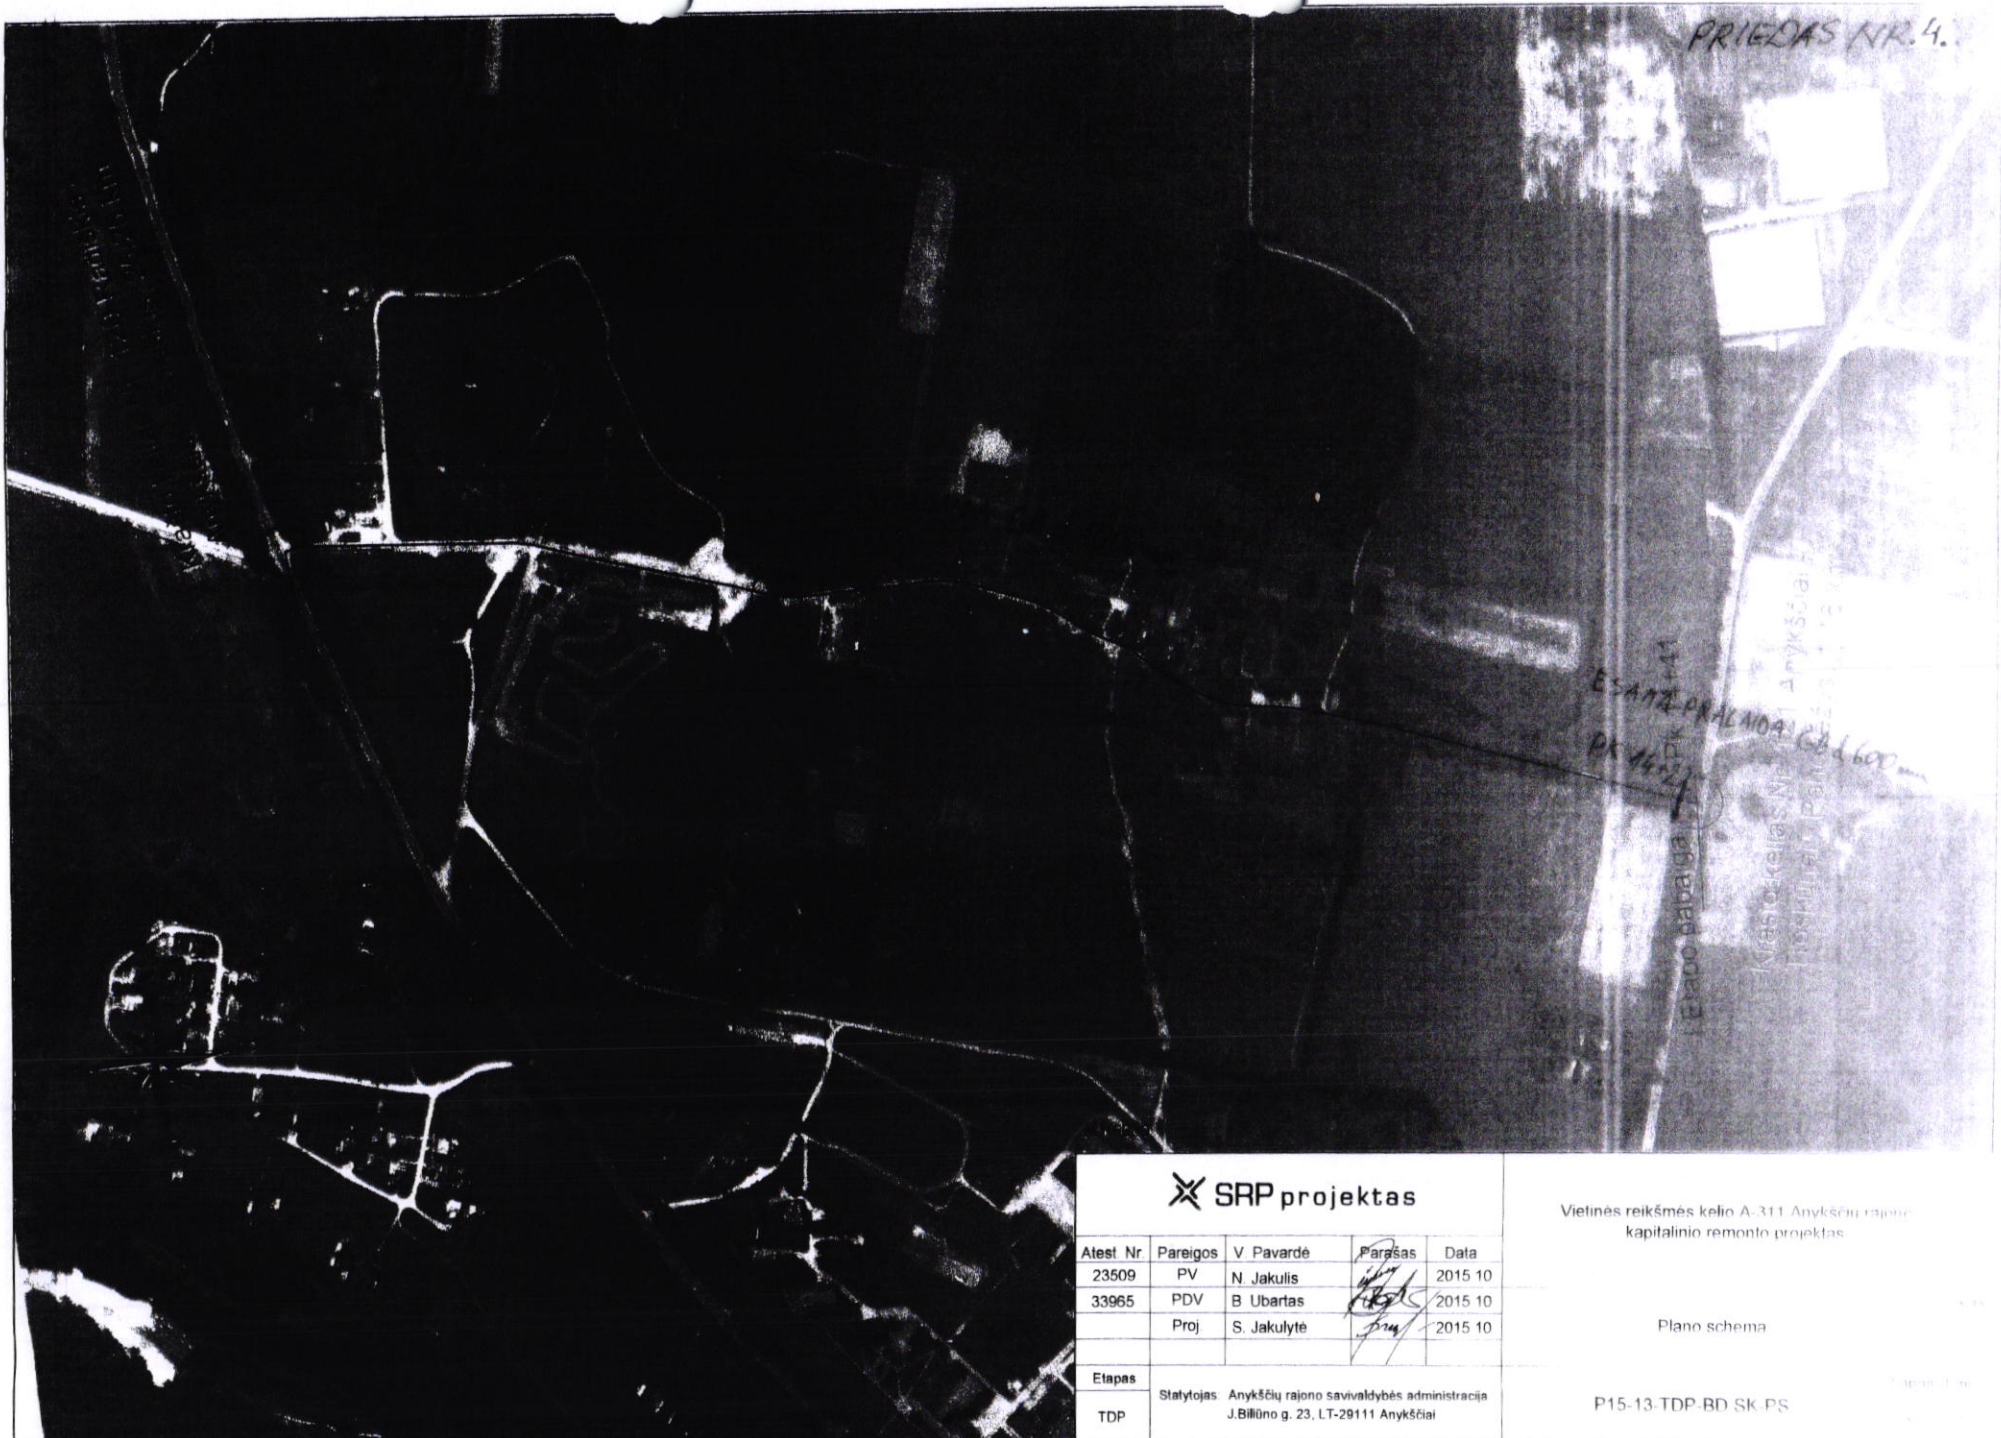

SRP projektas

Atest Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parasas	Data
23509	PV	N. Jakulis		2015 10
33965	PDV	B. Ubartas		2015 10
	Proj.	S. Jakulytė		2015 10

Etapas	Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija J. Bičiūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
TDP	

Vietinės reikšmės kelio A-311 Anykščių rajone
kapitalinio remonto projektas

Plano schema

P15-13-TDP-BD SK PS

AB „Anykščių melioracija“, Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai, įm.k. 154110362, PVM m.k. LT541103610, tel. 8 383 58166, faks. 8 383 58166, el.p. anyksciumelioracija@gmail.com

Anykščių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

VIEŠAJAM PIRKIMUI DĖL ANYKŠČIŲ SENIŪNIJOS VĖJELIŠKIO KAIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR.A311 PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO NUO KELIO NR. 112 IKI KELIO NR.120 KAPITALINIO REMONTO PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO

2019-11-08

(Data)

Anykščiai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)</i>	AB „Anykščių melioracija“
Tiekėjo adresas <i>(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)</i>	Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai
Įmonės kodas	154110362
PVM mokėtojo kodas	LT541103610
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Gintaras Pauliukevičius
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	
Telefono numeris	+370 381 58166
Fakso numeris	+370 381 58166
El. pašto adresas	anyksciumelioracija@gmail.com

1. Vykdydami sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Perduodami įsipareigojimai ir jų procentinė išraiška
-	-	-

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime teikti pasiūlymą:

5) Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, EUR	PVM dydis, EUR	Kaina su PVM, EUR
1	2	3	4	5
1.	Elektros skydo iškelimas	1095,99	230,16	1326,15
2.	Vandens pralaidų įrengimas	4431,62	930,64	5362,26
Iš viso vertinama kaina:		5527,61	1160,80	6688,41

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais: 6688,41 Eur (Šeši tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai keturiasdešimt vienas centas).

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo įsivertinti visas darbų ir reikalingos įrangos (infrastruktūros) apimtis nurodytas techninėje specifikacijoje (pirkimo dokumentų 2 priedas) bei kituose pirkimo dokumentų prieduose.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytus sanaudų/darbų/medžiagų kiekių žiniaraščius.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikiamo dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Darbų kiekių žiniaraštis	3
2	Igaliojimas	1

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta **konfidenciali informacija** (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
-	-	-

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę, apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties vykdymui bei siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius rodiklius.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gintaras Pauliukevičius

(Vardas ir pavardė)

Lokalinė sąmata Nr. 1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Anykščių rajono savivaldybės administracija**Objektas:** Anykščių sen. Vėjališkio kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. A311 privaž-uojamojo kelio nuo kelio Nr.112 iki kelio Nr.120 kapitalinis remontas**Žiniaraštis:** Papildomi darbai**5.362,26 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	K31-4	0.6m diam. vandens pralaidos vamzdžių įrengimas	m	22	138,52	3047,44
2	K31-3	0.4m diam. vandens pralaidos vamzdžių įrengimas	m	14	98,87	1384,18
Iš viso #1						4.431,62 €
PVM			21%			930,64 €
Iš viso #2						5.362,26 €

Sudarė:

Inžinierė
Irmantė Bareikienė

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Objektas: Anykščių sen. Vėjališkio kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. A311 privaž-uojamojo kelio nuo kelio Nr.112 iki kelio Nr.120 kapitalinis remontas

Žiniaraštis: Skydo KS1016 išKV-901 iškėlimas

1.326,15 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	R33-282	Kabelių (tranzitinių) spintų demontavimas	vnt.	1	26,64	26,64
2	N21-614	Tranzitinės apskaitos dviejų skaitiklių spintos montavimas išorėje	vnt.	1	60,28	60,28
3	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,02	5240,28	104,81
4	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,02	2135,12	42,70
5	N34-89	Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100 m	0,2	397,45	79,49
6	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,02	241,60	4,83
7	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3 kg	100 m	0,2	276,02	55,20
8	88001001	Kabelis AL 4x120	m	10	6,82	68,22
9	88001002	Kabelis AL 4x35	m	5	2,45	12,27
10	88001003	Kabelis AL 5x16	m	5	1,70	8,52
11	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2	12,48	24,97
12	N21-602	Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2	36,85	73,70
13	N21-595	Iki 1000 V įtampos iki 120 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2	58,73	117,45
14	N21-594	Iki 1000 V įtampos iki 120 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2	96,21	192,42
15	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš 1 elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 m ilgio	kompl.	1	52,50	52,50

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
16	N33-67	Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti	vnt.	1	32,37	32,37
17	N33-69	Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	2	8,49	16,97
18	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	1	21,22	21,22
19	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	4	12,06	48,22
20	M01	Operatyviniai perjungimai	vnt.	1	53,21	53,21
Iš viso #1						1.095,99 €
PVM			21%			230,16 €
Iš viso #2						1.326,15 €

Sudarė:

Inžinierė
Irmantė Bareikienė
